La gestion des risques

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Gestion des risques **4**

A. Qu'est-ce qu'un risque ? 4

B. Notion d'opportunité 4

C. 2 types de risques 4

D. Gestion des risques 5

II. Exercice : Quiz **5**

III. Planifier la gestion des risques **6**

A. Ressenti des parties prenantes par rapport aux risques 6

B. Planification de la gestion des risques 6

C. Comment qualifier la probabilité d'occurrence et les impacts des risques ? 7

D. Comment qualifier les risques ? 8

IV. Exercice : Quiz **8**

V. Identifier les risques **9**

B. Registre des risques 9

C. Aides à l'identification des risques 11

D. Hypothèses comme source de risque 11

E. Écueils dans l'identification des risques 11

VI. Exercice : Quiz **11**

VII. Prioriser les risques **12**

A. Priorisation qualitative 13

B. Autres paramètres de Priorisation 13

C. Priorisation Quantitative 13

VIII. Exercice : Quiz **13**

IX. Définition et mise en place des remèdes **14**

A. Stratégie pour gérer les menaces 15

B. Stratégie pour gérer les opportunités 15

C. Définition et mise en place des remèdes 15

D. Quels risques peuvent exister après la mise en place des remèdes ? 16

X. Exercice : Quiz **16**

XI. Maîtriser les risques **17**

A. Risques et opportunités ne sont pas figés 17

B. Maîtriser les risques identifiables 17

C. Que faire avec les risques non identifiables ? 17

D. Rapport des risques 18

XII. Exercice : Quiz **18**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

XIII. Essentiel **19**

XIV. Auto-évaluation **19**

A. Test 19

B. Exercice : 20

Solutions des exercices **21**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Gestion des risques

Contexte

Par définition, les projets sont des efforts temporaires et uniques pour fournir de la valeur. Cette valeur est obtenue en tenant compte des contraintes du projet, des hypothèses faites par l'équipe de projet, et des exigences changeantes et contradictoires des parties prenantes. Contraintes, hypothèses, exigences et contexte vont générer des risques et des opportunités que le chef de projet et son équipe devront gérer au mieux pour s'assurer du bon déroulement du projet.

A. Qu'est-ce qu'un risque ?

Définition

Un risque est un événement ou une condition possible, et donc incertain(e), qui, s'il/si elle se produit, aura un impact négatif ou positif sur un ou plusieurs objectifs du projet.

Exemple

En informatique par exemple, la réception avec du retard d'un serveur risque de repousser les tests de l'application. À l'inverse, la réception du même serveur avec de l'avance peut permettre de commencer les tests de l'application plus tôt que prévu.

Les exemples nous montrent qu'à la notion de risque seront associés les notions d'impact sur le projet, et de probabilité d'occurrence du risque.

B. Notion d'opportunité

En langue anglaise, risques et opportunités sont réunis sous le seul terme de « *risk* ». Pour simplifier notre cours, le terme de « *risque* » intégrera les notions de risques et d'opportunités. La différenciation entre risques et opportunités sera faite lorsque cela sera nécessaire, en utilisant les termes de « *menace* » et « *opportunité* ».

C. 2 types de risques

Menaces et opportunités font partie des risques identifiables ou des risques non identifiables.

- **Les risques identifiables** sont liés à des événements prévisibles, par exemple la possible défection d'un sous-traitant ou la possible dégradation des délais d'approvisionnement. Dans ce cas, les risques pourront être identifiés, analysés, priorisés et gérés par l'équipe de projet.
- **Les risques non identifiables** aussi appelés imprévus sont liés à l'incompréhension, la non-connaissance de l'équipe de projet ou à des changements imprévisibles dans le contexte du projet. Pour couvrir les imprévus, le chef de projet mettra en place des réserves financières ou des réserves de temps par exemple en ajoutant 5 à 10 % au budget ou au planning du projet. Pour les gros projets, il est d'usage de se servir d'outils statistiques compliqués comme les algorithmes de Monte-Carlo pour affiner le montant des réserves.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

D. Gestion des risques

Le chef de projet et son équipe gèrent les risques tout au long du projet de manière à protéger le projet des menaces et profiter des opportunités. Cette démarche s'appuiera sur 5 processus :

1. La planification de la gestion des risques qui décrira comment le chef de projet et son équipe vont gérer les risques tout au long du projet.
2. L'identification des risques, qui consiste à identifier les risques avant qu'ils ne se produisent et documenter leurs caractéristiques.
3. L'analyse des risques qui permet de prioriser les risques pour ne travailler que sur les risques les plus critiques.
4. La planification et la mise en place des réponses aux risques ou remèdes qui permettront de protéger le projet des menaces et bénéficier des opportunités.
5. Le suivi et la maîtrise des risques qui consistent à suivre l'évolution des risques identifiés, suivre l'efficacité des réponses, identifier les nouveaux risques et s'assurer que les processus de gestion des risques fonctionnent correctement.

Exercice : Quiz

Question 1

Un risque est un événement certain.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 2

Comment sont traités les risques non identifiables ?

- ○ De la même manière que les risques identifiables
- ○ En mettant en place des remèdes préventifs
- ○ En mettant en place des réserves financières ou des réserves de temps
- ○ En contrôlant les facteurs déclencheurs

Question 3

L'étude des risques se focalise sur les risques qui peuvent avoir un effet négatif sur le projet.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 4

L'analyse des risques permet :

- ○ De définir les processus de gestion des risques
- ○ De prioriser les risques
- ○ D'identifier les risques
- ○ De créer des réserves financières pour les risques non identifiables

Question 5

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Les réponses aux risques permettent uniquement de protéger le projet des impacts des risques négatifs.

- O Vrai
- O Faux

II. Planifier la gestion des risques

A. Ressenti des parties prenantes par rapport aux risques

Les parties prenantes n'ont pas toutes le même ressenti par rapport aux risques d'un projet. Comprendre ces ressentis passe par l'analyse :

- Du degré d'appétit vis-à-vis du risque des parties prenantes par rapport aux avantages ou bénéfices apportés par le projet.
- Du degré d'aversion vis-à-vis des menaces des parties prenantes.
- De l'existence ou non de limites en dessous desquelles les parties prenantes accepteront le risque.

Il n'existe pas de vraie méthode pour analyser les parties prenantes, par contre l'équipe de projet se fera une idée relativement pertinente en communiquant avec les parties prenantes.

Par exemple, des questions comme, « *accepteriez-vous un risque correspondant à une perte potentielle de 500 000 € sur ce projet ?* », aideront à mieux cerner le ressenti des parties prenantes.

B. Planification de la gestion des risques

La planification de la gestion des risques consiste à décrire les activités à effectuer pour gérer les risques en accord avec la complexité et la criticité du projet et en respectant le seuil de risque acceptable pour l'organisation.


Ce processus débouche sur la création d'un plan de gestion des risques qui décrira par exemple les éléments suivants :

- **La méthodologie** qui définit les approches, les outils, les données nécessaires pour gérer les risques du projet.
- **Les rôles et responsabilités** dans l'équipe de projet.
- **Les calendriers** des diverses réunions de gestion des risques.
- **Les financements** pour mettre en place les réponses aux risques.
- **Les catégories des risques** qui fourniront un moyen pour regrouper les risques.
- Ces catégories dépendent du métier dans lequel évolue le projet, et sont souvent représentées sous la forme d'un organigramme.
- **La matrice de probabilité et d'impacts des risques** à utiliser pour qualifier la criticité de chaque risque.
- **Le format du rapport des risques.**

Exemple **Organigramme des catégories de risques**

Dans cet organigramme, des catégories de risques, les exigences des parties prenantes, la technique à utiliser et la législation en vigueur sont vues comme des catégories de risques. Le fait que la société ait déjà mené des projets similaires et l'expertise générée par ces projets représentent des catégories d'opportunités.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

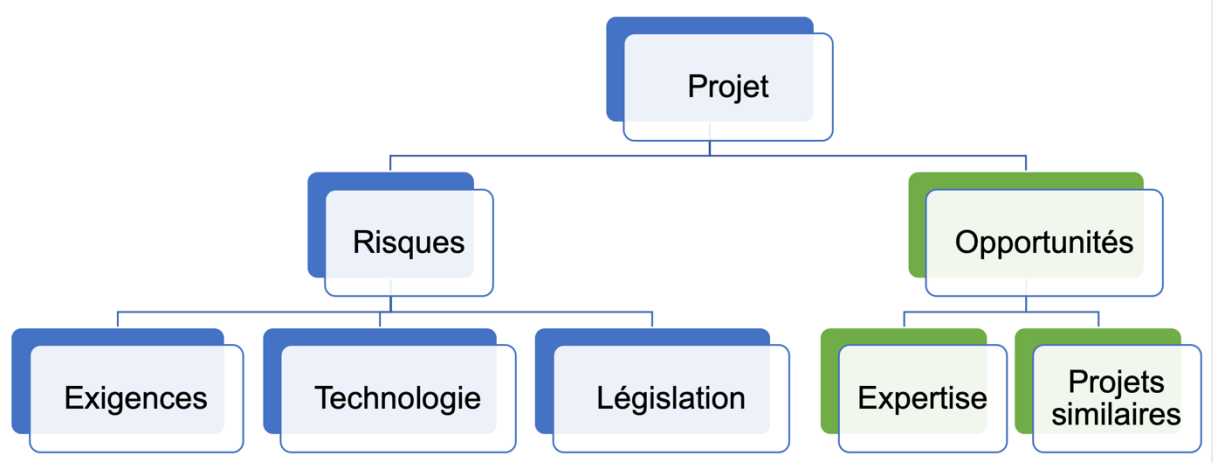

Le chef de projet et son équipe vont s'appuyer sur des catégories de menaces et d'opportunités utilisées dans des projets similaires ou disponibles sur la toile pour créer l'organigramme des catégories de risques du projet.

C. Comment qualifier la probabilité d'occurrence et les impacts des risques ?

L'impact d'un risque peut se caractériser par des coûts supplémentaires, des délais supplémentaires ou tout autre critère jugé important par les parties prenantes, comme la qualité des livrables ou l'image du projet par exemple.

Les parties prenantes n'ayant pas toutes le même ressenti vis-à-vis des risques, le chef de projet et son équipe vont devoir qualifier ces ressentis. Le résultat de cette étude est une échelle de criticité.

Le chef de projet et son équipe produisent leur propre échelle ou s'appuient sur une échelle existant dans l'organisation.

Exemple

L'exemple suivant est une échelle de criticité pour les probabilités d'occurrence, et les impacts financiers, temporels ou qualitatifs.

Échelle	Probabilité d'occurrence	Impacts sur les objets du projet		
		Pertes ou Gains	Délais ou Gains de temps	Qualité des livrables
Très élevée	> 80 %	> 500 000 €	> 8 mois	Très fortement affectée
Élevée	60 % à 80 %	50 000 € à 500 000 €	> 4 mois et < 8 mois	Fortement affectée
Moyenne	40 % à 59 %	10 000 € à 49 999 €	1 mois à 4 mois	Moyennement affectée
Faible	10 % à 39 %	1 000 € à 9 999 €	1 semaine à 4 semaines	Faiblement affectée
Nulle	< 10 %	< 1 000 €	< 1 semaine	Nulle

Cette matrice montre qu'une probabilité d'occurrence comprise en 40 % et 59 % sera qualifiée de moyenne, et qu'un délai ou un gain de temps supérieur à 8 mois sera qualifié de très élevé.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

D. Comment qualifier les risques ?


Remarque

L'échelle de criticité permet facilement de définir qu'un risque ayant une probabilité d'occurrence très élevée et générant une lourde perte financière sera un risque de criticité très élevé. Par contre, cette échelle ne nous permet pas de qualifier la criticité d'un risque générant une lourde perte financière, mais avec une probabilité d'occurrence faible.

L'outil qui permettra de juger de la criticité de chaque risque est la matrice de probabilité et d'impact. Là encore, le chef de projet et son équipe produisent leur propre matrice ou s'appuient sur une matrice de l'organisation.

Exemple

L'exemple suivant est une matrice de probabilité et d'impact qui traite les menaces et les opportunités. Cette matrice montre qu'une menace de probabilité faible et d'impact très élevé sera classée comme une menace élevée.

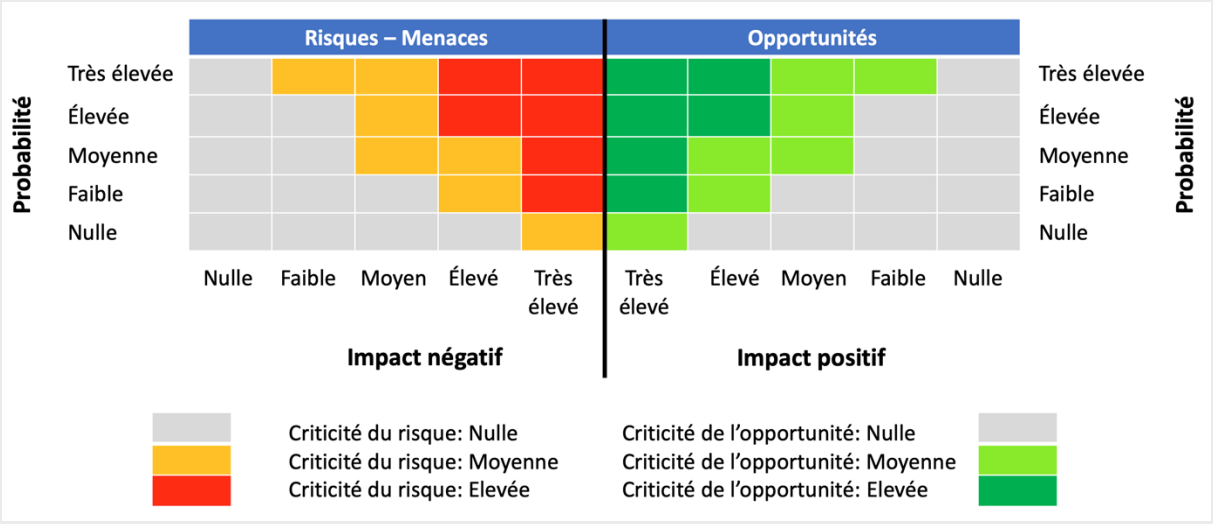

Remarque

La cartographie proposée n'est bien entendu qu'un exemple.

Le nombre de niveaux de criticité variera en fonction du degré de granularité adapté au projet et à ses parties prenantes. De même, la définition de la criticité du risque par rapport à la probabilité d'occurrence et à son impact dépendront des ressentis des parties prenantes et des règles internes à l'entreprise.

Exercice : Quiz

Question 1

La planification de la gestion des risques est un processus critique.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 2

Les catégories de risques sont les mêmes, quel que soit le métier dans lequel évolue le projet.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- Vrai
- Faux

Question 3

Il est intéressant de catégoriser les menaces et les opportunités.

- Vrai
- Faux

Question 4

L'échelle de criticité doit correspondre au ressenti des parties prenantes.

- Vrai
- Faux

Question 5

La matrice des probabilités et des impacts :

- Permet de catégoriser et prioriser les opportunités
- Permet de prioriser les risques
- Permet de catégoriser les risques
- Permet de prioriser les menaces et les opportunités

III. Identifier les risques

Ce processus inclut l'identification et la documentation des risques et des sources qui peuvent générer ces risques. Ce processus sera répété tout au long du projet, et s'appuie principalement sur des entretiens avec les parties prenantes.

Lorsque les parties prenantes sont trop nombreuses, le chef de projet pourra utiliser des questionnaires pour récolter les informations relatives aux risques.

À l'inverse, quand les parties prenantes sont peu nombreuses, le chef de projet pourra mettre en place des sessions de réflexion de groupe comme le brainstorming par exemple.

Pour pouvoir comprendre chaque risque, il est important que l'équipe de projet utilise un format cohérent de documentation, et un support spécifique que l'on appelle le registre des risques.

B. Registre des risques

Le registre des risques contiendra pour chaque risque identifié, des informations telles que :

- L'identification du risque soit un numéro de séquence, une description du risque, sa catégorie, sa probabilité d'occurrence, ses impacts, sa criticité avant et après la mise en place des remèdes.
- Les rôles et responsabilités liés à la gestion du risque.
- Les réponses potentielles.
- Le statut du risque et sa priorité.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple **Registre des risques**

Les tableurs du commerce tels que Excel sont parfaits pour créer et gérer le registre des risques. Le chef de projet pourra adapter des modèles en provenance du web.

Projet A : Registre des risques Date de dernière mise à jour : 01 janvier 2020

#	Description	Catégorie	Probabilité d'occurrence	Impacts	Criticité	Sources	Responsable du risque	Réponse	Criticité après réponse	Statut	Date	Priorité
1	Retard dans la livraison des serveurs	Fournisseur	Faible	Moyen	Moyenne	Courriel du fournisseur	Responsable des achats	Nous utiliserons des serveurs reçus pour le projet B	Nulle	En cours	10/06/2019	Moyenne
2	Manque de formation en C++	Technique	Élevée	Élevé	Élevée		Chef de projet et responsable formation	Mise en place d'une formation accélérée de l'équipe, sur le site de l'entreprise.	Moyenne	En cours	20/09/2019	Haute
3	Manque de salle de réunion	Logistique	Moyenne	Faible	Nulle	Équipe de projet	Chef de projet			Identifié	20/12/2019	Basse
4	Possibilité de licences groupées	Achat	Moyenne	Moyen	Moyenne	Responsable des achats	Chef de projet	Discuter avec les autres chefs de projet		Identifié	27/12/2019	Moyenne
5												

Dans cet exemple, le risque numéro 4 est une opportunité, les autres risques sont des menaces.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

C. Aides à l'identification des risques

Exemple de registre des risques

Si l'expérience, la connaissance de projets similaires, la compétence et le travail en groupe sont la base de l'identification des risques, plusieurs méthodes peuvent aider à identifier les risques. L'équipe de projet peut :

- Identifier les risques à partir des catégories.
- Identifier les risques à partir du découpage du projet, et en particulier de la Work Breakdown Structure.
- Identifier les risques par rapport à des listes de contrôle existant dans l'organisation.
- Utiliser un des acronymes suivants :
  - PESTEL : les risques du projet seront identifiés sous l'angle **P**olitique, **É**conomique, **S**ociologique, **T**echnologique, **É**cologique et enfin **L**égal.
  - TECOP : les risques du projet seront identifiés sous l'angle **T**echnologique, **É**cologique, **C**ommercial, **O**pérationnel, et enfin **P**olitique.
  - VUCA : les risques du projet seront identifiés sous l'angle **V**olatilité, Incertitude (**U**ncertainty), **C**omplexité et enfin **A**mbiguïté.

D. Hypothèses comme source de risque

Conseil **Exemple de registre des risques**

Les hypothèses du projet sont une source de risques trop souvent négligées. Pour éviter cela, et dans l'intérêt du projet, le chef de projet validera toutes les hypothèses et créera une entrée dans le registre des risques pour toute hypothèse non validée.

E. Écueils dans l'identification des risques

Conseil **Exemple de registre des risques**

L'identification des risques n'est pas si simple que cela. Le chef de projet et son équipe devront surmonter plusieurs écueils :

- Ne pas être assez précis. Par exemple, identifier un risque de dépassement de budget. Ce risque est compréhensible, mais inexploitable s'il n'est pas plus détaillé. De quel dépassement parlons-nous ? Quand ce dépassement se produira-t-il ? Et pourquoi aura-t-il lieu ? Sont des questions qui demandent une réponse précise.
- Confondre problème et risque. Par exemple, si le projet se déroule pendant l'été, alors il y a un problème de ressources humaines, et il faut le traiter comme un problème et non pas comme un risque.
- Confondre risque et déficience dans l'exercice de la gestion de projet. Par exemple, les problèmes de coordination ou de mésentente dans l'équipe de projet ou de changement d'exigences des parties prenantes ne relèvent pas de la gestion des risques, mais bien de la gestion de projet.
- Alourdir le registre des risques avec des risques sur lesquels le chef de projet n'a aucun pouvoir. Par exemple, inclure de manière systématique des risques liés aux catastrophes naturelles peut ne pas être judicieux par rapport au type de projet et son contexte.
- Limiter l'identification des risques au seul chef de projet. L'identification des risques est un travail collectif, le faire de manière isolée et individuelle ne donnera pas une liste exhaustive.

Exercice : Quiz

Question 1

L'identification des risques inclut l'identification, la documentation des risques et des sources des risques.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- Vrai
- Faux

Question 2

Quelle est la meilleure méthode pour identifier les risques ?

- Se documenter dans les journaux professionnels
- Demander à un junior d'identifier les risques, il a un œil neuf
- Faire une séance de réflexion à l'intérieur de l'équipe et envoyer un questionnaire aux parties prenantes
- Attendre que le risque se passe pour l'identifier

Question 3

Le registre des risques n'est jamais mis à jour.

- Vrai
- Faux

Question 4

Le chef de projet et son équipe peuvent identifier les risques à partir des catégories de risques, de la Work Breakdown Structure ou de modèles comme TECOP ?

- Vrai
- Faux

Question 5

L'identification des risques ne pose pas de problème en général.

- Vrai
- Faux

IV. Prioriser les risques

La priorisation des risques est le processus qui permettra de hiérarchiser les risques en fonction de leur criticité, donc de leur probabilité d'occurrence et de leur impact.

Cette priorisation permet au groupe de projet de focaliser leurs efforts sur les risques à priorité élevée.

Les risques de criticité plus faibles seront surveillés, mais ne seront pas suivis d'actions tant qu'ils n'évoluent pas.

L'équipe de projet fait systématiquement une priorisation qualitative basée sur une échelle de criticité large par exemple très critique, critique, moyennement critique, pas critique.

Si le plan de gestion des risques le précise, l'équipe de projet fera ensuite une priorisation Quantitative basée sur des probabilités d'occurrence et sur les impacts chiffrés.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

A. Priorisation qualitative

Pour chaque risque, l'équipe de projet :

1. Évalue la criticité du risque en se servant de l'échelle des criticités et de la matrice des probabilités et des impacts.
2. Évalue potentiellement d'autres paramètres que criticité et impacts.
3. Mets à jour le registre des risques.

Les tableurs du marché, comme Excel, permettent de trier facilement les risques du registre sur leur criticité. L'équipe de projet appliquera alors les autres processus de la gestion des risques, y compris la priorisation Quantitative si besoin, aux risques les plus critiques.

Conseil

L'exercice de priorisation des risques se fait collectivement avec l'équipe de projet et toute partie prenante qui peut apporter de l'expertise à cet exercice. Le recours à un facilitateur permettra de lutter contre d'éventuels partis pris au sein de l'équipe.

La priorisation des risques peut mettre en lumière le besoin de revoir la matrice des probabilités et des impacts. Dans ce cas, l'équipe de projet devra revoir l'ensemble des risques référencés dans le registre des risques.

B. Autres paramètres de Priorisation

En plus de la probabilité d'occurrence et des impacts, l'équipe de projet peut étudier d'autres paramètres tels que :

- La proximité dans le temps avant que le risque ne puisse avoir un impact,
- L'urgence dans laquelle il faut exécuter la réponse au risque,
- La facilité avec laquelle un risque qui se réalise peut-être détecté,
- L'impact stratégique que peut avoir le risque sur la compagnie,
- La connectivité entre le risque et d'autres risques.

Exemple

Par exemple, la méthode **AMDEC** pour **A**nalyse des **M**odes des **D**éfaillances, de leurs **E**ffets et de leur **C**riticité tient compte de la probabilité d'occurrence, des impacts et de la détectabilité du risque. L'AMDEC est très utilisé dans le domaine de l'automobile. Le développement des témoins de franchissement de ligne blanche, d'endormissement du conducteur ou encore de baisse de pression des pneumatiques a permis d'augmenter la détectabilité de ces facteurs de risques.

C. Priorisation Quantitative

Cette priorisation consiste à évaluer de manière la plus précise possible les probabilités d'occurrence et les impacts. Elle est relativement compliquée et demande l'utilisation d'outils mathématiques et statistiques comme la méthode de Monte-Carlo. En général, elle n'est effectuée que pour des projets vraiment importants, et par des ressources spécialisées.

C'est par contre la seule méthode qui permet de calculer le coût global du risque du projet.

Cette méthode encore plus que la priorisation qualitative demande des données extrêmement correctes ; nous ne parlons plus de fourchettes ou d'intervalles, mais bien de valeurs !

Exercice : Quiz

Question 1

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

La priorisation qualitative est faite après la priorisation quantitative.

- Vrai
- Faux

Question 2

La priorisation qualitative est faite à partir de la matrice des probabilités et des impacts.

- Vrai
- Faux

Question 3

En plus des probabilités et des impacts, l'équipe de projet peut utiliser :

- Le hasard
- D'autres critères comme la proximité ou la connectivité
- Aucun autre critère

Question 4

La priorisation quantitative est basée sur des échelles de valeurs telles que : important, moyennement important ou sans importance.

- Vrai
- Faux

Question 5

Il est plus facile de faire une priorisation quantitative qu'une priorisation qualitative.

- Vrai
- Faux

Question 6

La priorisation des risques est faite par le chef de projet seulement.

- Vrai
- Faux

V. Définition et mise en place des remèdes

Ce processus définit les moyens appropriés pour mettre le projet à l'abri des menaces identifiées et s'assure que le projet saisira les opportunités identifiées. Ce processus n'est appliqué que sur les risques dont la criticité le réclame. La décision de la définition et la mise en place des remèdes suivent des stratégies différentes selon que l'équipe de projet traite une menace ou une opportunité.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

A. Stratégie pour gérer les menaces

Le chef de projet et son équipe peuvent choisir parmi cinq stratégies : escalader la menace, l'éviter, le transférer, l'atténuer et enfin accepter la menace.

1. **Escalader** : quand le chef de projet et son équipe sont dans l'incapacité de gérer une menace, ils peuvent l'escalader par exemple au donneur d'ordre ou au comité de pilotage du projet.
2. **Éviter** : l'équipe de projet mettra tout en place pour éliminer l'apparition de la menace ou s'assurer qu'elle n'aura aucun impact sur le projet.
3. **Transférer** : l'équipe de projet transférera la menace vers un tiers qui devra le gérer et supportera son impact si elle venait à se produire. C'est la stratégie qui est utilisée quand on prend une assurance par exemple.
4. **Atténuer** : l'équipe de projet fera en sorte de réduire la probabilité d'occurrence de la menace ou réduire son impact si elle venait à se produire.
5. **Accepter** : l'équipe de projet reconnaît l'existence de la menace, mais ne met pas en place d'action particulière pour la gérer.

B. Stratégie pour gérer les opportunités

Le chef de projet et son équipe peuvent choisir parmi cinq stratégies : escalader l'opportunité, l'exploiter, la partager, l'améliorer et enfin accepter l'opportunité.

1. **Escalader** : quand le chef de projet et son équipe sont dans l'incapacité de gérer une opportunité, ils peuvent l'escalader par exemple au donneur d'ordre ou au comité de pilotage du projet.
2. **Exploiter** : l'équipe de projet mettra tout en place pour que l'opportunité se produise et que son impact soit maximal.
3. **Partager** : l'équipe de projet partagera l'opportunité avec un tiers. Dans le cas où l'opportunité se produise, son impact sera aussi partagé.
4. **Améliorer** : l'équipe de projet fera en sorte d'augmenter la probabilité d'occurrence de l'opportunité ou son impact.
5. **Accepter** : l'équipe de projet reconnaît l'existence de l'opportunité, mais ne met pas en place d'action particulière pour la gérer.

C. Définition et mise en place des remèdes

La définition des remèdes

L'équipe de projet définit les remèdes. Pour cela, elle va :

- Sélectionner les risques les plus critiques,
- Définir une stratégie à appliquer pour chacun d'entre eux,
- Définir les actions, les efforts et les coûts d'implémentation du remède,
- Nommer un responsable de la mise en place de ces actions,
- Intégrer les actions dans la Work Breakdown Structure, le planning du projet et son budget.

Chaque fois que nécessaire, le registre des risques sera modifié.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

La mise en place des remèdes

Certains remèdes sont mis en place de manière préventive, pour d'autres, il faut attendre que des événements prédéfinis se déroulent. Dans les 2 cas,

- Le responsable du risque s'assure que les actions sont effectuées dans les temps,
- L'équipe de projet estime à nouveau la criticité et les impacts du risque.

Chaque fois que nécessaire, le registre des risques sera modifié.

Attention

Dans beaucoup de sociétés, la mise en place d'un remède s'effectue après avoir rédigé une demande de changement et avoir obtenu son approbation. Ce processus permet de s'assurer des conséquences de la mise en place d'un remède sur les contraintes principales du projet comme les délais, le budget ou la qualité.

D. Quels risques peuvent exister après la mise en place des remèdes ?

Pendant la définition du remède et après sa mise en place, l'équipe de projet doit faire collectivement une analyse pour répondre à deux questions importantes :

1. L'implémentation du remède peut-elle ou a-t-elle déclenché l'apparition d'un risque secondaire ?
2. L'implémentation du remède laisse-t-elle un risque résiduel ?

En fonction des réponses à ces questions, l'équipe de projet devra éventuellement mettre en place un nouveau remède, et bien entendu modifier le registre des risques.

Exercice : Quiz

Question 1

Les stratégies pour gérer les menaces et les opportunités sont les mêmes.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 2

L'équipe de projet met tout en place pour éliminer une menace. Quelle stratégie est utilisée ?

- ○ L'escalade
- ○ L'exploitation
- ○ L'évitement
- ○ L'acceptation

Question 3

L'équipe de projet met en place un remède pour tous les risques identifiés.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 4

L'équipe de projet implémente immédiatement une réponse, un remède pour les risques les plus critiques.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- Vrai
- Faux

Question 5

La mise en place d'un remède peut créer l'apparition d'un risque secondaire.

- Vrai
- Faux

VI. Maîtriser les risques

A. Risques et opportunités ne sont pas figés

De nouveaux risques apparaissent tout au long du projet, et d'autres disparaissent. La mise en place des réponses ou les processus de gestion des risques peuvent ne pas donner entière satisfaction. Pour toutes ces raisons, on peut clairement affirmer que les risques et opportunités ne sont pas figés, mais évoluent tout au long du projet, et doivent donc être maîtrisés par l'équipe de projet.

B. Maîtriser les risques identifiables

Maîtriser les risques identifiables, consiste à :

- Identifier les nouveaux risques, comprendre leurs probabilités d'occurrence et leurs impacts, définir leurs criticités, et mettre en place d'éventuels remèdes.
- Suivre les risques déjà identifiés, et mettre en place les remèdes ou actions nécessaires en cas de changement de statut.
- Analyser et suivre la pertinence des réponses, et l'apparition de risques secondaires ou résiduels.
- Auditer la pertinence des processus de gestion des risques et si besoin les modifier ou les adapter, par exemple en changeant la fréquence des réunions de revue des risques.
- Modifier si besoin le plan de gestion des risques.
- S'assurer que le registre des risques est à jour.

Conseil

Une courte revue des risques en début de chaque réunion hebdomadaire de l'équipe de projet est un moyen pertinent pour comprendre et maîtriser les risques tout au long du projet.

C. Que faire avec les risques non identifiables ?

Les risques non identifiables sont couverts par des réserves financières ou des réserves de temps. Le chef de projet devra régulièrement s'assurer que ces réserves sont suffisantes, et si ce n'est pas le cas, demander leur augmentation au comité de pilotage du projet.

Conseil

L'accroissement des réserves signifie l'augmentation du budget ou des délais du projet, n'oubliez pas de peaufiner votre argumentaire avant de faire votre demande auprès du comité de pilotage du projet.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

D. Rapport des risques


La maîtrise des risques d'un projet demande de faire un effort de communication en mettant à la disposition des parties prenantes un rapport sur les risques du projet. Idéalement, ce rapport est mensuel et mis à la disposition par l'intermédiaire d'une page Web de manière à laisser la liberté aux parties prenantes de le consulter ou non.

Ce rapport contient des données chiffrées comme par exemple :

- Le nombre de risques identifiés
- Le pourcentage de risques par catégorie
- Le pourcentage de risques par criticité
- Les 5 ou 10 risques les plus critiques
- Le nombre de risques encore actifs
- Le coût des remèdes mis en place
- Les gains qu'ont permis les remèdes quand le risque s'est produit
- Des informations sur les réserves consommées et disponibles pour les risques non prévisibles
- Les tendances à la hausse ou à la baisse du nombre de risques identifiés, etc.

Exemple **Rapport des risques**

Le contenu du rapport des risques dépendra des attentes des parties prenantes et devra être décrit dans le plan de gestion des risques. L'exemple suivant est volontairement simplifié.

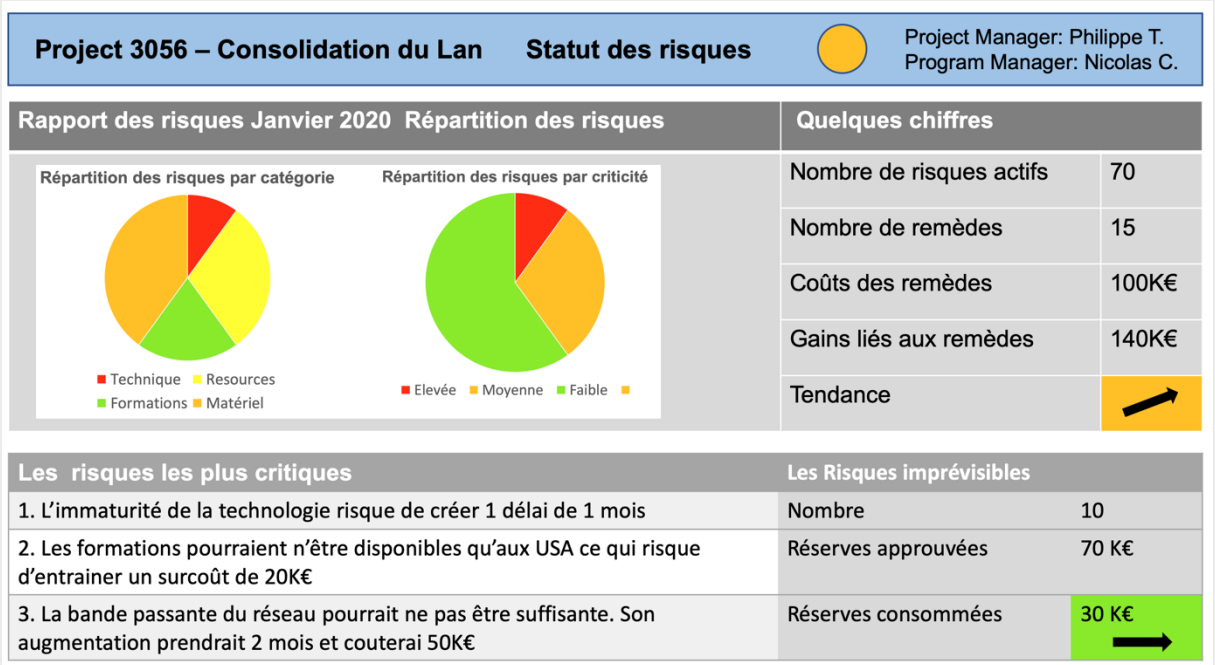

Exercice : Quiz

Question 1

Les risques n'évoluent pas au fur et à mesure de la progression du projet.

- Vrai
- Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 2

Une fois les remèdes mis en application, il est nécessaire de continuer à maîtriser les risques.

- Vrai
- Faux

Question 3

Comment gérer les risques non identifiables ?

- En surveillant leur évolution
- En analysant les réserves
- En envoyant une copie du registre des risques au comité de pilotage

Question 4

Idéalement, le chef de projet placera une revue des risques en début de chaque réunion de projet.

- Vrai
- Faux

Question 5

Il n'est pas possible de changer des processus de gestion des risques inefficaces.

- Vrai
- Faux

VII. Essentiel

Il est vital pour un projet d'identifier et gérer les risques. Même si la recette miracle pour gérer les risques n'existe pas, l'implémentation de processus de gestion des risques solides et leur suivi tout au long du projet, permet dans la plupart des cas d'atténuer les menaces et d'améliorer les opportunités.

Pour les risques non identifiables, des réserves correctement dimensionnées permettront de venir à bout de leurs impacts en gardant planning et budget sous contrôle.

VIII. Auto-évaluation

A. Test

Vous êtes chef de projet dans une entreprise de développement informatique de la région Grenobloise ISER-Soft. Le président-directeur général d'ISER-Soft, M. Dir, désire faire la transformation numérique d'ISER-Soft et vous en a confié le projet. Celui-ci consiste à mettre en place un ERP et ainsi automatiser les 3 grands processus de l'entreprise : la gestion des clients, la gestion des fournisseurs et la gestion des produits.

M. Dir voudrait sélectionner un ERP en provenance d'une petite société ERP-4-You nouvelle sur le marché. La technique employée par ERP-4-You est une technique propriétaire. Personne chez ISER-Soft n'a jamais dirigé ou implémenté d'ERP.

Vous pouvez commencer le projet en mai et le finir au plus tôt fin août. M. Dir insiste sur le fait que le projet ne doit pas pénaliser la bonne marche des processus principaux de l'entreprise. D'après M. Dir la mise en place de l'ERP pourrait réduire les coûts de gestion de 300 000 €.

Exercice : Quiz

Question 1

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Le projet comporte des risques.

- Vrai
- Faux

Question 2

Le choix de la société ERP-4-You présente-t-il des risques ?

- Pas plus qu'une autre société présente sur le marché depuis longtemps.
- Pas plus qu'une autre société utilisant une technique connue sur le marché.
- Ce choix est à risque, ERP-4-You est nouvelle sur le marché et utilise une technique propriétaire.
- Le fait de travailler avec une petite société nouvelle sur le marché apportera une dynamique forte au projet.

Question 3

L'équipe d'ISER-Soft présente un risque.

- Vrai
- Faux

Question 4

Quel est le risque particulier à analyser pour les mois de mai, de juillet et d'août ?

- La signature du contrat avec ERP-4-You doit être terminée.
- Les ressources d'ISER-Soft doivent être disponibles.
- Il n'y a pas de risque particulier.
- Les ressources d'ISER-Soft et d'ERP-4-You peuvent être indisponibles.

Question 5

Une fois le projet approuvé, quelle sera une de vos premières tâches ?

- Prendre des vacances.
- Faire un plan de la gestion des risques et identifier les risques avec votre équipe et les parties prenantes.
- Suivre une formation complète sur les ERP du marché.
- Mettre en place une formation pour votre équipe.

B. Exercice :

Vous êtes chef de projet dans une entreprise de développement informatique de la région Grenobloise ISER-Soft. Le président-directeur général d'ISER-Soft, M. Dir, désire faire la transformation numérique d'ISER-Soft et vous en a confié le projet. Celui-ci consiste à mettre en place un ERP et ainsi automatiser les 3 grands processus de l'entreprise : la gestion des clients, la gestion des fournisseurs et la gestion des produits.

M. Dir voudrait sélectionner un ERP en provenance d'une petite société ERP-4-You nouvelle sur le marché. La technique employée par ERP-4-You est une technique propriétaire. Personne chez ISER-Soft n'a jamais dirigé ou implémenté d'ERP.

Vous pouvez commencer le projet en mai et le finir au plus tôt fin août. M. Dir insiste sur le fait que le projet ne doit pas pénaliser la bonne marche des processus principaux de l'entreprise. D'après M. Dir la mise en place de l'ERP pourrait réduire les coûts de gestion de 300 000 €.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 1

Avec les données de l'énoncé et les informations des questions précédentes, quelles sont d'après vous les 3 catégories de menaces les plus importantes à prendre en compte et quelle criticité leur associer ?

Question 2

Vous aimeriez présenter des solutions alternatives à M. Dir. Que pouvez-vous lui proposer et expliquez quelle stratégie de réponse aux risques vous mettez en place. Utilisez les 3 catégories les plus importantes définies précédemment, et regardez quelle stratégie d'opportunité peut être implémentée.

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 5 Solution n°1

Question 1

Un risque est un événement certain.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Q Un risque est un événement incertain, qui est défini par une probabilité d'occurrence et un impact sur le projet s'il se produit.

Question 2

Comment sont traités les risques non identifiables ?

- ○ De la même manière que les risques identifiables
- ○ En mettant en place des remèdes préventifs
- ◉ En mettant en place des réserves financières ou des réserves de temps
- ○ En contrôlant les facteurs déclencheurs

Q Par définition, rien ne permet d'identifier les risques non identifiables, donc il n'est pas possible de mettre en place de remèdes ou de suivre des facteurs déclencheurs. La seule solution consiste à mettre en place des réserves financières ou des réserves de temps, en général un pourcentage du budget ou de la durée du projet.

Question 3

L'étude des risques se focalise sur les risques qui peuvent avoir un effet négatif sur le projet.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Q Il est tout aussi important de comprendre et gérer les opportunités que de comprendre et gérer les menaces.

Question 4

L'analyse des risques permet :

- ○ De définir les processus de gestion des risques
- ◉ De prioriser les risques
- ○ D'identifier les risques
- ○ De créer des réserves financières pour les risques non identifiables

Q Le but de l'analyse des risques est de prioriser les risques de manière à focaliser les efforts de l'équipe de projet sur les risques les plus prioritaires, les plus critiques.

Question 5

Les réponses aux risques permettent uniquement de protéger le projet des impacts des risques négatifs.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Q Les réponses aux risques permettent de protéger le projet des impacts des menaces, mais aussi de s'assurer que le projet pourra bénéficier des opportunités qui se présenteront.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 8 Solution n°2

Question 1

La planification de la gestion des risques est un processus critique.

- [x] Vrai
- [ ] Faux

Les risques sont gérés tout au long du projet. Pour que cela se passe bien, il est primordial de définir en amont les méthodes de gestion des risques, les rôles et responsabilités associés ou la fréquence des revues des risques. Cela se fait par l'établissement d'un plan de gestion des risques.

Question 2

Les catégories de risques sont les mêmes, quel que soit le métier dans lequel évolue le projet.

- [ ] Vrai
- [x] Faux

Les catégories de risques sont très dépendantes du métier dans lequel évolue le projet. Dans le bâtiment ou les travaux publics, par exemple, les risques d'accidents physiques sont bien réels, ce qui n'est en général pas le cas dans les projets informatiques.

Question 3

Il est intéressant de catégoriser les menaces et les opportunités.

- [x] Vrai
- [ ] Faux

La gestion des risques adresse les menaces et les opportunités, il est donc intéressant de les catégoriser.

Question 4

L'échelle de criticité doit correspondre au ressenti des parties prenantes.

- [x] Vrai
- [ ] Faux

L'échelle de criticité est une représentation du ressenti et de la vision des parties prenantes face aux probabilités d'occurrence et aux impacts des risques. Si le sponsor par exemple juge qu'un dépassement au-dessous de 10 000 € du budget du projet n'a pas d'impact significatif alors un dépassement en dessous de ce seuil aura une criticité faible ou nulle.

Question 5

La matrice des probabilités et des impacts :

- [ ] Permet de catégoriser et prioriser les opportunités
- [ ] Permet de prioriser les risques
- [ ] Permet de catégoriser les risques
- [x] Permet de prioriser les menaces et les opportunités

La matrice des probabilités et impacts va permettre de comprendre la criticité des risques et par la suite de prioriser les risques selon cette criticité.

Exercice p. 11 Solution n°3

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 1

L'identification des risques inclut l'identification, la documentation des risques et des sources des risques.

- [x] Vrai
- [ ] Faux

L'identification des risques consiste à lister les risques, documenter leurs caractéristiques y compris les événements sources du risque.

Question 2

Quelle est la meilleure méthode pour identifier les risques ?

- [ ] Se documenter dans les journaux professionnels
- [ ] Demander à un junior d'identifier les risques, il a un œil neuf
- [x] Faire une séance de réflexion à l'intérieur de l'équipe et envoyer un questionnaire aux parties prenantes
- [ ] Attendre que le risque se passe pour l'identifier

L'identification des risques se fait en réunion et en utilisant des questionnaires. Les journaux professionnels et un œil neuf peuvent aider, en complément.

Question 3

Le registre des risques n'est jamais mis à jour.

- [ ] Vrai
- [x] Faux

Le registre des risques est élaboré de manière progressive, et il est mis à jour tout au long du projet, par exemple pour inclure de nouveaux risques.

Question 4

Le chef de projet et son équipe peuvent identifier les risques à partir des catégories de risques, de la Work Breakdown Structure ou de modèles comme TECOP ?

- [x] Vrai
- [ ] Faux

Les catégories de risques, la Work Breakdown structure ou des listes préétablies dans l'organisation sont autant d'aides à l'identification des risques.

Question 5

L'identification des risques ne pose pas de problème en général.

- [ ] Vrai
- [x] Faux

L'identification des risques doit surmonter plusieurs écueils, comme le manque de précision, la confusion entre problème et risque ou la confusion entre risques et déficiences de gestion du projet.

Exercice p. 13 Solution n°4

Question 1

La priorisation qualitative est faite après la priorisation quantitative.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- ○ Vrai
- ◉ Faux

La priorisation qualitative se fait toujours avant la priorisation quantitative. La priorisation quantitative, est optionnelle, elle réclame des outils et des ressources spécialisés.

Question 2

La priorisation qualitative est faite à partir de la matrice des probabilités et des impacts.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

L'équipe de projet priorise les risques par rapport à la matrice des probabilités et des impacts. L'équipe de projet peut développer cette matrice ou utiliser une matrice de l'organisation.

Question 3

En plus des probabilités et des impacts, l'équipe de projet peut utiliser :

- ○ Le hasard
- ◉ D'autres critères comme la proximité ou la connectivité
- ○ Aucun autre critère

D'autres critères peuvent être utilisés comme la proximité dans le temps avant que le risque ne puisse avoir un impact sur le projet ou la connectivité entre le risque et d'autres risques.

Question 4

La priorisation quantitative est basée sur des échelles de valeurs telles que : important, moyennement important ou sans importance.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

La priorisation quantitative est basée sur des valeurs de probabilité et d'impact et non pas sur des échelles.

Question 5

Il est plus facile de faire une priorisation quantitative qu'une priorisation qualitative.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

La priorisation qualitative est basée sur des échelles de criticité, alors que la priorisation quantitative est basée sur des valeurs. La priorisation qualitative est beaucoup plus simple à réaliser.

Question 6

La priorisation des risques est faite par le chef de projet seulement.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

La priorisation des risques comme leur identification est un exercice collectif. Il doit se faire avec l'équipe de projet, un éventuel modérateur et toute partie prenante apportant une valeur ajoutée à ce processus.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 16 Solution n°5

Question 1

Les stratégies pour gérer les menaces et les opportunités sont les mêmes.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Q Les stratégies pour gérer les menaces et les opportunités sont similaires, on peut établir une certaine correspondance entre elles, mais elles sont différentes. Par exemple, l'on va atténuer la probabilité d'occurrence ou l'impact d'une menace et améliorer la probabilité d'occurrence ou l'impact d'une opportunité.

Question 2

L'équipe de projet met tout en place pour éliminer une menace. Quelle stratégie est utilisée ?

- ○ L'escalade
- ○ L'exploitation
- ◉ L'évitement
- ○ L'acceptation

Q L'évitement consiste à mettre tout en place pour éviter qu'une menace se produise ou pour éviter les impacts de cette menace. L'exploitation correspond à tout mettre en place pour qu'une opportunité se réalise.

Question 3

L'équipe de projet met en place un remède pour tous les risques identifiés.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Q La mise en place d'un remède entraîne des coûts supplémentaires et peut créer des délais supplémentaires. Les remèdes ne sont donc implémentés que pour les risques les plus critiques.

Question 4

L'équipe de projet implémente immédiatement une réponse, un remède pour les risques les plus critiques.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Q Certaines réponses sont mises en place immédiatement, d'autres réponses ne sont mises en place que lorsque certains événements se réalisent.

Question 5

La mise en place d'un remède peut créer l'apparition d'un risque secondaire.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Q La mise en place d'un remède peut effectivement créer un risque secondaire. Dans la vie quotidienne par exemple, la prise d'un médicament peut générer l'apparition d'effets secondaires qui sont autant de risques.

Exercice p. 18 Solution n°6

Question 1

Les risques n'évoluent pas au fur et à mesure de la progression du projet.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Les risques évoluent tout au long du projet, certains risques ne se réaliseront pas. Pour d'autres, les probabilités d'occurrence ou les impacts changent et de nouveaux risques apparaissent.

Question 2

Une fois les remèdes mis en application, il est nécessaire de continuer à maîtriser les risques.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Le processus de maîtrise des risques doit se prolonger tout au long du projet. Une fois les remèdes mis en application, il faut contrôler l'efficacité du remède, vérifier l'apparition de risques secondaires et continuer à identifier les nouveaux risques.

Question 3

Comment gérer les risques non identifiables ?

- ○ En surveillant leur évolution
- ◉ En analysant les réserves
- ○ En envoyant une copie du registre des risques au comité de pilotage

Le chef de projet devra faire une analyse de l'état des réserves financières et des réserves de temps. Si les réserves doivent être augmentées, il peaufinera son argumentation et fera une demande auprès du comité de pilotage.

Question 4

Idéalement, le chef de projet placera une revue des risques en début de chaque réunion de projet.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Idéalement, les risques sont revus en début de chaque réunion de projet, ce qui permet aux membres de l'équipe de donner leur avis et d'adhérer à la gestion des risques.

Question 5

Il n'est pas possible de changer des processus de gestion des risques inefficaces.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Comme tous les processus de la gestion de projet, si les processus de gestion des risques sont inefficaces, il conviendra de les changer. Ces changements peuvent entraîner des coûts, des délais supplémentaires et demanderont de changer le plan de gestion des risques.

Exercice p. 19 Solution n°7

Question 1

Le projet comporte des risques.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- [x] Vrai
- [ ] Faux

Ce projet comme tout projet est unique, n'a jamais été réalisé dans la société ISER-Soft et par conséquent comporte des risques.

Question 2

Le choix de la société ERP-4-You présente-t-il des risques ?

- [ ] Pas plus qu'une autre société présente sur le marché depuis longtemps.
- [ ] Pas plus qu'une autre société utilisant une technique connue sur le marché.
- [x] Ce choix est à risque, ERP-4-You est nouvelle sur le marché et utilise une technique propriétaire.
- [ ] Le fait de travailler avec une petite société nouvelle sur le marché apportera une dynamique forte au projet.

Le choix de ERP-4-You est un choix à risque, la société est de faible taille, nouvelle sur le marché et utilise une technique qu'elle seule connaît. Ces 3 facteurs sont des facteurs de risques.

Question 3

L'équipe d'ISER-Soft présente un risque.

- [x] Vrai
- [ ] Faux

L'équipe d'ISER-Soft par sa méconnaissance de ce type de projet présente un risque.

Des remèdes comme une formation générique aux ERP sont à étudier.

Question 4

Quel est le risque particulier à analyser pour les mois de mai, de juillet et d'août ?

- [ ] La signature du contrat avec ERP-4-You doit être terminée.
- [ ] Les ressources d'ISER-Soft doivent être disponibles.
- [ ] Il n'y a pas de risque particulier.
- [x] Les ressources d'ISER-Soft et d'ERP-4-You peuvent être indisponibles.

Une grosse partie du projet se situera en mai, période qui comporte beaucoup de jours fériés et pendant les vacances d'été. Ces périodes représentent un risque vis-à-vis de la disponibilité des ressources des deux sociétés.

Question 5

Une fois le projet approuvé, quelle sera une de vos premières tâches ?

- [ ] Prendre des vacances.
- [x] Faire un plan de la gestion des risques et identifier les risques avec votre équipe et les parties prenantes.
- [ ] Suivre une formation complète sur les ERP du marché.
- [ ] Mettre en place une formation pour votre équipe.

La première chose à faire consiste à comprendre comment gérer les risques de votre projet et identifier les risques de celui-ci. Partir en vacances en début de projet n'est pas une option, et les formations sont des remèdes qu'il faudra peut-être mettre en place.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. Solution n°8

Nous pouvons imaginer les catégories suivantes :

- **Très Critique** : catégorie processus vitaux de l'entreprise :

  L'ERP devra remplacer les processus les plus vitaux de l'entreprise, la gestion des clients, des fournisseurs et des produits. Une étude extrêmement détaillée des risques sur ces processus devra être menée. Les remèdes devront être en place pour assurer l'absence d'impact sur ces processus vitaux.

- **Critique** : Catégorie fournisseur :
  - La taille de ERP-4-You est un risque, une petite société ne sera peut-être pas en mesure de répondre à vos attentes.
  - La pérennité de ERP-4-You est un risque, une société nouvelle qui ne trouverait pas son marché pourrait être un risque à terme pour le support et l'évolution de l'ERP.
- **Moyennement critique** : catégorie ressource :
  - Les ressources d'ERP-4-You sont un risque. Ce risque est lié à la taille d'ERP-4-You et à la période.
  - Les ressources d'ISER-Soft sont un risque. Ce risque est lié à la méconnaissance des ERP et à la période.

Exercice p. Solution n°9

- **Catégorie processus vitaux de l'entreprise.**
  - **Transférer** : vous pourriez prendre une assurance de manière à réduire l'impact financier sur votre entreprise en cas de problème sur un des processus vitaux.
  - **Atténuer** : vous pourriez proposer d'utiliser un ERP connu sur le marché proposé par une société connue, donc ayant de l'expérience. Cela devrait atténuer les risques sur les processus vitaux.
- **Catégorie fournisseur :**
  - **Éviter** : signer un contrat avec une entreprise connue sur le marché des ERP qui utilise un produit reconnu sur le marché.
  - **Accepter** : signer le contrat avec ERP-4-You et espérer que la société ERP-4-You fonctionne correctement et soit pérenne.
- Catégorie ressources :
  - **Éviter** : signer un contrat avec une grosse entreprise et décaler le projet.
  - **Atténuer** : décaler le projet.

Opportunités : la mise en place devrait permettre une opportunité de 300 000 €.

En travaillant avec une société plus mature qu'ERP-4-You, avec un ERP reconnu sur le marché et en décalant le projet sur une période plus propice, vous devriez pouvoir mettre en place une stratégie d'amélioration de l'opportunité.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite
