Le rôle du chef de projet digital

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Le projet et ses spécificités 3

A. Ce qui fait un projet 3

B. Méthodes descendantes et cycle en V 4

1. Modèle en cascade 5
2. Cycle en V 6

C. Méthodes ascendantes et approches agiles 6

D. Contraintes de coût, de qualité et de délai 8

E. MOA, MOE et la place du chef de projet 8

1. Maîtrise d'ouvrage 8
2. Maîtrise d'œuvre 9

II. Exercice : Quiz 9

III. Chef d'orchestre du projet 10

A. Techniques du chef de projet 10

1. Préparer les documents supports du projet 12
2. Piloter l'activité des ressources du projet 13
3. Maîtrise nécessaire d'outils de pilotage 13

B. Chef de projet, communicant multitâches 15

1. Savoir-être du chef de projet 15
2. Communication ascendante, descendante et horizontale 15
3. Communication ascendante 15
4. Communication descendante 15
5. Communication horizontale 16
6. Influence du chef de projet 16
7. Organisation fonctionnelle 16
8. Organisation matricielle 17
9. Organisation par projet 18

C. Quelques mots de conclusion 19

IV. Exercice : Quiz 19

V. Essentiel 20

VI. Auto-évaluation 20

A. Exercice 20

B. Test 21

Solutions des exercices 22

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Le projet et ses spécificités

Contexte

Vous envisagez de **devenir chef de projet digital** ? Alors ce cours est pour vous.

Selon l'environnement professionnel que vous rejoindrez, **votre rôle de chef de projet** pourra couvrir **des réalités assez différentes**. Toutefois, un **chef de projet** se doit de **maîtriser les fondamentaux** du projet et de sa gestion. Nous commencerons par **quelques rappels généraux** sur les **méthodes** de gestion de projet, avant de nous concentrer sur les **différentes facettes du métier** de chef de projet.

En tant que **chef d'orchestre du projet**, vous devrez posséder une bonne **trousse à outils** pour affronter toutes les situations. Nous vous présenterons les étapes nécessaires à la **description** de votre projet, les grands principes pour **gérer vos ressources** et comment **piloter votre activité**. Nous aborderons ainsi les ***savoir-faire*** essentiels attendus d'un chef de projet.

Mais un bon chef de projet ne saurait se contenter d'être un bon technicien. La **circulation de l'information** étant au cœur de la réussite de tous les projets, quelques ***savoir-être*** et la **gestion de la communication** sont des prérequis.

Découvrons ensemble **le rôle et le métier du chef de projet digital.**

A. Ce qui fait un projet

Un projet, c'est **imaginer**, **définir** et **conduire la réalisation** de quelque chose **qui n'existait pas auparavant**. C'est une entreprise souvent **collective** qui, de fait, va mobiliser des compétences et **expertises multiples**, sur une **durée** et pour un **coût** déterminés, afin de parvenir à **une réalisation concrète**, généralement sous **le pilotage d'un chef de projet.**

Cette réalisation peut être de **n'importe quelle nature** : un projet peut concerner la **construction** d'un bâtiment, la **mise au point** d'une infrastructure technologique, la **modification** d'un système de production et, bien entendu, la **réalisation** d'un projet digital. Peu importe le domaine, un projet, dans ses grandes lignes, **se déroulera sensiblement de la même façon** et mobilisera des **compétences similaires de pilotage**. Mais, vous vous en doutez, la **bonne connaissance du secteur d'activité** sera toujours un plus appréciable pour le chef de projet.

Définition

Selon l'**AFNOR** (*Association Française de NORmalisation*), un projet est « ***un effort unique, mettant en œuvre des moyens (humains, matériels ou services) pour atteindre un objectif dans des délais fixés*** ».

Selon le **PMI** (*Project Management Institute*), un projet c'est « ***une initiative temporaire entreprise dans le but de créer un produit, un service ou un résultat unique*** ».

En d'autres termes, un **projet** :

- **À un début et une fin**, il n'est pas destiné à être reproduit exactement dans les mêmes conditions,
- Est réalisé par une **équipe constituée** à cette fin,
- Nécessite des **ressources** (humaines ou matérielles),

... Pour aboutir à un **résultat unique**.

Un projet peut se dérouler entièrement au sein d'une entreprise ou s'organiser dans le cadre d'une **relation commanditaire – prestataire.**

Exemple

Voici quelques **exemples** de projets :

- **La mise en place d'une équipe de recherche** pour trouver un traitement contre une nouvelle maladie,
- **La mise en œuvre d'un nouveau procédé de fabrication** pour pièce spécifique utilisée dans l'industrie automobile,
- **La réorganisation d'un service** Ressources Humaines (RH) dans une entreprise,
- La **conception et la réalisation d'un site Web**, d'une **application mobile** ou d'un **dispositif interactif,**
- Etc.

On oppose traditionnellement le « ***mode projet*** » au « ***mode processus*** », comme le **fonctionnement d'une usine** par exemple. Un point essentiel les distingue : en mode **projet,** le fait de mener à bien le projet **nécessite de dépenser de l'argent** (on parle de **flux de trésorerie négatif**). À l'inverse, tant qu'une structure en mode **processus,** comme une usine de fabrication, fonctionne, **elle produit de la valeur** (le **flux de trésorerie** est **positif)**. Mener un projet, c'est toujours un **investissement**.

Avec l'avènement de **l'ère de la concurrence et de la compétitivité, l'innovation** est devenue un **impératif** pour un grand nombre d'entreprises. L'innovation, c'est notamment le fait de mettre en œuvre des **solutions nouvelles**, inexistantes jusqu'alors. Dans ce contexte, le **mode projet** s'est rapidement **imposé pour la grande majorité des entreprises**. Et il n'y a pas de projet sans **chef de projet.**

B. Méthodes descendantes et cycle en V

Avec le temps et la **professionnalisation** de la **gestion de projet** (on parle aussi de « *management* » de projet), plusieurs **approches** et **méthodes** ont vu le jour, la plupart de ces méthodes donnant lieu à des **certifications** plus ou moins reconnues.


Les méthodes dites « ***traditionnelles*** » sont regroupées dans la famille des approches **descendantes**.

Dans ces approches, on commence par définir le projet de façon globale. Le principe : parvenir à **une vision de la réalisation future** afin de pouvoir établir des **estimations plus rapides** (mais donc aussi plus **risquées**) des **efforts nécessaires** pour mener à bien le projet. On décrit **l'intégralité de la réalisation**, dès **le début** du projet, dans un « *cahier des charges* » ... Et cette anticipation peut parfois conduire à des **écarts importants** entre le **plan initial** et la **réalité** du projet.

Traditionnellement, on considère que **l'expertise** est portée par **celui qui réalise les estimations**, ce qui conduit le plus souvent à un engagement « ***au forfait*** » : on définit **les contours du projet** et le **montant** nécessaire pour sa réalisation. Derrière un forfait, il y a un **engagement de résultat**.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Cette approche traditionnelle va de pair avec le **paradoxe de la gestion de projet**, illustré par ces deux courbes :

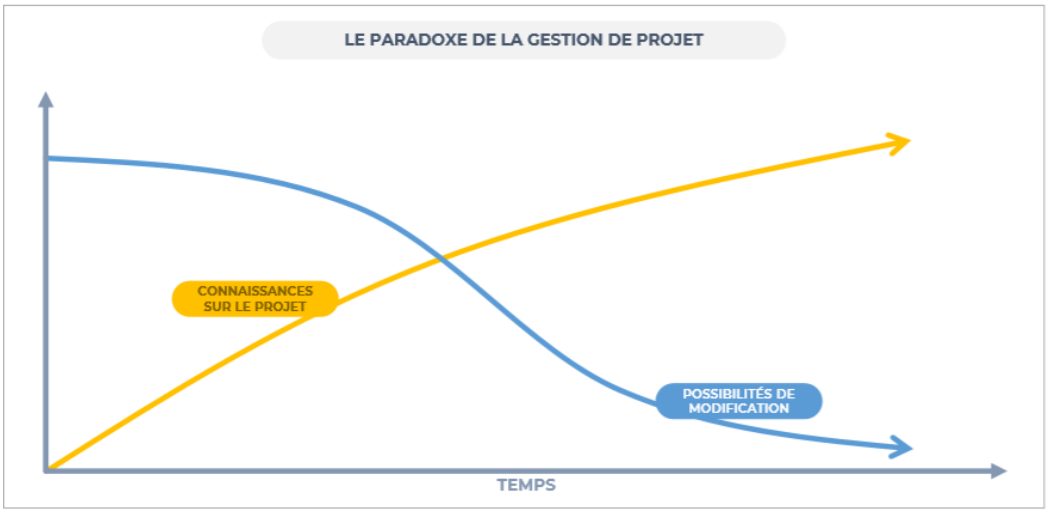

En **début de projet**, on le connaît mal, mais notre **capacité d'action** pour le modifier est **importante.** En **fin de projet,** tous ses paramètres sont **connus**. En revanche, notre capacité à le modifier **tend vers zéro**. Pour le dire plus simplement : une fois le projet terminé, on sait ce qu'on *aurait dû faire*.


Exemple

Parmi les **méthodes** que l'on peut classer dans les **approches descendantes,** vous pourrez rencontrer :

- Les méthodes appliquant ou s'inspirant du **PMBOK** (*Project Management Body of Knowledge – Corpus de connaissances de la gestion de projet*) du **PMI**,
- **PRINCE2**, une méthode orientée processus, particulièrement bien adaptée aux projets d'envergure et qui permet de sécuriser la production des livrables,
- La méthode **3P**, une méthode structurée, adaptable à l'expérience du chef de projet, très outillée,
- L'approche **en cascade** et le **cycle en V**.

1. Modèle en cascade

Le **modèle en cascade** présente le projet sous forme d'une **succession linéaire** d'activités. Il implique un **découpage du projet en phases successives**, qui elles-mêmes, seront découpées en **tâches** pour réaliser le **planning détaillé** du projet. Le principe : les **livrables** de chaque phase devront être **validés avant** de pouvoir commencer la phase suivante. **En cas de difficulté,** d'incompréhension ou de non-conformité révélée **en aval**, il sera **difficile**, dans une application stricte du modèle, de pouvoir renvoyer à l'étape précédente pour obtenir les correctifs nécessaires, les **validations** étant souvent considérées comme des « *loquets* » permettant de préserver les délais en évitant tout « *retour en arrière* ».

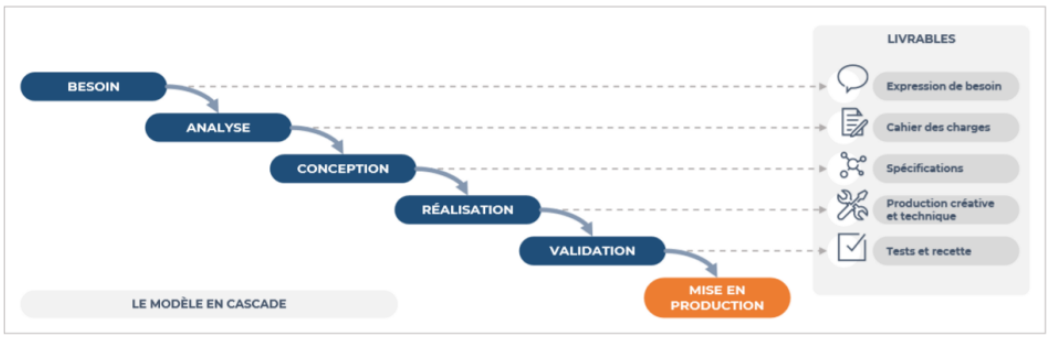

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite


2. Cycle en V

Le **cycle en V** est une **évolution** du modèle en cascade. Il en **reprend les principes** avec une **première séquence** qui permet de **partir du besoin**, de **définir** le produit objet du projet et enfin de le **réaliser**. La **deuxième séquence** permet de **vérifier** que chacune des étapes de définition du produit a bien été réalisée.

Ainsi :

- Les **tests unitaires** confirmeront que la réalisation a été produite **conformément à la conception détaillée** (souvent incarnée par les « *spécifications techniques* »), au niveau de chaque élément qui la compose,
- Les **tests d'intégration** permettent de vérifier que le produit complet à un **fonctionnement cohérent** (ce qui se passe plutôt du côté technique pour un projet digital),
- Les **tests de validation** confirment les **spécifications** (fonctionnelles pour un projet digital), ce qui correspond à la phase de recette dite « *interne* »,
- La **recette** en elle-même (la recette « *client* » ou « *externe* ») est la **phase d'acceptation** par le commanditaire : est-ce que le résultat du projet comble bien les besoins initiaux ?

On remarquera que **les vérifications les plus tardives** correspondent aux livrables de définition définis **le plus tôt** dans le cycle projet.

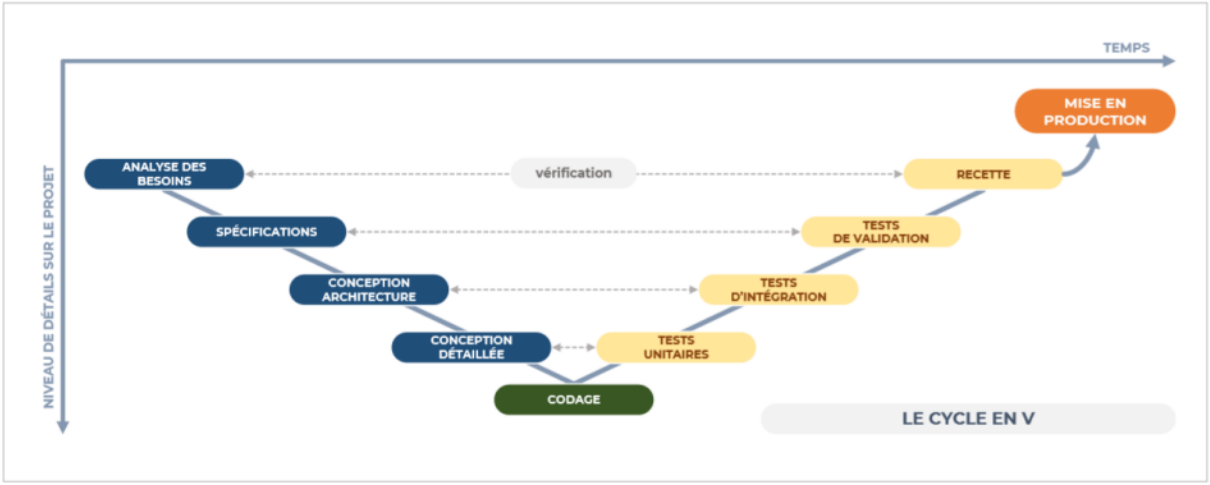

Complément **Les limites de la planification descendante**

Dans un **rapport sur l'accident de Challenger en 1986, R. Feynman** a pointé du doigt les **limites d'une organisation projet descendante**. Il considère notamment que le modèle oblige à des **décisions stratégiques prématurées** et rend **les modifications de conception** extrêmement difficiles.


Toutefois, **dans le digital**, on ne construit que rarement des navettes spatiales. La **planification descendante** a le mérite de **définir avec précision la réalisation** et en conséquence **d'estimer** avec une **certaine sécurité** les **efforts nécessaires** pour y parvenir. Les méthodes de **conception,** de **création** et de **développement** étant relativement **similaires** d'un projet à un autre, ce mode de planification est encore **largement répandu.**

C. Méthodes ascendantes et approches agiles

Si beaucoup de méthodes de gestion de projet sont **issues du secteur de l'industrie**, elles ont aussi **suivi les évolutions des modes de fabrication**. Les entreprises industrielles ont longtemps cherché la **rentabilité** en appliquant les enseignements du taylorisme : augmenter les profits tout en diminuant les coûts, notamment par l'application de la chaîne mise en œuvre par Ford. La logique est simple : soit on exige plus des travailleurs, qui devront travailler plus dur ou plus longtemps, soit **on change radicalement l'approche.**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Contrairement aux méthodes descendantes, les **approches ascendantes** s'attachent à **définir le besoin** plutôt que la solution attendue. On va dans ce cas **largement mobiliser les futurs utilisateurs** du résultat du projet afin de trouver **comment satisfaire** au mieux **leurs attentes** et leurs besoins. En organisant le projet au travers de **cycles courts**, ces méthodes impliquent un mode projet **itératif** (on modifie et adapte le résultat) et **incrémental** (on apporte des fonctionnalités nouvelles au fur et à mesure des livraisons). On produit **rapidement** le cœur du produit qui semble apporter **le plus de valeur**, on **apprend** comment **l'améliorer** en tenant compte des retours utilisateurs.

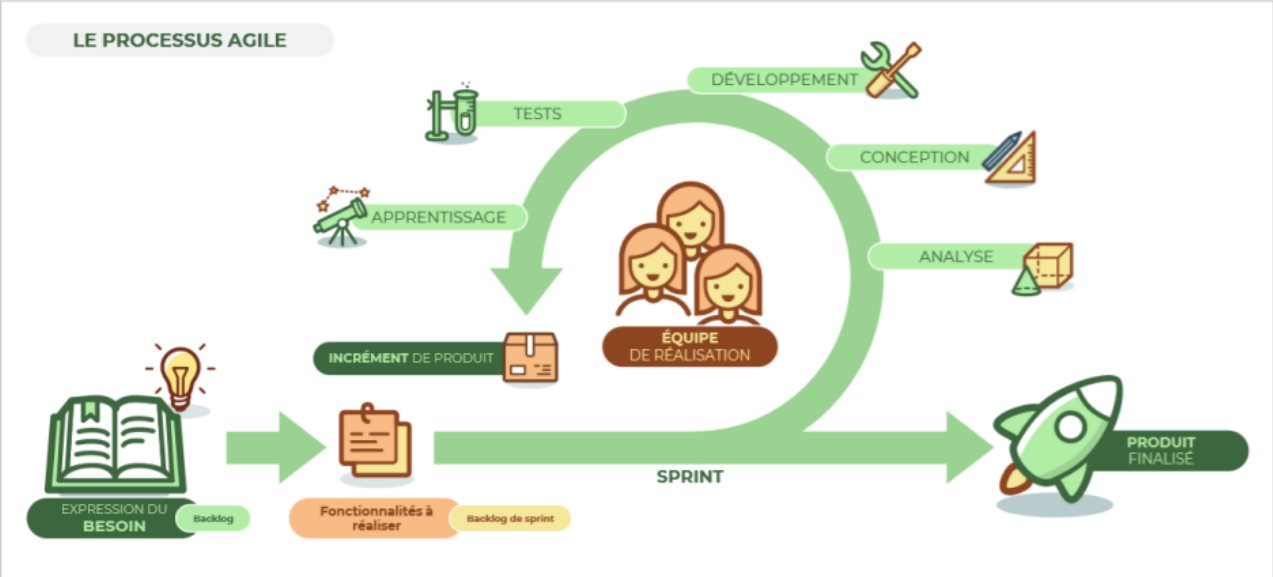

C'est le cœur de l'approche des **méthodes** et **cadres de travail** dits **agiles**.

Exemple

Parmi les **méthodes et cadres de travail** que l'on peut classer dans les a**pproches ascendantes,** vous pourrez rencontrer :


- L'**eXtrem Programming** (XP), conçue pour les **développements informatiques**, se base sur des **livraisons fréquentes** et la production d'un **code simple** facile à **maintenir**,
- **Crystal**, là encore **orientée développements** techniques, favorise le **travail collaboratif** en équipes restreintes et le **management visuel**,
- Le **Lean**, qui est presque une **philosophie** à lui seul et s'adapte à (presque) tous les domaines, en misant sur **l'élimination des tâches inutiles** et une logique **d'amélioration continue** basée sur **l'apprentissage** permanent. La méthode **implique fortement la gestion de projet** par une recherche de **performance** à tous les niveaux, de la conception à la livraison et passant par la prise de décision,
- **Scrum**, la « *star* » des **cadres de travail** agiles. Il s'applique à **tout type de projet** et est particulièrement adapté au **pilotage de projets digitaux**. Il implique des **rôles** et des **rendez-vous** sensiblement différents des approches traditionnelles (*Product Owner, Scrum master*, mêlée quotidienne, etc.).
- Etc.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

D. Contraintes de coût, de qualité et de délai

Quelle que soit la méthode employée, un projet sera toujours déterminé par un **but à atteindre**. Pour piloter cette **trajectoire** vers l'objectif, le chef de projet sera attentif à **trois objectifs opérationnels** fondamentaux : la **qualité**, les **coûts** et les **délais**. Le projet devra permettre de **réaliser ce qui est convenu** (c'est la qualité), pour le **coût établi** et dans le **respect des délais** définis.

Ces trois objectifs sont souvent représentés sous forme du **triangle CQD** :

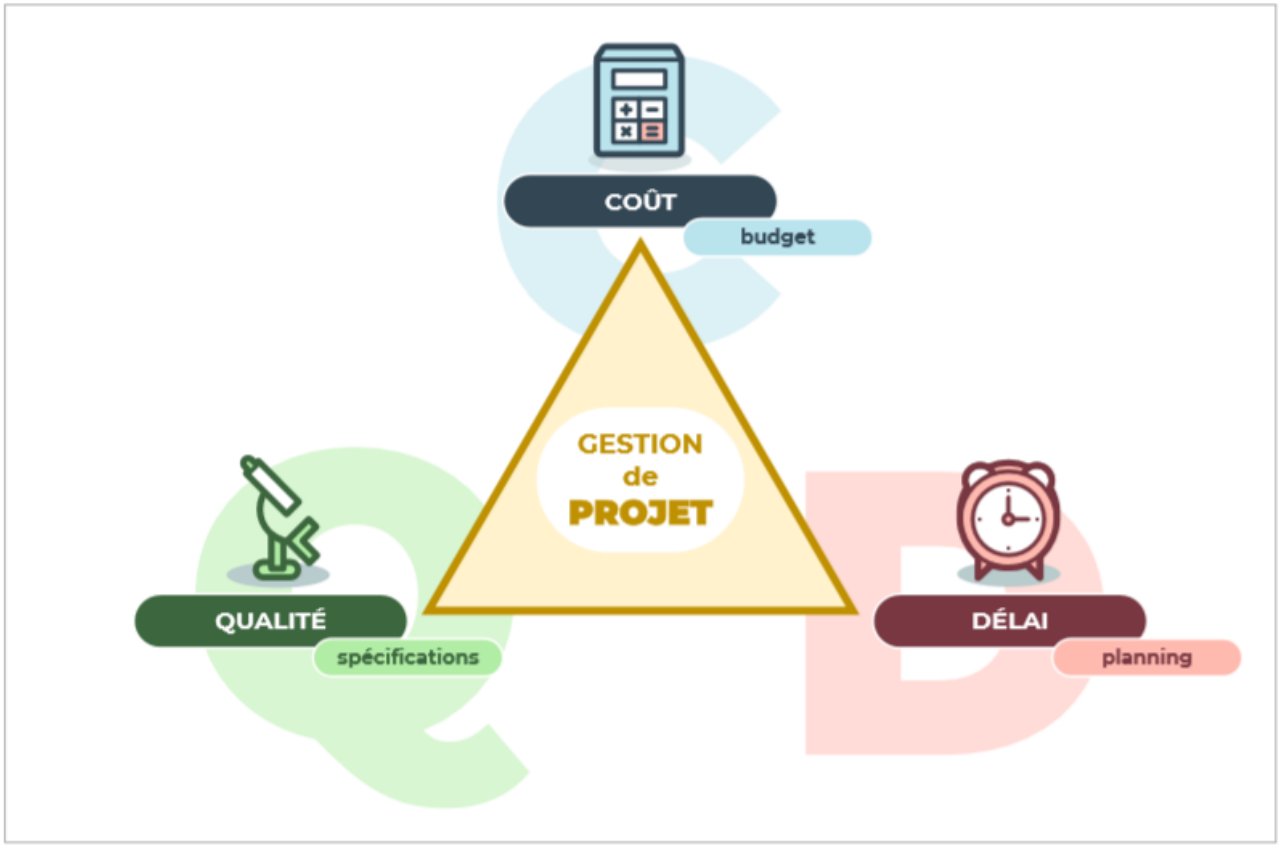

Bien entendu, un projet est toujours soumis à de **multiples contraintes,** et les **nombreuses variables** auxquelles il est soumis en font un **système complexe** à l'**équilibre précaire**. Le chef de projet s'attachera à **maintenir** ce système. Chaque **changement**, n'importe quel **imprévu**, un risque identifié qui devient un problème peuvent à tout moment **déséquilibrer** le projet.

La **définition d'indicateurs clairs** et leur **suivi** tout au long du projet aideront le chef de projet à **détecter** et **corriger** les déséquilibres éventuels.

E. MOA, MOE et la place du chef de projet

1. Maîtrise d'ouvrage

La Maîtrise d'Ouvrage (MOA) est l'entité **pour laquelle** le projet sera réalisé. En toute logique, c'est elle qui a la responsabilité de la **définition du besoin**, généralement au travers d'un **cahier des charges.** C'est la MOA qui **définit les objectifs stratégiques** du projet, c'est-à-dire les objectifs que devra atteindre le résultat du projet qu'on appelle aussi « ***ouvrage*** ». Et puisqu'elle définit **pourquoi** le projet sera mené, c'est elle aussi qui détermine les **contraintes** de **délai** et le **budget** qui sera octroyé à son déroulement. Même quand elle ne construit pas le budget, elle le **valide**. Elle reste donc **décisionnaire** sur ce point.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

2. Maîtrise d'œuvre

La Maîtrise d'Œuvre (MOE) est, elle, chargée de la **réalisation** du projet à proprement parler. Ses **objectifs** sont **opérationnels** : réaliser ce qui est prévu, dans les limites des **délais** et des **coûts** convenus. Mais c'est la MOE qui **détient l'expertise** du « *faire* », c'est pourquoi elle pourra choisir, ou pour le moins recommander, les **techniques** à employer. Elle est impliquée dans la **conception** du résultat du projet, peut produire les **spécifications détaillées**, et assurera la **coordination** des ressources chargées de la réalisation en tant que telle. C'est tout naturellement **du côté de la maîtrise d'œuvre que se positionne le chef de projet** dans son rôle traditionnel.

Exemple

La jeune société **DécoMagik** produit des feutres et marqueurs non toxiques et lavables ainsi que de nombreux objets pouvant être décorés avec ces marqueurs. Elle doit **conquérir sa clientèle** et pour cela **se faire connaître**. Les produits qu'elle fabrique sont destinés aux **enfants** et aux **amateurs de loisirs créatifs**. Elle vient de lancer son activité et **pour appuyer son dispositif de communication** a besoin de **réaliser son premier site Web**. DécoMagik, c'est le **Maître d'Œvrage (MOA).**

Pierre, un ami du fondateur, a déjà réalisé plusieurs sites Web ; il a **apporté son expertise** à DécoMagik dans la **formalisation de son cahier des charges** et dans la **pré-sélection** de plusieurs agences susceptibles de **réaliser le site Web** et de **définir une stratégie de communication** sur les réseaux sociaux. Il a **organisé la consultation** pour choisir l'agence qui correspondra le mieux aux **attentes** et au **budget** de DécoMagik. Pierre a effectué une mission d'**Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMOA).**

WonderfulWeb est **l'agence digitale** qui a été sélectionnée pour réaliser ce projet. L'agence a produit une **recommandation** pour démontrer ses compétences, témoigner de son **expertise** et proposer une **organisation** pour le déroulement du projet. C'est **Émilie**, **cheffe de projet**, qui en pilotera la réalisation, par les ressources et prestataires de l'agence. L'agence digitale incarne la **Maîtrise d'Œuvre (MOE).**

Cette **répartition des rôles** entre MOA et MOE est **fréquente dans une organisation projet**. En particulier dans le cadre d'une relation **commanditaire** (MOA) – **prestataire** (MOE). Mais elle est parfois **poreuse**. Le chef de projet peut être présent côté MOA comme côté MOE et quelques fois même passer « *d'un bord à l'autre* ».

Un chef de projet côté client passera une grande partie de son temps à la **formalisation du besoin,** aux **échanges** avec la maîtrise d'œuvre et à la **réception des livrables** projet. À l'inverse, un chef de projet côté MOE consacrera ses efforts au **suivi de la réalisation**, à la **coordination** des ressources productives et au suivi des objectifs CQD. Mais aussi, parfois, il pourra aider le commanditaire à **préciser son besoin et ses contraintes** ou tout simplement à coordonner le projet avec de multiples prestataires ; il interviendra alors dans le cadre d'une mission d'**Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMOA).**

Exercice : Quiz

[solution n°1 p.23]

Question 1

Parmi les propositions suivantes décrivant un **projet**, identifiez celle qui est **fausse** :

- ○ Un projet est souvent une entreprise collective qui mobilise de multiples compétences.
- ○ Un projet à un début et une fin, il est toujours temporaire.
- ○ Le résultat du projet est unique.
- ○ Un projet se déroule nécessairement dans le cadre d'une relation commanditaire – prestataire.

Question 2

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Si vous **commencez** votre projet par **décrire en détail votre future réalisation** afin de pouvoir effectuer des estimations précises, quelle **méthode projet** appliquez-vous ?

- ○ Une méthode ascendante
- ○ Une méthode descendante

Question 3

Quelles sont les caractéristiques du **modèle en cascade** ? (Plusieurs réponses possibles)

- ☐ Une succession linéaire d'activités
- ☐ Les livrables de chaque phase doivent être validés avant de commencer la phase suivante
- ☐ Les validations les plus tardives correspondent aux livrables de définition définis le plus tôt dans le cycle projet

Question 4

Quelles sont les **caractéristiques** d'une **approche agile** ? (Plusieurs réponses possibles)

- ☐ Elle mobilise fortement les futurs utilisateurs.
- ☐ Elle est itérative et incrémentale.
- ☐ Les validations permettent de sécuriser les délais en évitant les retours en arrière.
- ☐ Le projet s'organise au travers de cycles courts.

Question 5

Julien est chef de projet. Il est chargé de **suivre la réalisation** et de **coordonner** les ressources de son agence afin de parvenir à la réalisation d'une application mobile. Il échange régulièrement avec son client et lui présente chaque semaine un **point d'avancement** du projet. **Quel est son rôle** dans l'organisation globale de ce projet ? (Une seule réponse juste)

- ○ Julien incarne la maîtrise d'œuvre.
- ○ Julien réalise une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage.
- ○ Julien se situe du côté de la maîtrise d'ouvrage.

III. Chef d'orchestre du projet

A. Techniques du chef de projet

Au quotidien, le chef de projet doit savoir **planifier**, **organiser**, **suivre** et **contrôler** tous les aspects du projet de façon à **atteindre ses objectifs opérationnels**. De nombreux savoir-faire devront être mobilisés pour y parvenir : **planification, chiffrage,** gestion des **risques**, **brief** et **pilotage** des ressources, **capitalisation**, etc.

Bien entendu, ces savoir-faire seront toujours **liés au contexte** dans lequel le chef de projet exercera son métier. Il suffit de regarder **les annonces d'emploi** pour se convaincre qu'il n'y a **pas de définition universelle** du métier de chef de projet.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple

Voici quelques exemples d'annonces publiées en ligne correspondant au **métier de chef de projet** :

Description du poste

En tant que chef de projet **AMOA/MOE**, vous interviendrez sur **différentes missions** chez des clients lyonnais et aurez notamment en charge :

- **Rédaction des spécifications fonctionnelles** et participations aux spécifications techniques dans un environnement Web (JAVA),
- **Benchmark** de solutions,
- **Étude d'opportunités**,
- **Pilotage de projet** et répartition des tâches au sein des équipes,
- **Recettes** et homologations fonctionnelles,
- **Accompagnement du changement,**
- **Formation** des utilisateurs,
- Vous serez amené(e) à travailler dans un contexte client tourné **MOE**.

Qualifications

De formation BAC+5, vous avez une expérience minimum de 2 ans en AMOA/MOE idéalement complétée par une **certification** méthodologique dans ces métiers (Itil, Cobit, PMI, CHAMPS, ISTQB, Product owner, SCRUM, etc.). Doté(e) de fortes capacités rédactionnelles et d'un réel sens du contact, vous êtes autonome et avez le sens du service.

Monster.fr, Chef de projet AMOA / MOE (H/F) – Sodifrance

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes 69002 – Publié le 20/12/2019

Le pôle MEDIA rattaché au service MARQUE EMPLOYEUR & RECRUTEMENT recherche un Chef de Projet Marketing Digital (H/F).

Concrètement, **rattaché(e) à une Consultante Marketing Digital Senior** experte en programmatique, vos missions seront les suivantes :

OPÉRATIONNEL

- **Superviser la mise en ligne** des campagnes programmatiques en relation avec les annonceurs, les équipes en interne et les partenaires médias :
- Mise en place du **rétroplanning** des campagnes,
- Aide à la construction du **tableau des specs** à destination du studio,
- Centralisation des **créas** validées,
- Set up des créas dans l'adserver avant livraison des éléments aux partenaires médias,
- Réception et envoi des plans de taggage + aide à l'implémentation des pixels,
- **Tâches administratives** (OI/ facturation / référencement nouveaux partenaires, etc.),
- **Aide à la production d'outils** (méthodo/fiche de brief type/présentation des partenaires/glossaire, etc.) à destination des directeurs de clientèle et chefs de projet,
- **Veille** marché.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

BILAN & REPORTING

- **Analyser les données** et être **force de proposition** au quotidien sur les optimisations des campagnes auprès des partenaires médias,
- Concevoir des **rapports réguliers** à destination des clients ainsi que des **bilans de campagne** et des **recommandations**,
- Établir des **use cases** à partir de ces bilans.

ACCOMPAGNEMENT & RELATION

- Être force de proposition pour les prochaines activations média,
- **Réception** et **traduction** des **briefs clients** puis envoi aux partenaires médias,
- **Gérer la relation clients** et **partenaires** au quotidien.

CONSEIL

- **Rôle de conseil** en pré-campagne afin de définir le dispositif approprié,
- **Production de recommandations** adaptées pour **répondre aux AO** (= Appels d'offre),
- Conseiller sur les **KPI** et atteinte des résultats.

Vous avez une **bonne connaissance du marché** programmatique et de son wording (DSP, SSP, adserver, Bid request, attribution, CTR, VTR, CPV, CAC etc.).

Excellent relationnel (le métier requiert une casquette commerciale), **rigoureux**(se), **organisé**(e), **réactif**(ve).

Esprit d'analyse requis pour les recommandations et troubleshooting, vous aimez le **travail en équipe**, faire des **analyses des données chiffrées** et rédiger.

Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e) et vous menez vos projets avec implication. Votre dynamisme, votre curiosité d'esprit, ainsi que votre profond sens de l'organisation seront de forts atouts.

Monster.fr, Chef de Projet Marketing Digital (H/F) – EPOKA

PARIS, Île-de-France 75001– Publié le 19/12/2019


Vous le voyez, **selon les structures**, le **périmètre d'action** du chef de projet est **très variable.**

Le chef de projet intervient à **toutes les étapes** du projet, depuis l'initialisation jusqu'à la livraison finale.

1. Préparer les documents supports du projet

Côté MOA, il devra **construire l'expression de besoin**, rédiger le **cahier des charges** initial. En tant que **MOE**, il sera aussi **responsable** de la réalisation de l'ensemble des **documents supports du projet**, du plus fondamental comme les **spécifications fonctionnelles** aux plus triviaux comme les **comptes-rendus** de réunions. Au-delà, il devra également produire ou superviser la réalisation des **documents structurants** tels que le **planning** permettant d'ancrer le projet dans une réalité temporelle ou le **budget détaillé** pour matérialiser l'effort attendu.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

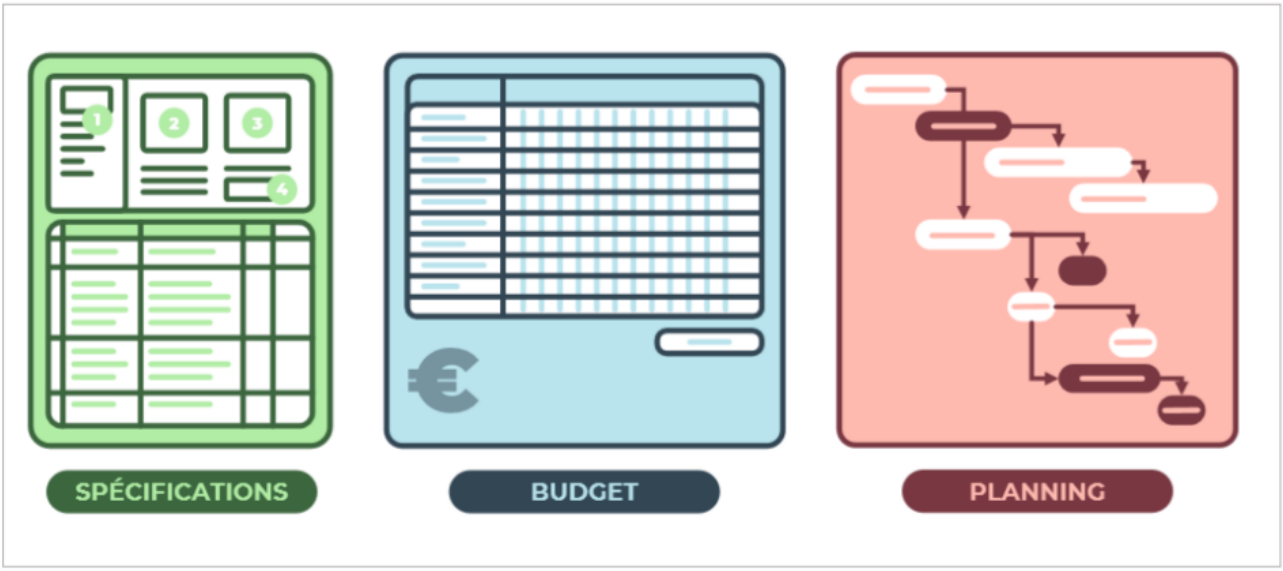

2. Piloter l'activité des ressources du projet

Parmi les **missions** du chef de projet, le **pilotage des ressources** est capital. Sans parler de la nécessaire **coordination** entre l'ensemble des exécutants pour **parvenir au résultat attendu**, la **gestion des ressources** peut aussi constituer **le seul moyen de maîtrise des coûts** pour le chef de projet. Sans vision directe sur les marges et encore moins sur les salaires (le chef de projet est rarement le manager direct des ressources mobilisées pour le projet), **l'axe financier** du projet sera souvent limité à une **utilisation judicieuse des profils** mis à disposition.

Ces ressources ne sont pas simplement des personnes mobilisées pour exécuter les tâches prévues, tâches qu'elles doivent imaginer à la lecture d'un cahier des charges et d'un planning, etc. Il faudra leur **donner les informations clés** pour **expliquer** ce qu'elles ont à faire, **avec quelles contraintes** elles devront le réaliser, dans quel **but** et dans quel **contexte**. Ces éléments seront présents dans **les briefs** pour les ressources, **rédigés** par le chef de projet. Le **format écrit** sera privilégié pour que la ressource puisse se référer plus tard à ce qui est attendu, et pour **faciliter la vérification** du travail effectué. Le chef de projet devra pouvoir néanmoins, à tout moment, **apporter les précisions** nécessaires à la bonne exécution des tâches. Il sera un **guide**, mais aussi un **appui** pour ces ressources.

Enfin, la **planification** des tâches **au quotidien**, agencée pour que chacun **dispose des éléments nécessaires** à son travail, la **bonne répartition des charges**, une **distribution** intelligente **des tâches** entre les profils et le souci constant de **qualité** seront au cœur des préoccupations du chef de projet. Pour que la grande machine du projet fonctionne bien, le chef de projet veillera à ce qu'il ne manque pas d'huile dans ses rouages.

3. Maîtrise nécessaire d'outils de pilotage

Du début à la fin du projet, le chef de projet devra en piloter la **performance**, c'est-à-dire veiller à ce que les efforts mobilisés pour parvenir au résultat attendu soient les plus **efficients** possible. Cela passera par de nombreuses **réunions de pilotage**. Elles ont un **double objectif** : le premier, **valider les productions intermédiaires** et le bon déroulement des étapes successives du projet. Le second, **identifier les difficultés** rencontrées par les membres de l'équipe projet et en **accompagner la résolution.**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple

Les réunions de ce type ne sont pas nécessairement très longues. On peut les organiser quotidiennement ou chaque semaine, en format « ***Stand-up meeting*** » (pour « *réunion debout* ») pour stimuler le format court et la participation. On peut les orienter autour de quelques **questions-clés** :

- **Où en êtes-vous** sur les tâches prévues ? Qu'avez-vous fait jusqu'à maintenant ? Qu'avez-vous prévu aujourd'hui ?
- **Rencontrez-vous des difficultés** dans les tâches en cours ?
- Si oui, comment pensez-vous qu'on peut les résoudre ? / **Comment vous aider à les résoudre** ?

Chaque membre de l'équipe s'exprime à tour de rôle, on ne coupe pas la parole, mais chacun est invité à proposer d'éventuelles solutions. Idéalement, ses réunions seront planifiées et intégrées dans les processus internes. Le format « *debout* » évite que les réunions s'éternisent. C'est un bon outil pour rester informé de **l'avancement** du projet.

Mais piloter le projet, ce n'est **pas uniquement coordonner des ressources**. Le chef de projet devra également définir des **indicateurs de pilotage** pour appréhender tous les sommets du triangle CQD. Les **ressources consommées, l'avancement** des tâches planifiées, le suivi du **planning** (mis à jour), le nombre d'**aller-retours**, le taux d'**anomalies** et leur traitement, etc. sont autant d'**indicateurs** qui peuvent être utiles au **bon pilotage** du projet. Ils peuvent être rassemblés dans un **tableau de bord projet** pour obtenir (et transmettre) une vision claire de la situation projet.

Des outils de suivi, comme les **statuts projet** peuvent également faciliter le pilotage.

Exemple **Statut projet**

Statut	Next steps prestataire	Next steps client	Etat	Prochaine échéance
➢ Storyboard validé le 01/03. ➢ Créations de la section « commentaires » envoyées le 04/03. Retours reçus le 07/03.	➢ Nouvelle livraison créations « commentaires » pour le 14/03. ➢ Présentation des bannières interactives lors de la réunion du 10/03.	➢Retours sur cahier des contenus livré le 04/03. ➢ Enregistrement légal du règlement du concours.	Création	➢ 14/03 : validation de l'ensemble des créations. ➢ 15/03 : Début des développements .

Le **statut projet** donne une **visibilité immédiate** de l'état du projet à un moment donné. Il présente le **statut actuel**, les **prochaines étapes** et les **échéances à venir.**

Pour les **projets complexes**, on peut rédiger un statut pour chaque sous-projet (on parle aussi parfois de « ***lot*** » ou de « ***chantier*** ») et les rassembler dans un document unique qu'on appellera alors « ***Worklist*** ».

L'ensemble de ces outils, en complément du **budget**, du **planning** et du **plan de gestion des risques** aideront le chef de projet à bien piloter sa réalisation.

Complément **Gestion de projet et direction de projet**

La **direction de projet** est souvent **impliquée dans la définition des objectifs**. Elle dispose d'un **pouvoir de décision**, par exemple pour **l'attribution des ressources** ou dans la **modification des objectifs CQD** en cours de projet. Par ailleurs, elle pilote souvent un **portefeuille de projets,** avec une **vision stratégique** globale.

La **gestion de projet**, elle, vient **en appui** de la direction de projet, en **collectant les données** factuelles nécessaires à la prise de décision. Le chef de projet doit **établir des prévisions** sur le déroulement du projet (à court, moyen et long terme), mais également **capitaliser** sur les **données collectées** en cours de projet afin d'identifier les **modalités d'amélioration** du déroulement des **futurs projets.**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

B. Chef de projet, communicant multitâches

1. Savoir-être du chef de projet

Un chef de projet efficace n'est **pas uniquement un technicien.** Sa capacité à **gérer l'humain** est un élément essentiel de son profil. Honnête, **rigoureux**, analytique, **ouvert** et abordable, il doit avoir des compétences avérées en **animation d'équipe** et même parfois, selon son expérience, en coaching. Il doit être capable de **résoudre les conflits** qui peuvent apparaître et d'accompagner l'équipe en appliquant des techniques de **résolution de problème**.

Selon l'organisation à laquelle il appartiendra, le chef de projet **ne sera probablement pas le supérieur hiérarchique** des membres de son équipe. Il devra même parfois piloter des ressources ayant une position supérieure dans l'organigramme de l'entreprise. Ses capacités **relationnelles** comme celles à **s'assurer du soutien des décideurs** seront de **puissants atouts.**

Dans son rôle d'**interface entre tous les métiers** et responsabilités de l'organisation, la capacité du chef de projet à susciter et maintenir la **motivation** de son équipe est importante. Difficile lorsqu'on n'est pas manager de ses équipiers. Mais il sera toujours possible de **reconnaître le travail effectué** : un bon chef de projet **valorisera les membres de son équipe**, les mettra sur le devant de la scène. Il ne **dissimulera pas les efforts** des ressources derrière un paravent d'indicateurs de pilotage. À l'inverse, il devra **recadrer avec impartialité** les comportements inappropriés et **refuser** sans état d'âme **les livraisons non conformes** aux attendus. Le fait de partager le **contexte** et les **objectifs** du projet avec l'équipe contribuera aussi à **donner du sens** aux tâches à réaliser, et donc à entretenir la motivation. On notera enfin que si la motivation de l'équipe est **souhaitable**, elle n'est pas indispensable à la réussite du projet.

Pour mettre en œuvre l'ensemble de ces compétences, un outil est incontournable pour la réussite du projet : la **communication.**

2. Communication ascendante, descendante et horizontale

Pour le pilote du projet, la **communication** est un outil **essentiel à l'atteinte des objectifs**. La pluralité des métiers, des expertises et des personnalités mobilisées rend **indispensable** la **circulation de l'information**. Mais cette circulation ne saurait être à sens unique.

3. Communication ascendante

La **communication ascendante,** c'est **relever les indicateurs** du projet, construire les fameux ***reportings*** de façon à pouvoir **transmettre aux décideurs** l'état du projet et son avancement. Ce mode de communication fournira ainsi les éléments de base pour les **arbitrages**, toujours nécessaires en cours de projet. Elle permettra également de faire **remonter les problèmes** pour **déclencher les décisions** indispensables à la mise en œuvre de solutions efficaces. Elle accompagne aussi les différentes **livraisons** à destination du commanditaire.

Exemple

Lors d'une réunion du **comité de pilotage**, Clémentine, **cheffe de projet,** présente **l'état de la réalisation**, des **ressources consommées** à date ainsi que les **projections** pour la suite du projet à l'aide d'un **planning mis à jour**. C'est de la **communication ascendante.**

4. Communication descendante

La **communication descendante,** elle, permet de **transmettre aux équipes opérationnelles** les **arbitrages** validés par les décisionnaires. Elle concerne également la propagation des **directives** du commanditaire, ses **retours** (formels et informels) sur les livrables produits ainsi que ses **validations**. Plus globalement, elle s'applique aussi lorsque des **procédures propres à l'organisation** sont transmises aux équipes.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple

Lorsqu'Antoine, **chef de projet**, indique à l'équipe de réalisation qu'une partie de l'application ne sera **finalement pas réalisée** afin de **respecter des impératifs de délai** ou lorsqu'il **rédige un brief** pour une ressource programmée, il pratique la **communication descendante**. Ce sera également le cas lorsque le chef de projet diffusera un **compte-rendu de réunion** à l'ensemble de l'équipe projet.

5. Communication horizontale

La **communication horizontale** s'applique à tous les **échanges entre** « ***égaux*** » au sein de l'équipe projet. Elle est utilisée lorsqu'on **partage des informations relatives aux tâches en cours** afin qu'une autre ressource puisse effectuer son travail. Elle est impliquée dans les **passages de relais** lors de tâches dépendantes les unes des autres, ou lors de vérifications du travail accompli avant livraison au commanditaire. On l'emploie aussi lors des **phases collaboratives**, comme lors de séances d'idéation par exemple.

Exemple

Ilona, **cheffe de projet**, doit **organiser un atelier de génération d'idée** pour un nouveau concept d'application mobile. Pour cela, elle doit **préparer la séance** avec le lead UX de l'organisation. Plus tard, son directeur artistique vient lui **présenter le travail réalisé** pour un autre projet. Elle lui fera **quelques retours à prendre en compte** pour que les créations correspondent au brief initialement communiqué. Toutes ces situations illustrent des modes de **communication horizontaux.**

Le chef de projet **organise et est impliqué** dans **tous les événements** projet que nous venons d'aborder. **Responsable de la bonne circulation de l'information**, il doit savoir manier tous ces modes de communication.


6. Influence du chef de projet

Selon le contexte et l'organisation, **l'influence du chef de projet** sur son bon déroulement et sur le reste de l'équipe sera variable. Le PMI identifie plusieurs modes d'organisation interne : l'organisation **fonctionnelle, matricielle et par projet.**

7. Organisation fonctionnelle

Dans une **organisation fonctionnelle**, la **coordination du projet** est prise en charge par les **responsables de pôles**, qui **prendront les décisions** relatives à leur champ de compétences. Le chef de projet est **une ressource parmi d'autres** et sa **capacité d'action** est **limitée**. Son **autonomie** est **faible.** Les **relations transversales** seront **limitées**, la **circulation** de l'information **ralentie**, du fait de la **présence forte de la hiérarchie** dans les activités. On parle aussi d'organisation « ***en silos*** », peu applicable pour des projets digitaux où la **réactivité** et la **collaboration** entre les métiers sont essentielles.


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

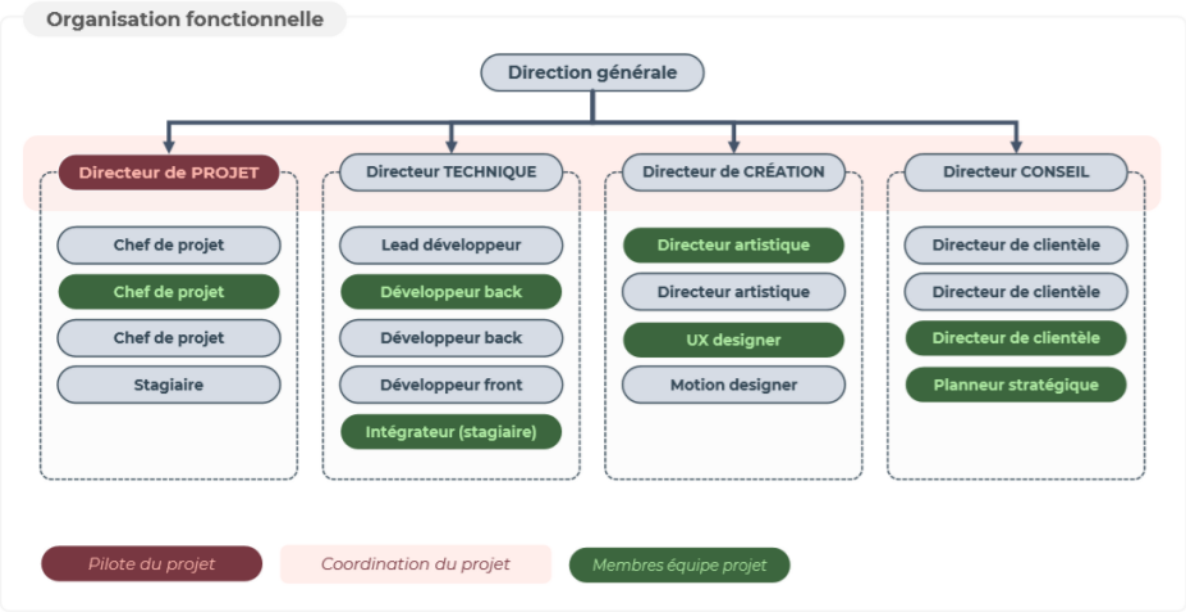

8. Organisation matricielle

Une **organisation matricielle,** c'est en quelque sorte une organisation **hybride.** La **structure hiérarchique** est toujours en place, mais la **coordination** du projet est effectuée **transversalement** par les **opérationnels,** sous le **pilotage d'un chef de projet**. Il gagne ainsi en **autonomie**, puisqu'il n'est **plus nécessaire de mobiliser la hiérarchie** pour les décisions **opérationnelles**. C'est une **organisation classique**, mais qui peut parfois s'avérer **compliquée à gérer pour les ressources** qui risquent se retrouver prises entre les feux croisés des **impératifs du projet** dans lequel elles sont impliquées et les **contraintes émanant de leur responsable hiérarchique.** Le **relationnel** du chef de projet et sa capacité à **créer des alliances** pertinentes avec **les responsables de pôles**, sa capacité à **faire collaborer des ressources** de services différents, peuvent **conditionner le succès ou l'échec** du projet.


Néanmoins, les membres de l'équipe projet ont dans ce cadre une **vision plus globale du projet** ce qui améliore leur **efficacité**.

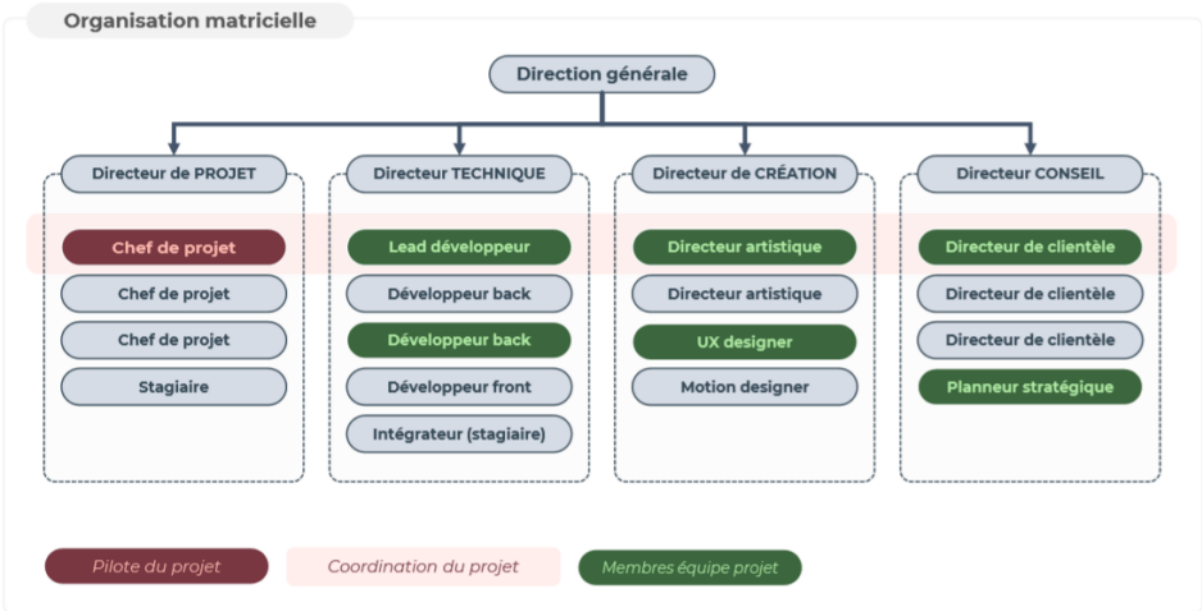

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

9. Organisation par projet

Dans une **organisation par projet,** l'organisation se structure **autour des projets** eux-mêmes. Les **équipes** sont **constituées pour le projet,** ce qui assure une **implication totale** de chaque membre dans la réussite du projet et **élimine les contraintes de priorisation**. La **coordination** se fait au niveau du projet et est **orientée résultat**. Le **suivi des performances** de l'équipe projet est facilité. Dans le cadre d'une relation commanditaire – prestataire, les interactions sont simplifiées et l'organisation plus **lisible** pour un client externe. **L'influence du chef de projet** sur son équipe est **maximale**, ce qui va de pair avec sa **responsabilité** dans la réussite du projet.

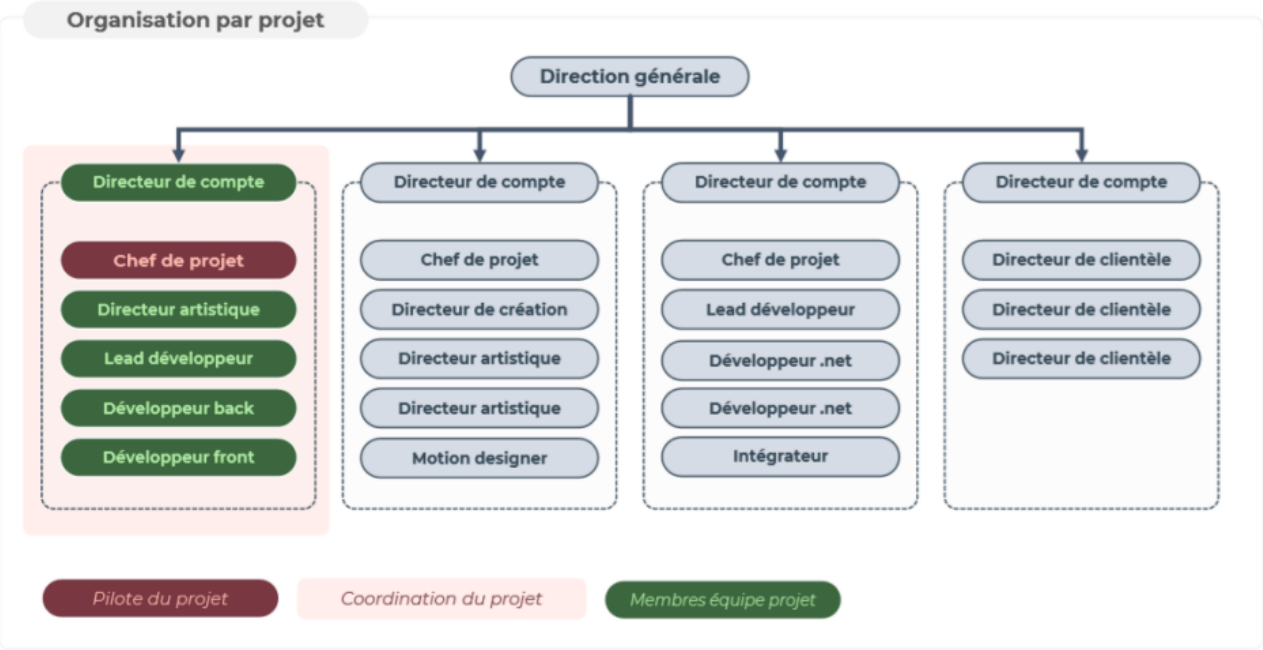

Le **rôle du chef de projet** sera donc **très dépendant de l'organisation** mise en place. Son **périmètre d'action**, son **autorité** sur les équipes, sa **responsabilité** globale vis-à-vis de la réussite du projet sont intimement **liés au cadre** dans lequel il exerce ses fonctions.

Le rôle du chef de projet selon le type d'organisation

	Organisation **fonctionnelle**	Organisation **matricielle**	Organisation **par projet**
AUTORITÉ du chef de projet	FAIBLE	**MODÉRÉE**	**ÉLEVÉE**
MAÎTRISE de la DISPONIBILITÉ des ressources	NON MAITRISÉE	**PARTIELLE**	**TOTALE**
RESPONSABILITÉ vis-à-vis du projet	**PARTIELLE**	**PARTIELLE**	**TOTALE**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

C. Quelques mots de conclusion

Gérer un projet, ce n'est **pas toujours une tâche facile.**

Chef de projet, c'est néanmoins un **métier extrêmement riche et passionnant**, parfois complexe, qui vous permettra d'acquérir une **vue globale** sur vos projets, de **développer rapidement** votre **expertise** et de pouvoir **évoluer** vers (presque) tous les métiers du digital selon vos facilités et vos centres d'intérêt.

Alors, prêts à piloter vos propres projets ?

Exercice : Quiz

[solution n°2 p.24]

Question 1

À quel moment le chef de projet est-il **impliqué** dans un projet ? (Une seule réponse juste)

- ○ Le chef de projet est avant tout impliqué dans les premières phases du projet. Son rôle est capital dans la définition du besoin et dans l'organisation générale.
- ○ Le chef de projet est impliqué dans toutes les étapes du projet, depuis l'initialisation jusqu'à la livraison finale.
- ○ Le chef de projet est impliqué en début de projet quand il s'agit de définir les livrables et au moment de la recette finale. Il est peu mobilisé dans les phases intermédiaires.

Question 2

Comment le chef de projet peut-il surveiller le **respect de son objectif de coût** ? (Plusieurs réponses possibles)

- ☐ En négociant les salaires des membres de l'équipe projet.
- ☐ En suivant les sommes dépensées pour mener à bien le projet.
- ☐ En surveillant les temps passés par l'ensemble des ressources du projet.

Question 3

Quels éléments le chef de projet doit-il fournir dans un **brief** pour une ressource ? (Une seule réponse juste)

- ○ Uniquement la description de la tâche à accomplir, afin de ne pas perturber la ressource par des informations peu utiles qui ne la concernent pas directement.
- ○ La description de ce qu'il y a à réaliser, les contraintes associées, sans oublier l'objectif général à atteindre et le contexte du projet.
- ○ Le brief étant fait à l'oral uniquement, pour une meilleure proximité entre le chef de projet et son équipe, il n'y a pas d'élément types à communiquer.

Question 4

Parmi les propositions ci-dessous, identifiez celles qui sont **exactes** ? (Plusieurs réponses possibles)

- ☐ La direction de projet doit capitaliser sur les données collectées et identifier des modalités d'amélioration pour les futurs projets.
- ☐ La direction de projet dispose d'un pouvoir de décision et peut modifier les objectifs CQD.
- ☐ La gestion de projet collecte les données du projet et établit des prévisions pour la suite de son déroulement.
- ☐ La gestion de projet est impliquée dans la définition des objectifs et effectue les arbitrages pour l'attribution des ressources.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 5

Dans votre agence digitale, la **coordination** du projet est effectuée au **niveau des responsables de pôles**. Chaque directeur dirige les membres de sa propre équipe et le **pilotage du projet** est effectué par le **directeur de projet**. Dans quel **type d'organisation** êtes-vous ?

- Organisation fonctionnelle
- Organisation matricielle
- Organisation par projet

V. Essentiel

Le projet est un **effort unique**, nécessitant des **ressources** (humaines et matérielles), pour parvenir à une **réalisation** dans des **délais fixés** et pour un **coût convenu**. Il s'organise au **sein même** d'une organisation ou dans le cadre d'une **relation commanditaire – prestataire**.

Les **méthodes projet** peuvent être regroupées en **méthodes descendantes** (les plus **classiques**), qui **décrivent le résultat** du projet **en amont** et l'organisent **en séquences successives** avec des **validations** intermédiaires, ou **ascendantes** (les approches **agiles**) qui mettent l'accent sur la description du besoin et des cycles courts. Dans tous les cas, le chef de projet devra le **piloter** au travers des **trois objectifs** de **coût, qualité** et **délais**. On parle, en gestion de projet, du **triangle** « ***CQD*** ».

Bien que son **rôle** soit **variable** selon la structure dans laquelle il se trouve, le chef de projet doit **maîtriser des techniques** qui lui permettront de **planifier**, **organiser, suivre** et **contrôler** les activités du projet. Il devra aussi tenir compte de la **gestion des risques** et savoir **capitaliser** sur l'expérience afin d'**améliorer le déroulement** des **futurs** projets.

Il aura notamment la charge de la **réalisation des documents supports** du projet, comme les **spécifications,** le **planning** et le **budget**. En tant que **chef d'orchestre,** il devra **produire les briefs** pour les ressources et **réceptionner** les travaux réalisés. Des **outils de pilotage** lui permettront de **suivre l'activité** des ressources.

En tant que **communicant**, il devra aussi savoir **gérer les communications ascendantes** (c'est-à-dire essentiellement le **reporting**), **descendantes** (la transmission de **directives, retours** ou **validations**) comme **horizontales** (au sein de l'équipe projet). **Rigoureux, honnête, moteur**, il veillera à **l'implication** de l'équipe et saura si nécessaire **gérer les conflits** qui pourraient surgir.

L'autorité du chef de projet, sa **maîtrise** sur la **disponibilité des ressources** ainsi que sa **responsabilité** vis-à-vis du projet seront **variables selon le type d'organisation** au sein de laquelle il exercera ses fonctions.

VI. Auto-évaluation

A. Exercice

Place du chef de projet

Vous venez d'intégrer une nouvelle structure **en tant que chef de projet.** Un **nouveau projet** vous est confié, charge à vous de le **piloter.**

Votre organisation se structure en **trois pôles** directement rattachés à la **direction générale**. Vous rendez des comptes à votre directeur de clientèle qui pilote le pôle stratégique et commercial. Vous serez **secondé** dans vos travaux par un **assistant chef de projet** (un stagiaire). **Votre directeur de clientèle** gère aussi un responsable clientèle junior (qui n'est pas impliqué dans votre projet) et un **planneur stratégique**.

La création sera **pilotée par le studio créatif,** dirigé par le **directeur de création**. Il a **spécialement désigné** un des deux directeurs artistiques du pôle pour **superviser le projet**. Il sera épaulé pour la conception fonctionnelle par un **UX designer**. Le graphiste du studio, lui, ne sera pas mobilisé pour ce projet qui nécessite peu de travail de déclinaison.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Le **pôle développements** est, lui dirigé par un **directeur technique**. Ce pôle est composé de 3 **développeurs back**, d'un **développeur front** et d'un **intégrateur HTML/CSS** stagiaire. Le développeur back le plus expérimenté endosse les fonctions de **lead développeur**. C'est lui qui prendra en charge les aspects techniques du projet et en **assurera la coordination** avec vous et le directeur artistique. Pour ce projet, vous aurez besoin de seulement deux développeurs back et de l'intégrateur.

Question

[solution n°3 p.25]

Précisez le type d'organisation dans laquelle vous vous trouvez et représentez-la sous forme d'un organigramme.

B. Test

Exercice 1

[solution n°4 p.26]

Formes de communication utilisées par le chef de projet

Au cours d'un projet, le chef de projet sera amené à **utiliser des modes de communication différents**. Selon le **moment** du projet, les **objectifs** visés, il devra employer des modes de communication **ascendants, descendants** ou **horizontaux**.

Associez les activités proposées au bon mode de communication :

Retours du chef de projet à une ressource sur un livrable, avant présentation client

Transmission du compte-rendu d'un comité de pilotage

Transmission d'une conception fonctionnelle par l'UX designer au Directeur artistique

Communication d'une modification de périmètre du projet décidée par le client

Présentation d'un brief à une ressource

Livraison d'une réalisation au commanditaire.

Animation d'un brainstorming

Proposition de solutions à la direction pour réaligner les objectifs CQD,

Présentation du reporting lors d'un comité de pilotage

Communication ascendante	Communication descendante	Communication horizontale

Exercice 2 : Quiz

[solution n°5 p.27]

Question 1

Qu'est-ce qui distingue le **mode projet** du **mode processus** ? (Plusieurs réponses possibles)

- ☐ Le mode projet nécessite un investissement, contrairement au mode processus qui crée de la valeur en fonctionnant.
- ☐ Le mode projet permet d'aboutir à un grand nombre de réalisations similaires, alors que le mode processus permet de créer un produit unique.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- [ ] Le mode processus nécessite un investissement, contrairement au mode projet qui crée un flux de trésorerie positif pendant son déroulement.
- [ ] Le mode processus est répétitif et n'a pas de fin définie, contrairement à un projet qui vise la réalisation d'un résultat unique.

Question 2

Quelle affirmation ci-dessous exprime **le paradoxe de la gestion de projet** ?

- ○ Les possibilités de modification du projet augmentent avec le temps.
- ○ Une fois le projet terminé, on sait ce qu'on aurait dû faire.
- ○ Note connaissance du projet diminue avec le temps.

Question 3

C'est dans une **organisation de type matriciel** que le chef de projet **porte la plus grande responsabilité** vis-à-vis de la réussite du projet.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 4

Parmi les **livrables supports de la description** du projet, lequel permettra au chef de projet de **piloter l'axe qualité** du triangle CQD ? (Une seule réponse juste)

- ○ Le budget
- ○ Les spécifications
- ○ Le planning détaillé

Question 5

Parmi les propositions suivantes, lesquelles peuvent **constituer des indicateurs de pilotage ?** (Plusieurs réponses possibles)

- [ ] Le taux d'anomalies
- [ ] La construction du budget
- [ ] La consommation des ressources
- [ ] L'avancement des tâches
- [ ] La rédaction des briefs
- [ ] Le suivi du planning

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 9 **Solution n°1**

Question 1

Parmi les propositions suivantes décrivant un **projet**, identifiez celle qui est **fausse** :

- ○ Un projet est souvent une entreprise collective qui mobilise de multiples compétences.
- ○ Un projet à un début et une fin, il est toujours temporaire.
- ○ Le résultat du projet est unique.
- ◉ Un projet se déroule nécessairement dans le cadre d'une relation commanditaire – prestataire.

D'après le PMI (Project Management Institute), un projet est « une initiative temporaire entreprise dans le but de créer un [...] résultat unique. Comme il est temporaire, un projet aura toujours un début et une fin. Il nécessite souvent la mobilisation d'expertises différentes et par conséquent la constitution d'une équipe. En revanche, un projet peut être initié et mené entièrement au sein d'une même organisation ; il ne se déroule pas obligatoirement dans le cadre d'une relation commanditaire – prestataire.

Question 2

Si vous **commencez** votre projet par **décrire en détail votre future réalisation** afin de pouvoir effectuer des estimations précises, quelle **méthode projet** appliquez-vous ?

- ○ Une méthode ascendante
- ◉ Une méthode descendante

Plusieurs approches projet sont possibles, et notamment les approches ascendantes et descendantes. Les approches descendantes regroupent les méthodes traditionnelles. Elles consistent notamment à bien décrire la réalisation en début de projet afin de faciliter les estimations de charges. On y retrouvera la méthode en cascade ou son évolution, le cycle en V.

Question 3

Quelles sont les caractéristiques du **modèle en cascade** ? (Plusieurs réponses possibles)

- ☑ Une succession linéaire d'activités
- ☑ Les livrables de chaque phase doivent être validés avant de commencer la phase suivante
- ☐ Les validations les plus tardives correspondent aux livrables de définition définis le plus tôt dans le cycle projet

Le modèle en cascade impose un découpage du projet en phases successives. Pour chaque phase, les livrables produits permettent, après validation, de commencer la phase suivante. En conséquence, le projet est représenté sous la forme d'une succession linéaire d'activités. Des validations tardives des livrables de définition du projet correspondent à un cycle en V.

Question 4

Quelles sont les **caractéristiques** d'une **approche agile** ? (Plusieurs réponses possibles)

- ☑ Elle mobilise fortement les futurs utilisateurs.
- ☑ Elle est itérative et incrémentale.
- ☐ Les validations permettent de sécuriser les délais en évitant les retours en arrière.
- ☑ Le projet s'organise au travers de cycles courts.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Les approches agiles privilégient la définition du besoin à la description du résultat du projet. En cela, elles doivent mobiliser les futurs utilisateurs afin de viser la plus grande satisfaction dans l'utilisation du produit. Itératives et incrémentales, elles permettent de mieux adapter le résultat du projet aux attentes. Ces itérations sont organisées au travers de cycles courts permettant de modifier le résultat visé au fur et à mesure du déroulement du projet.

Question 5

Julien est chef de projet. Il est chargé de **suivre la réalisation** et de **coordonner** les ressources de son agence afin de parvenir à la réalisation d'une application mobile. Il échange régulièrement avec son client et lui présente chaque semaine un **point d'avancement** du projet. **Quel est son rôle** dans l'organisation globale de ce projet ? (Une seule réponse juste)

- ◉ Julien incarne la maîtrise d'œuvre.
- ○ Julien réalise une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage.
- ○ Julien se situe du côté de la maîtrise d'ouvrage.

La maîtrise d'œuvre prend en charge la réalisation du projet. Elle doit veiller à réaliser ce qui est prévu, dans les délais convenus et sans dépasser le coût envisagé. C'est la maîtrise d'œuvre qui détient l'expertise nécessaire à la réalisation. Julien est donc du côté de la maîtrise d'œuvre.

Exercice p. 19 Solution n°2

Question 1

À quel moment le chef de projet est-il **impliqué** dans un projet ? (Une seule réponse juste)

- ○ Le chef de projet est avant tout impliqué dans les premières phases du projet. Son rôle est capital dans la définition du besoin et dans l'organisation générale.
- ◉ Le chef de projet est impliqué dans toutes les étapes du projet, depuis l'initialisation jusqu'à la livraison finale.
- ○ Le chef de projet est impliqué en début de projet quand il s'agit de définir les livrables et au moment de la recette finale. Il est peu mobilisé dans les phases intermédiaires.

Le chef de projet, en tant que « *chef d'orchestre* », est impliqué de bout en bout dans le déroulement du projet. Il participe à sa définition, assure la coordination des ressources durant tout le déroulement du projet et en pilotera la recette. Il n'y a aucun moment du projet où le chef de projet n'est pas impliqué.

Question 2

Comment le chef de projet peut-il surveiller le **respect de son objectif de coût** ? (Plusieurs réponses possibles)

- ☐ En négociant les salaires des membres de l'équipe projet.
- ☑ En suivant les sommes dépensées pour mener à bien le projet.
- ☑ En surveillant les temps passés par l'ensemble des ressources du projet.

Les coûts d'un projet, ce sont l'ensemble des moyens engagés pour parvenir à sa réalisation. Dans la mesure où le chef de projet est rarement le manager direct des membres de l'équipe projet, les coûts du projet seront pilotés par le suivi de l'ensemble des sommes dépensées pour le mener à bien ou, sans visibilité sur les coûts réels de chaque ressource, par un suivi attentif des temps consommés des membres de l'équipe projet.

Question 3

Quels éléments le chef de projet doit-il fournir dans un **brief** pour une ressource ? (Une seule réponse juste)

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- ○ Uniquement la description de la tâche à accomplir, afin de ne pas perturber la ressource par des informations peu utiles qui ne la concernent pas directement.
- ◉ La description de ce qu'il y a à réaliser, les contraintes associées, sans oublier l'objectif général à atteindre et le contexte du projet.
- ○ Le brief étant fait à l'oral uniquement, pour une meilleure proximité entre le chef de projet et son équipe, il n'y a pas d'élément types à communiquer.

Dans un projet, le chef de projet veillera à rédiger les briefs pour l'ensemble des ressources mobilisées. Un brief doit comprendre des éléments de contexte, l'objectif du projet et les contraintes qu'il devra respecter. Cette vue d'ensemble est importante pour assurer une meilleure qualité de réalisation. Le format écrit sera privilégié afin que la ressource puisse s'y référer en cours de réalisation et pour aider à la vérification du travail effectué.

Question 4

Parmi les propositions ci-dessous, identifiez celles qui sont **exactes** ? (Plusieurs réponses possibles)

- ☐ La direction de projet doit capitaliser sur les données collectées et identifier des modalités d'amélioration pour les futurs projets.
- ☑ La direction de projet dispose d'un pouvoir de décision et peut modifier les objectifs CQD.
- ☑ La gestion de projet collecte les données du projet et établit des prévisions pour la suite de son déroulement.
- ☐ La gestion de projet est impliquée dans la définition des objectifs et effectue les arbitrages pour l'attribution des ressources.

La gestion de projet pilote le déroulement du projet et collecte des données factuelles au travers d'indicateurs. Sur cette base, elle réalise des projections pour la suite du projet et pourra identifier des modalités d'amélioration pour l'organisation des futurs projets. Elle intervient en appui de la direction de projet pour lui fournir toutes les informations utiles à la prise de décision. C'est la direction de projet qui est habilitée à effectuer les arbitrages et éventuellement modifier les objectifs CQD en cours de projet.

Question 5

Dans votre agence digitale, la **coordination** du projet est effectuée au **niveau des responsables de pôles**. Chaque directeur dirige les membres de sa propre équipe et le **pilotage du projet** est effectué par le **directeur de projet**. Dans quel **type d'organisation** êtes-vous ?


- ◉ Organisation fonctionnelle
- ○ Organisation matricielle
- ○ Organisation par projet

Dans une organisation fonctionnelle, ce sont les responsables de pôles qui effectuent la coordination du projet. Il y a peu de relations transversales, la hiérarchie est forte, dans une organisation de l'activité autour de silos séparés.

p. 21 **Solution n°3**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

La situation présentée est caractéristique d'une **organisation matricielle**. La coordination du projet est assurée par le chef de projet, qui le pilote, et les experts de chaque pôle. En vous inspirant des schémas vus dans le cours, vous auriez pu représenter l'organisation de votre structure de la façon suivante :

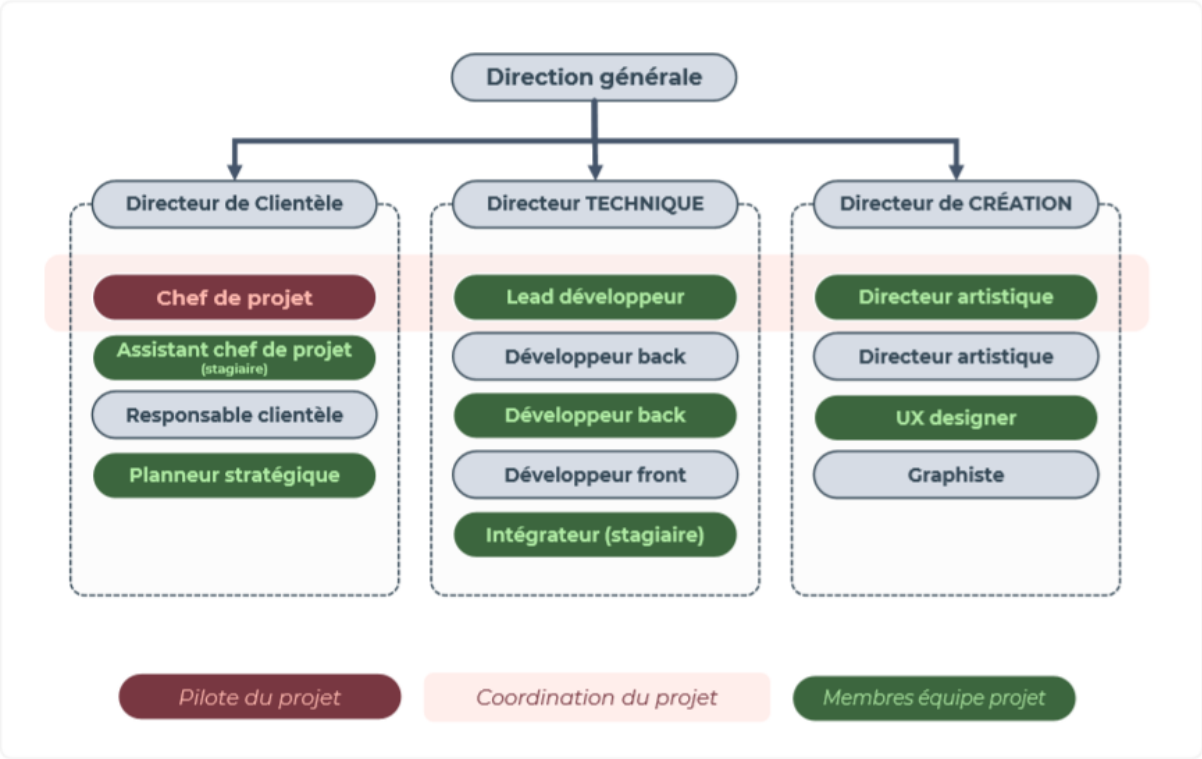

Exercice p. 21 **Solution n°4**

Formes de communication utilisées par le chef de projet

Au cours d'un projet, le chef de projet sera amené à **utiliser des modes de communication différents**. Selon le **moment** du projet, les **objectifs** visés, il devra employer des modes de communication **ascendants, descendants** ou **horizontaux**.

Associez les activités proposées au bon mode de communication :

Communication ascendante	Communication descendante	Communication horizontale
Présentation du reporting lors d'un comité de pilotage	Présentation d'un brief à une ressource	Animation d'un brainstorming
Proposition de solutions à la direction pour réaligner les objectifs CQD,	Transmission du compte-rendu d'un comité de pilotage	Retours du chef de projet à une ressource sur un livrable, avant présentation client
Livraison d'une réalisation au commanditaire.	Communication d'une modification de périmètre du projet décidée par le client	Transmission d'une conception fonctionnelle par l'UX designer au Directeur artistique

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

La communication ascendante permet de transmettre des informations aux décideurs afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées. La communication descendante est utilisée pour transmettre des directives aux équipes de réalisation. La communication horizontale s'applique elle aux échanges au sein de l'équipe de réalisation.

Exercice p. 21 **Solution n°5**

Question 1

Qu'est-ce qui distingue le **mode projet** du **mode processus** ? (Plusieurs réponses possibles)

- [x] Le mode projet nécessite un investissement, contrairement au mode processus qui crée de la valeur en fonctionnant.
- [ ] Le mode projet permet d'aboutir à un grand nombre de réalisations similaires, alors que le mode processus permet de créer un produit unique.
- [ ] Le mode processus nécessite un investissement, contrairement au mode projet qui crée un flux de trésorerie positif pendant son déroulement.
- [x] Le mode processus est répétitif et n'a pas de fin définie, contrairement à un projet qui vise la réalisation d'un résultat unique.

On oppose traditionnellement le « *mode projet* » au « *mode processus* ». Un point essentiel les distingue : en mode projet, le fait de mener à bien le projet nécessite de dépenser de l'argent (on parle de flux de trésorerie négatif). Mener un projet, c'est toujours un investissement. À l'inverse, tant qu'une structure en mode processus, comme une usine de fabrication, fonctionne, elle produit de la valeur (le flux de trésorerie est positif). Elle n'a pas vocation à se terminer.

Question 2

Quelle affirmation ci-dessous exprime **le paradoxe de la gestion de projet** ?

- ○ Les possibilités de modification du projet augmentent avec le temps.
- ◉ Une fois le projet terminé, on sait ce qu'on aurait dû faire.
- ○ Note connaissance du projet diminue avec le temps.

En début de projet, on le connaît mal, mais notre capacité d'action pour le modifier est importante. En fin de projet, tous ses paramètres sont connus. En revanche, notre capacité à le modifier est devenue très faible. En d'autres termes : une fois le projet terminé, on sait ce qu'on aurait dû faire. C'est le paradoxe de la gestion de projet.

Question 3

C'est dans une **organisation de type matriciel** que le chef de projet **porte la plus grande responsabilité** vis-à-vis de la réussite du projet.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Dans une organisation matricielle, si le chef de projet pilote bien son déroulement, il a recours à des ressources qui appartiennent à des pôles différents, sous des responsabilités hiérarchiques différentes. Il aura plus d'autonomie (et donc plus de responsabilités) que dans une organisation fonctionnelle, mais sa responsabilité vis-à-vis du succès du projet sera moins élevée que dans une organisation par projet.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 4

Parmi les **livrables supports de la description** du projet, lequel permettra au chef de projet de **piloter l'axe qualité** du triangle CQD ? (Une seule réponse juste)

- ○ Le budget
- ◉ Les spécifications
- ○ Le planning détaillé

Parmi les documents structurants du projet, placés sous la responsabilité du chef de projet, on retrouve le budget qui matérialise les charges nécessaires pour mener à bien le projet et le planning qui présente comment répartir cet effort dans le temps. On trouve aussi les spécifications qui, par la description précise de la réalisation attendue, incarnent l'axe qualité du projet.

Question 5

Parmi les propositions suivantes, lesquelles peuvent **constituer des indicateurs de pilotage ?** (Plusieurs réponses possibles)

- ☑ Le taux d'anomalies
- ☐ La construction du budget
- ☑ La consommation des ressources
- ☑ L'avancement des tâches
- ☐ La rédaction des briefs
- ☑ Le suivi du planning

Les indicateurs de pilotages permettent au chef de projet de suivre la performance du projet. Ce pilotage peut s'effectuer au travers de réunions de suivi, mais également par la définition et la mesure d'indicateurs. Le taux d'anomalies, les ressources consommées, l'avancement des tâches programmées sont autant d'indicateurs. En revanche, la construction du budget est un document permettant de définir l'effort à engager, les briefs un outil de transmission de l'information.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite
