Les processus et les disciplines de la gestion de projet selon le PMBOK

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Processus et domaines de connaissance du Project Management Institute (PMI®) 3

A. Project Management Institute (PMI®) 3

B. Qu'est-ce qu'un processus ? 3

C. Guide Du Corpus des Connaissances en Management de Projet (PMBOK®) 3

D. Groupes de processus décrits dans le PMBOK® 4

E. Domaines de connaissance décrits dans le PMBOK® 4

F. Répartition des processus de gestion de projet selon les groupes de processus et les domaines de connaissance 5

II. Exercice : Quiz 6

III. Gestion de l'intégration du projet 7

A. Élaborer la charte de projet 8

B. Élaborer le plan de management de projet 10

C. Diriger et gérer le travail du projet 11

D. Gérer les connaissances du projet 13

E. Maîtriser le projet 14

F. Maîtriser les changements 15

G. Clore le projet ou la phase 16

IV. Exercice : Quiz 17

V. Essentiel 18

VI. Auto-évaluation 19

A. Exercice : 19

B. Test 19

Solutions des exercices 20

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Processus et domaines de connaissance du Project Management Institute (PMI®)

Contexte

À la fin de ce module, vous aurez compris ce qu'est le Project Management Institute (PMI), quels sont les domaines de connaissance et les groupes de processus décrits dans le livre référence « *Le Guide Du Corpus des Connaissances en Management de Projet* ».

A. Project Management Institute (PMI®)

Organisme à but non lucratif, le PMI® fédère des millions de chefs de projet dans le monde. Il compte aujourd'hui plus de 800 000 chefs de projet expérimentés ayant passé la certification PMP « *Project Management Professional* ».

Le PMI® s'adresse aussi aux étudiants et aux chefs de projet juniors en leur permettant de passer la certification CAPM « *Certified Associate in Project Management* ».

À ce jour, environ 40 000 « *juniors* » ont réussi cette certification, et utilisent depuis le même langage et les mêmes notions que leurs aînés certifiés PMP.

B. Qu'est-ce qu'un processus ?

Définition

En informatique ou en gestion de projet, un processus est un ensemble d'actions ou d'activités permettant de transformer des données en entrées, en sorties ou résultats. Cette transformation repose sur l'utilisation d'outils et techniques.

Processus informatique

Le processus d'accès à votre PC est basé sur la capture de vos données d'accès, comme le nom d'utilisateur et mot de passe associé et la comparaison par rapport au contenu d'une structure d'annuaire telle que l'Active Directory. Suivant le résultat de cette comparaison, le système retourne l'autorisation d'accès ainsi que les droits d'utilisation des fichiers et applications.

Processus en gestion de projet

Le processus de décision de lancement d'un projet se fera à partir de l'analyse du marché et des besoins exprimés par les clients. Ce processus prendra en compte les capacités de l'entreprise et celles de l'équipe de projet. Les perspectives de création de valeur et de rentabilité seront bien entendu un facteur important dans cette décision.

C. Guide Du Corpus des Connaissances en Management de Projet (PMBOK®)

Le PMI® délivre le « *Guide Du Corpus des Connaissances en Management de Projet* », dans lequel il publie ce qui est généralement reconnu comme étant de bonnes pratiques de la gestion de projet. Une partie de ces pratiques est aujourd'hui reconnue par l'American National Standard Institute (ANSI) comme un standard.

Ces pratiques sont basées sur la notion de processus appartenant à des domaines de connaissance, et regroupées en groupes de processus.

Dans la suite de ce cours, nous appellerons le « *Guide Du Corpus des Connaissances en Management de Projet* » par son acronyme américain : le PMBOK® (Project Management Body Of Knowledge).

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

D. Groupes de processus décrits dans le PMBOK®

Le PMBOK® définit les 5 groupes de processus suivants :

- Un groupe de processus d'initialisation pour définir les grandes lignes du projet, autoriser le démarrage du projet et nommer le chef de projet.
- Un groupe de processus de planification pour élaborer le Plan de Management de Projet. Celui-ci contiendra l'ensemble des plans nécessaires au déroulement du projet.
- Un groupe de processus d'exécution pour :
  - Diriger et gérer le travail défini dans le Plan de Management du Projet,
  - Gérer les connaissances du projet.
- Un groupe de processus de contrôle pour :
  - Contrôler le projet,
  - Maîtriser les changements en s'assurant que chaque demande de changement est étudiée afin qu'une décision soit prise. Les changements du Plan de Management du Projet après son approbation passent obligatoirement par ce processus.
- Un groupe de processus de clôture du projet, qui permet de clore formellement le projet et de transmettre le résultat du projet au client.

E. Domaines de connaissance décrits dans le PMBOK®

Le PMBOK® décrit 10 domaines de connaissance que tout bon chef de projet se doit de comprendre et de connaître :

1. **La gestion du périmètre du projet** pour définir, contrôler et changer le contenu du projet.

2. **La gestion de l'échéancier du projet** pour définir l'échéancier, réaliser et finaliser le projet en respectant les délais impartis par le client.

3. **La gestion des coûts du projet** pour définir le budget, réaliser et finaliser le projet en respectant les contraintes budgétaires.

4. **La gestion de la qualité du projet** pour définir et mettre en place les normes de qualité correspondant aux exigences des parties prenantes et réaliser le projet en les respectant.

5. **La gestion des ressources du projet** pour identifier, obtenir et gérer les ressources matérielles telles que serveurs, PC, boîtiers réseaux et les ressources humaines, par exemple les développeurs, architectes de solution ou gestionnaire de base de données pour un projet informatique.

6. **La gestion des communications du projet** pour planifier, recueillir, distribuer, stocker les informations liées au projet, comme le tableau de bord et le rapport de progression.

7. **La gestion des risques du projet** pour identifier, analyser les impacts et mettre en place les solutions permettant de maîtriser les risques du projet.

8. **La gestion des approvisionnements du projet** pour identifier, obtenir et contrôler les produits, services ou résultats requis par le projet et non disponibles dans l'équipe de projet.

Définition **Partie prenante**

Avant de passer au domaine de connaissance suivant, une définition s'impose.

Une partie prenante est toute personne, groupe de personne, ou organisation susceptible d'impacter, d'être impactée ou de se sentir impactée par le projet. L'impact des parties prenantes peut bien entendu bénéficier au projet ou lui nuire, d'où l'importance d'accompagner les parties prenantes tout au long du projet.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple

Dans tout projet informatique, nous trouverons des parties prenantes internes à l'organisation du projet, comme le chef de projet, l'équipe de projet ou les différents spécialistes utilisés par le projet.

Nous trouverons aussi des parties prenantes externes telles que le client, l'utilisateur final, les différents organismes publics qui régissent les lois sur l'environnement ou la sécurité, par exemple.

Et puis, bien entendu, n'oublions pas la concurrence, qui dictera en partie notre vision sur le contenu, les coûts, les délais de notre projet.

9. **La gestion des parties prenantes du projet** pour permettre l'identification et l'accompagnement des parties prenantes afin que celles-ci restent bienveillantes vis-à-vis de notre projet.

10. **La gestion de l'intégration du projet** : ce dernier domaine assure la coordination de l'ensemble des processus de gestion de projet. Contrairement aux précédents domaines de connaissance qui peuvent être sous la responsabilité d'autres membres de l'équipe de projet, la bonne intégration du projet est la responsabilité du chef de projet. Ce domaine de connaissance sera détaillé dans le chapitre suivant.

Les 10 domaines de connaissance décrits précédemment peuvent être complétés par des domaines de connaissance propres à chaque métier.

Exemple

Dans la construction d'immeubles par exemple, la gestion de la sécurité physique d'un chantier est un domaine de connaissance spécifique et obligatoire. Ce domaine repose sur une réglementation très stricte régissant par exemple la mise en place des échafaudages ou la hauteur des garde-corps.

F. Répartition des processus de gestion de projet selon les groupes de processus et les domaines de connaissance

Le PMBOK® définit 49 processus répartis sur les 5 groupes de processus et couvrant les 10 domaines de connaissance. Comme le montre la figure ci-dessous, cette répartition :

- N'est pas uniforme, le nombre de processus variant pour chaque domaine de connaissance et pour chaque groupe de processus.
- N'est pas représentative de la complexité du domaine : la gestion des coûts, par exemple, ne comporte que 4 processus alors que la gestion de l'échéancier en comprend 6, et pourtant les 2 domaines de compétence sont de complexité similaire.
- N'est pas représentative du temps que le chef de projet va lui consacrer. Le parfait exemple est la gestion de la communication qui ne comporte que 3 processus alors que le chef de projet consacrera la majeure partie de son temps à communiquer.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Initialisation	Planification	Exécution	Contrôle	Clôture	
Intégration du projet					7 processus
	Périmètre		Périmètre		6 processus
	Délais		Délais		6 processus
	Coûts		Coûts		4 processus
	Qualité				3 processus
	Ressources				6 processus
	Communication				3 processus
	Risques				7 processus
	Approvisionnement				3 processus
Parties prenantes					4 processus
2 processus	24 processus	10 processus	12 processus	1 processus	49 processus

Exemple

Ce tableau montre par exemple :

Qu'il y a 24 processus de planification pour couvrir l'ensemble des domaines de connaissance.

Que la gestion des parties prenantes est composée de 4 processus différents répartis sur 4 groupes de processus.

Conseil

Il appartient au chef de projet et à l'équipe de projet d'adapter les domaines de connaissance et les processus utilisés au projet et à son contexte en tenant compte de la complexité du projet, de ses risques ou de la législation. Par exemple, il ne servira à rien de planifier les approvisionnements pour un projet ne nécessitant pas d'achats extérieurs.

Exercice : Quiz

Question 1

Le Project Management Institute (PMI®) est une société américaine.

- O Vrai
- O Faux

Question 2

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Un processus :

- Est un ensemble d'actions permettant de transformer des données en entrées, en sorties ou en résultats
- N'est pas utilisé en gestion de projet
- N'utilise pas d'outils ou de technique

Question 3

Le PMBOK® décrit un ensemble de processus regroupés en domaines de connaissance et groupes de processus.

- Vrai
- Faux

Question 4

Les groupes de processus décrits dans le PMBOK® sont :

- Initialisation, continuation, planning, exécution et finalisation
- Formalisation, planification, exécution, contrôle et clôture
- Formalisation, initialisation, planning, contrôle et clôture
- Initialisation, planification, exécution, contrôle et clôture

Question 5

Le PMBOK® décrit les domaines de connaissance liés à tous les métiers.

- Vrai
- Faux

Question 6

Tous les processus de tous les domaines de connaissance doivent être appliqués à tous les projets.

- Vrai
- Faux

II. Gestion de l'intégration du projet

Introduction

L'intégration du projet est le seul domaine de connaissance couvrant les 5 groupes de processus. Cette particularité lui permet d'adresser les processus principaux de la gestion de projet tels que l'autorisation du projet, sa planification, son exécution, la gestion des connaissances, son contrôle, la gestion des changements ou la clôture du projet.

La gestion de l'intégration du projet, pré carré du chef de projet comporte 7 processus différents que nous allons voir dans les sous-chapitres suivants.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Initialisation	Planification	Exécution	Contrôle	Clôture	
Intégration du projet					7 processus
1 processus	1 processus	2 processus	2 processus	1 processus	
-Elaborer la charte du projet	-Elaborer le plan de management du projet	-Diriger et gérer le travail du projet -Gérer les connaissances du projet	-Maîtriser le projet -Maîtriser les changements	-Clore le projet ou la phase	

A. Élaborer la charte de projet

Exemple

Qui n'a pas entendu dans sa vie personnelle ou professionnelle des questions comme :

C'est vraiment à nous d'inviter toute la famille pour Noël ? Quel travail !

Mais comment ? Un projet existe pour améliorer la gestion des fournisseurs et c'est Jean qui le dirige ?

Vous êtes certains que tous les PC auront un nouvel antivirus en février ?

Eh bien, ces questions correspondent soit au besoin d'initialiser un projet, soit à un projet en cours dont l'initialisation n'a pas été faite ou communiquée correctement.


Le processus d'initialisation

Le processus d'initialisation consiste à rédiger un document, « *la charte de projet* ». Descriptif du projet, la charte de projet autorisera formellement le démarrage de celui-ci et officialisera le chef de projet. Ce document contiendra des informations telles que : le nom du projet, sa description, la liste de ses objectifs principaux, des risques, des exigences, des contraintes et hypothèses. La charte contiendra aussi un premier planning et une vision du budget nécessaire, le nom du chef de projet et celui du responsable organisationnel en mesure d'autoriser le projet. Ce responsable est souvent appelé sponsor.

La création de la charte de projet s'appuie sur l'étude et l'analyse des « *documents business* », comme l'étude de rentabilité. Cette création s'appuie aussi sur les différents accords ou contrats qui régissent le projet.

L'environnement du projet jouera un rôle important dans l'élaboration de la charte de projet. À titre d'exemple, cet environnement inclut les contraintes légales, les conditions du marché, les attentes des parties prenantes ainsi que les processus et standards de l'entreprise.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

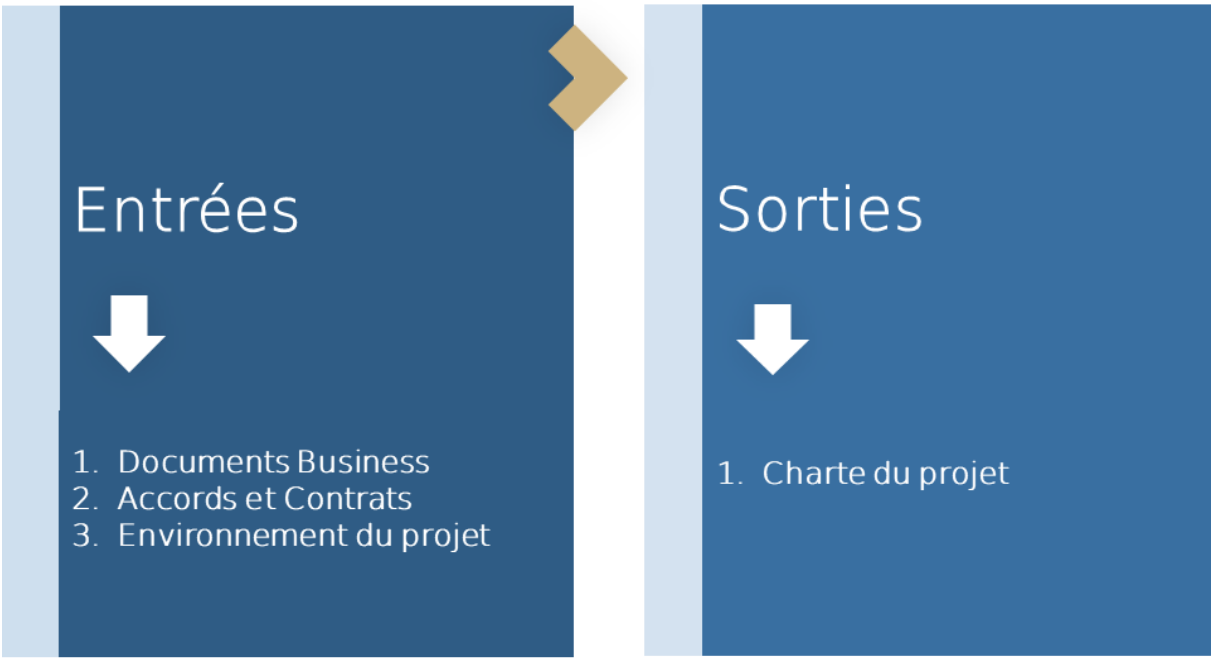

La charte de projet devra impérativement être signée par le responsable organisationnel autorisant et finançant le projet.

Attention **Le processus d'initialisation**

L'écriture et la communication de la charte de projet appartiennent au responsable organisationnel autorisant et finançant le projet. Celui-ci peut se faire aider par le chef de projet pressenti, mais il garde l'entière responsabilité de la charte de projet.

Ce processus n'est en général effectué qu'une seule fois.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple **Le processus d'initialisation**

L'exemple ci-dessous décrit une charte de projet simplifiée pour un projet d'installation d'un *software* antivirus sur un ensemble de serveurs en Europe.

Exemple de Charte de Projet Simplifiée **Nom du Projet: Installation anti-virus** **Date: 15 septembre**

Description: Ce projet a pour but d'installer un nouvel anti-virus sur l'ensemble des serveurs européens.	
Historique et contexte	Gouvernance du projet
L'anti virus précédent manquant de fiabilité, le comité de pilotage de juillet a approuvé le projet remplacement de l'anti virus.	Sponsor: Jacques VIR. Directeur des achats: Phil ACHE. Directeur Informatique: Sylvie INF.
Opportunités et Contraintes	Equipe de projet pressentie
Opportunité: La plupart des sites ferment entre Noel et Jour de l'an cela favorisera l'installation de l'antivirus. Contrainte: l'installation doit être terminée au plus tard fin février	Architecte de solution: Philippe X. à confirmer. Spécialiste antivirus: Sophie T. à confirmer. 2 Spécialistes serveur: à déterminer.
Budget du Projet	Echéancier du projet
Anti-virus: 200.000€ (licences et mises à jour pendant 5 ans). Déploiement: 250.000€ (déploiement initial sur tous les serveurs)	- 30 octobre: présentation de la solution technique. - 15 novembre: Approbation de la solution technique. - 05 janvier: 75% de l'installation terminée.
Qualité attendue:	
Le taux de disponibilité des serveurs dans la période 8h à 19h ne devra pas descendre en dessous de 99,98%.	
Donneur d'ordre et signature:	Chef de Projet
Jacques VIR 	Laurent PROJ

Attention **Le processus d'initialisation**

Sans charte de projet signée, pas de projet !

B. Élaborer le plan de management de projet

Attention **Responsabilité du chef de projet**

À partir de ce processus, tous les processus de l'intégration du projet sont sous la responsabilité du chef de projet. Celui-ci peut déléguer une partie de ce travail, mais il en garde la responsabilité.

Ce processus consiste à élaborer un plan de projet intégré qui adressera l'ensemble des domaines de connaissance du projet. Ce plan de management de projet définit la base du travail à effectuer pour mener le projet à bien et la manière dont il faudra travailler.


Le chef de projet est responsable de l'élaboration de ce plan de management de projet.

Pour les petits projets (moins de 5 à 6 personnes), le chef de projet réalisera lui-même ce travail de planification.

Pour les gros projets, le chef de projet s'appuiera sur son équipe et jouera un rôle d'intégrateur.

La charte de projet, les sous-plans produits par d'autres processus sous la responsabilité de son équipe de projet et l'environnement du projet permettront la création de ce plan de management de projet.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

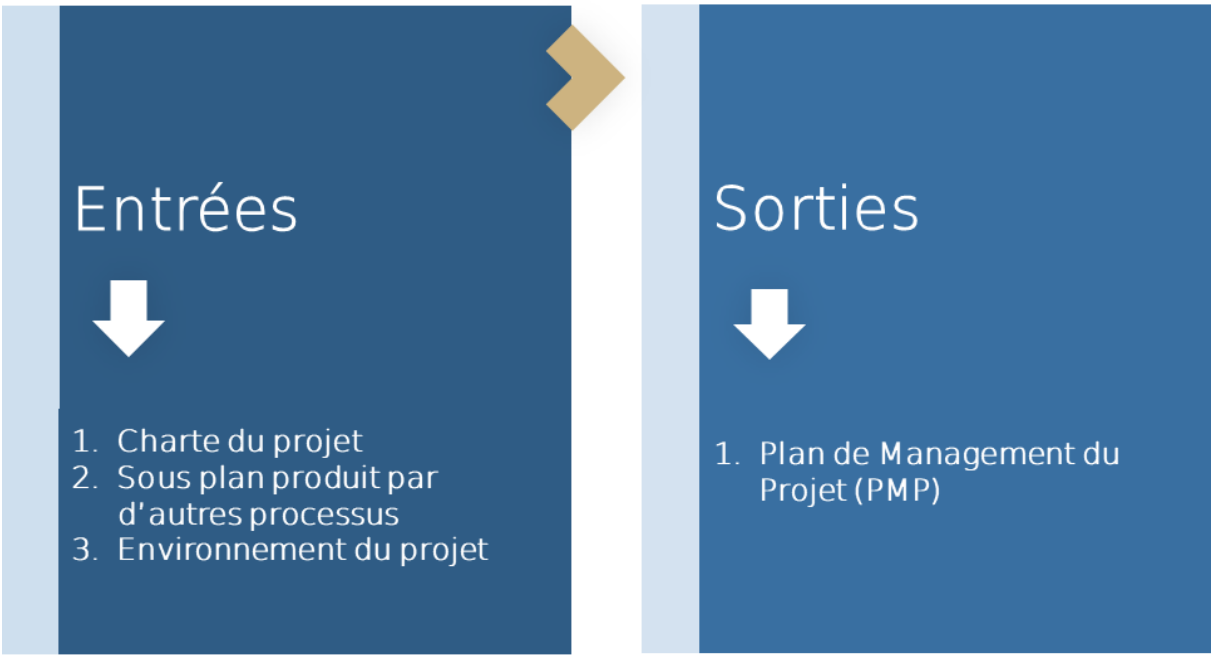

Sous-plan produit par d'autre processus

Dans les projets importants, la préparation du budget prévisionnel, du planning prévisionnel, la définition et la gestion de la qualité sont souvent « *déléguées* » à des experts. Ces experts transmettront leurs plans au chef de projet pour qu'ils soient intégrés après validation dans le Plan de Management du Projet.

L'environnement du projet

Le chef de projet devra bien entendu tenir compte de l'environnement du projet tel que les standards industriels, les contraintes réglementaires, l'infrastructure de l'entreprise, les retours d'expérience ou les méthodes en place dans l'organisation de projet.

Remarque

Même si le Plan de Management de Projet peut subir des modifications « *contrôlées* » par la suite, ce processus n'est en général exécuté qu'une seule fois en début de projet. Contrairement à la charte de projet, le Plan de Management de Projet n'est pas obligatoirement signé, même si cette signature est recommandée dans le cas de projets importants.

Attention

Pas de Plan de Management de Projet, pas de projet !

C. Diriger et gérer le travail du projet

Définition **Petit rappel sur la notion de livrable**

Un livrable se définit par tout ou partie d'un produit ou d'un service pouvant être délivré. L'on parle souvent de livrable externe quand le livrable est à destination du client, de livrable interne quand il est à destination de l'équipe de projet. De même, certains chefs de projet parlent de livrable global (constituant un produit ou service complet) ou de sous-livrable (constituant une partie d'un produit ou service).


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple

Dans un projet de développement informatique, la définition du Plan de Management de Projet, la mise en place de l'infrastructure serveur ou réseaux, le produit informatique final sont des livrables.

Ce processus de diriger et gérer le travail du projet consiste à coordonner, guider et exécuter l'ensemble du travail à effectuer tel que décrit dans le plan de management du projet, de manière à produire les livrables du projet. Ce processus est aussi celui qui permettra la réalisation des demandes de changements après leur approbation.

En plus des livrables, l'équipe de projet initialisera de nouvelles demandes de changements, délivrera des données sur la performance d'exécution du projet et effectuera des changements divers sur les plans de projet ou la documentation de projet.

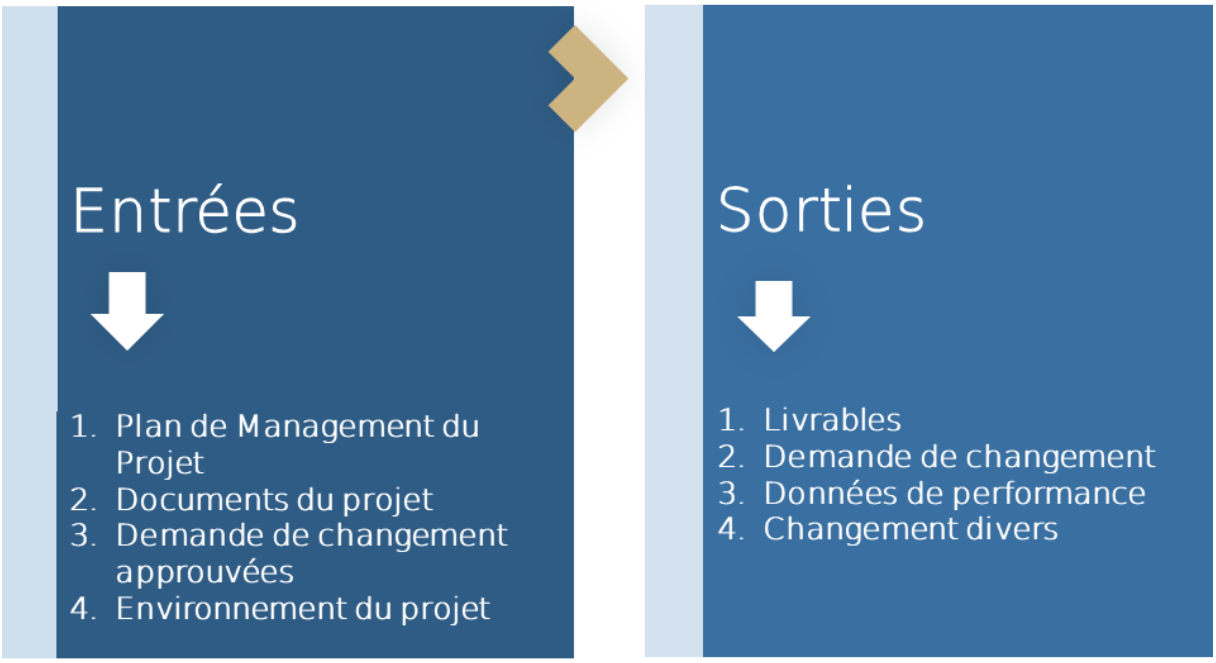

Documents du projet

Tout au long du projet, le chef de projet et son équipe peuvent s'appuyer sur des documents tels que :

- Le journal des changements, qui contient l'intégralité des demandes de changement et des décisions prises à leur sujet (approuvé, rejeté, suspendu).
- Le registre des risques, qui contient la liste des risques et leurs caractéristiques principales, telles que la probabilité et l'impact si le risque venait à se produire.
- L'échéancier du projet, qui contiendra les différentes tâches du projet et leurs caractéristiques, telles que leur durée, leur date de réalisation, les personnes qui les réaliseront.

L'environnement du projet

Le chef de projet devra bien entendu tenir compte de l'environnement du projet, comme la structure de l'organisation, l'infrastructure en place, les procédures de gestion de projet, les données historiques en provenance de projets similaires.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Données de performance

Les données relatives à la performance d'exécution du projet fournissent par exemple la liste des tâches effectuées, l'état des livrables, ou les sommes réellement dépensées. Ces données demanderont un travail d'analyse et de mise en forme pour être communiquées aux parties prenantes. Pour cette raison, on les qualifie de données brutes.

Changements divers

L'équipe de projet pourra effectuer des changements dans les documents de projets. Par exemple dans le journal des hypothèses, dans le journal des risques, celui des parties prenantes, ou encore la liste des points à traiter.

D. Gérer les connaissances du projet

Exemple

Quand un analyste-programmeur développe une bibliothèque de sous-programmes pour simplifier son code source, il est critique pour le projet et pour l'organisation elle-même que les sous-programmes soient répertoriés et mis à disposition du reste de l'équipe et d'autres équipes de projet. Cet exemple illustre l'importance de la gestion des connaissances.

Ce domaine de connaissance ajouté en 2017 dans le PMBOK®, est aujourd'hui déterminant dans la performance d'une équipe de projet et ses relations avec les parties prenantes.

Nous savons tous que rien n'est plus pénible pour les parties prenantes que des erreurs identiques répétées à longueur de projet.

Attention

La gestion des connaissances s'est très longtemps focalisée sur la gestion de l'information. Celle-ci consiste à s'assurer que le groupe de projet pourra avoir accès à la documentation, aux bibliothèques de données, et aujourd'hui aux données de la toile.

C'était oublier la partie immergée, la gestion des connaissances, qui consiste à mettre en place les outils permettant à tous de partager et d'intégrer les connaissances des autres membres de l'équipe. Ces outils incluent par exemple les forums de discussion ou les groupes de partage. Le partage des connaissances suppose un groupe de projet soudé, et une vraie confiance entre les membres du projet.

La gestion des connaissances du projet permet :

D'une part, de se servir de connaissances acquises dans des projets similaires.

D'autre part, de capturer les connaissances acquises pendant la durée du projet pour les mettre à la disposition de l'équipe de projet et pour de futurs projets similaires.

Ce processus utilise le Plan de Management du Projet, les documents du projet, les livrables et les éléments d'environnement du projet pour créer ou modifier le registre des retours d'expérience (liste des connaissances que le projet a permis de révéler).

Les actifs organisationnels font partie de l'environnement du projet et contiennent les retours d'expériences et les nouvelles connaissances sous des formes très variées. Ces formes sont par exemple de la documentation, de la vidéo, des librairies de sous-programmes.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Exemple

Un registre de retour d'expérience simplifié peut se présenter sous la forme d'un tableau Excel du type suivant :

N°	Description	Mise à jour	Contact	Accès aux fichiers
001	Sous-Programmes d'accès aux bases de données client	21/10/19	Philippe Le-programme 06.99.99.99.99	http://www.actifsmacompanie.fr
002	Optimisation des ressources système	.....	.....	.....

E. Maîtriser le projet

Ce processus consiste à effectuer le suivi de l'avancement du projet de manière à pouvoir communiquer sur son état d'avancement et les divergences par rapport au Plan de Management de Projet. Le suivi se fait par calcul et analyse des variances entre l'état actuel du périmètre, du planning, des coûts, et ce qui a été défini dans le plan de management du projet.

Ce processus utilise les informations sur les performances d'exécution en provenance des processus de contrôle des coûts, du périmètre ou des délais pour générer des rapports sur la performance d'exécution du projet.

Ce processus est exécuté tout au long du projet.



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Remarque **Rapport sur la performance d'exécution**

Le plus utilisé des rapports sur la performance d'exécution est le tableau de bord.

Préparé mensuellement par le chef de projet, il est distribué aux parties prenantes. Il fournit un état d'avancement du projet sur les indicateurs les plus importants (périmètre, délais, coûts, qualité), les problèmes critiques, et l'état d'avancement global du projet. Présenté sous forme de tableau, il se doit d'être lisible et synthétique, et il fait très souvent appel à la couleur.

Exemple de Tableau de bord

Nom du Projet: Projet-X Période: février 2020 Etat global du projet 

Indicateurs	Etat précédent	Etat actuel	Information	Demande d'aide
Périmètre			Le périmètre est contenu	Non
Délais			Les délais sont maintenant respectés	Non
Coûts			Les coûts sont contenus	Non
Qualité			La qualité est de nouveau maitrisée	Non
Risques			Le risque ne se produira plus	Non

Autres	L'équipe de projet a beaucoup travaillé pour éliminer le retard du mois dernier; je souhaite un budget de 2000€ pour mettre en place un repas de groupe et maintenir une équipe motivée.

F. Maîtriser les changements

Tout projet implique des changements. Ces changements sont inhérents aux risques et incertitudes qui entourent chaque projet et à leur caractère unique. Ces changements se font :

- Dans les spécifications ou les fonctionnalités du produit ou du service à délivrer,
- Dans les méthodes ou les moyens de communication,
- Dans les rapports de performance d'exécution,
- Etc.

Conseil

S'il est impossible de refuser les changements, il est vital de les maîtriser tout au long du projet, ce qui se traduit principalement par :

- S'assurer que toutes les demandes de changement sont référencées dans un journal des changements.
- Vérifier l'impact de chaque demande de changement sur le périmètre, les délais, les coûts et la qualité.
- S'assurer qu'une décision est prise et référencée pour chaque demande de changement (approbation, refus, ajournement). Ces décisions sont prises généralement par un comité de maîtrise des changements après analyse des informations fournies par le chef de projet et son équipe.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



La mise à jour des plans et documents inclut la mise à jour du journal des changements, qui se doit de contenir la décision prise par le comité de maîtrise des changements.

G. Clore le projet ou la phase

Ce processus permet de clore toutes les activités liées à un projet ou à une phase d'un projet. De manière générale, il est exécuté une seule fois en fin de projet ou phase. Il consiste principalement à :

- Vérifier que tous les livrables ont bien été acceptés par le client.
- S'assurer que l'ensemble des documents du projet sont mis à jour et transférés dans les actifs organisationnels.
- Transférer le produit ou service résultat du projet ou de la phase à son destinataire final (cela implique bien souvent un transfert de connaissance).
- Éditer un rapport final sur le projet.
- Célébrer la fin du projet.
- Libérer les ressources matérielles et humaines afin que celles-ci soient disponibles pour un autre projet.



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Attention

Attendre la fin d'une phase ou la fin du projet pour faire accepter les livrables par le client rend souvent ce processus plus lent et plus difficile que prévu. Ces approbations doivent donc être collectées tout au long du projet.

Conseil

L'aspect humain est particulièrement important dans la gestion de la clôture d'un projet. Le chef de projet devra par exemple s'assurer autant que possible que les membres du projet retrouvent un autre projet ou retournent sans difficultés dans leur organisation d'origine.

De plus, les membres d'un groupe de projet ne réagissent pas de la même manière en période de clôture :

- Certaines personnes font tout pour continuer à travailler sur le projet, créant ainsi des coûts inutiles.
- D'autres personnes font tout pour en partir le plus vite possible, et vont éventuellement créer des problèmes pour finaliser certaines tâches.

Ce type de comportement se retrouve aussi bien chez le client que dans l'équipe de projet. Ce type de comportements impactera le projet si le chef de projet néglige le facteur humain.

Exercice : Quiz

Question 1

Une charte de projet est importante uniquement pour les gros projets.

- O Vrai
- O Faux

Question 2

Dans les propositions suivantes, quelle est la bonne réponse ?

- O Charte de projet et plan de management de projet doivent obligatoirement être signés.
- O La charte de projet doit être signée, le plan de management de projet peut être signé.
- O La charte de projet peut être signée, le plan de management de projet doit être signé.
- O La charte de projet peut être signée, le plan de management de projet peut être signé.

Question 3

La charte de projet n'est pas utilisée dans l'élaboration du plan de management de projet.

- O Vrai
- O Faux

Question 4

Diriger le travail du projet consiste à ne réaliser que ce qui est défini dans la charte de projet.

- O Vrai
- O Faux

Question 5

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Gérer la connaissance du projet consiste uniquement à assurer un bon accès à l'information.

- Vrai
- Faux

Question 6

Maîtriser le projet n'a pas pour but principal de gérer les demandes de changement.

- Vrai
- Faux

Question 7

Toutes les demandes de changement, même celles qui n'ont pas d'impact sur le projet, doivent suivre le processus de maîtrise des changements.

- Vrai
- Faux

Question 8

Le processus de clôture ne vérifie pas en général que l'ensemble des livrables a été accepté par le client.

- Vrai
- Faux

III. Essentiel

Bien que n'étant pas une science exacte, comme les mathématiques par exemple, la gestion de projet demande une certaine rigueur pour augmenter les chances de succès du projet. Cette rigueur s'exprime dans les processus décrits par le PMI® et doit aussi correspondre à la complexité du projet. Le budget du projet, son échéancier, ainsi que les contraintes internes ou externes au projet influenceront la rigueur de gestion du projet.

Quand c'est possible, le PMI® favorise l'agilité dans la gestion de projet. Mais il n'est pas un chef de projet qui accepte aujourd'hui de se passer d'une charte de projet ou d'un plan de management de projet.



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

IV. Auto-évaluation

A. Exercice :

Vous êtes chef de projet certifié par le Project Management Institute dans une petite entreprise de développement informatique de la région Grenobloise ISER-Soft, qui vient de racheter une société américaine USA-DEV. Le président directeur général d'ISER-Soft a nommé le directeur technique d'ISER-Soft sponsor de cette acquisition en collaboration étroite avec son homologue américain. Le directeur technique s'appuiera sur un chef de projet : vous-même.

Le budget prévisionnel est de 1 M€, le projet doit se dérouler entre janvier et fin juin. Pour réduire les coûts, les voyages seront limités à un par mois pour la gouvernance du projet y compris pour le chef de projet.

Le président directeur général souhaite un Plan de Management de Projet fin février. Un pilote permettant de valider le projet devra être fait en avril, et un meeting permettant de valider le projet devra être tenu fin mai, avant la mise en production.

Le directeur technique vous demande de commencer à planifier le projet immédiatement pour permettre aux équipes française et américaine de travailler ensemble le plus vite possible.

Question 1

Quelles informations pouvez-vous inscrire dans la charte de projet ?

Question 2

Quel échéancier pouvez-vous établir ?

Question 3

Sachant que votre directeur général envisage une autre acquisition, quelles connaissances et quelles leçons aimeriez-vous sauvegarder ?

B. Test

Vous êtes chef de projet certifié par le Project Management Institute dans une petite entreprise de développement informatique de la région Grenobloise ISER-Soft qui vient de racheter une société américaine USA-DEV. Le président directeur général d'ISER-Soft a nommé le directeur technique d'ISER-Soft sponsor de cette acquisition en collaboration étroite avec son homologue américain. Le directeur technique s'appuiera sur un chef de projet : vous-même.

Le budget prévisionnel est de 1 M€, le projet doit se dérouler entre janvier et fin juin, pour réduire les coûts, les voyages seront limités à un par mois pour la gouvernance du projet y compris pour le chef de projet.

Le président directeur général souhaite un Plan de Management de Projet fin février. Un pilote permettant de valider le projet devra être fait en avril, et un meeting permettant de valider le projet devra être tenu fin mai, avant la mise en production.

Le directeur technique vous demande de commencer à planifier le projet immédiatement pour permettre aux équipes française et américaine de travailler ensemble le plus vite possible.

Exercice : Quiz

Question 1

La demande provient du directeur technique, vous commencez à planifier votre projet.

- O Vrai
- O Faux

Question 2

Comment expliquez-vous l'avantage d'établir une charte de projet au directeur technique d'ISER-Soft ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- La charte de projet permet de gérer les demandes de changements
- La charte de projet permet de fournir un échéancier précis et détaillé du projet
- La charte de projet est obligatoire pour les projets d'acquisition
- La charte de projet permet d'officialiser le chef de projet et permet de lier le projet à l'organisation

Question 3

Le directeur technique se rend à vos arguments et signe la charte de projet que vous lui avez préparée. Que devez-vous faire ensuite ?

- Mettre en place un comité de revue des changements
- Commencer à planifier votre projet
- Contrôler que tous les livrables sont acceptés par le directeur technique et son homologue aux USA
- Commencer directement la phase d'exécution du travail du projet

Question 4

Vous prévoyez la mise en place d'un comité de revue et d'approbation des changements. Qui d'après vous devra intégrera ce comité ?

- Un tel comité n'a pas lieu d'être
- Vous-même uniquement
- Le directeur technique d'ISER-Soft et son homologue américain

Question 5

Votre directeur technique vous demande de lui fournir un rapport décrivant la performance de votre projet et de le délivrer tous les premiers lundis du mois. Vous trouvez cette demande :

- Irrecevable, beaucoup de lundis sont fériés dans les mois à venir
- Trop gourmande en temps, vous essayez de négocier un rapport par trimestre
- Tout à fait normale, et vous préparez un modèle de tableau de bord pour le soumettre à votre directeur technique et son homologue
- Tout à fait normale, vous réutiliserez un modèle de tableau de bord en provenance d'un précédent projet ou des exigences de votre directeur technique

Question 6

Vous croisez votre président directeur général au coin café, celui-ci vous félicite pour la manière dont vous gérez ce projet d'acquisition et vous confie de manière confidentielle sa volonté d'acquérir une autre société en Europe. Que devez-vous faire ?

- Commencer à préparer une charte de projet pour cette nouvelle acquisition
- Mettre en place un processus de gestion des connaissances
- Vous assurer que votre plan de projet peut s'adapter à toutes les acquisitions
- Ce projet vous épuise, commencez à chercher du travail chez un concurrent

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 6 Solution n°1

Question 1

Le Project Management Institute (PMI®) est une société américaine.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Q Le PMI® n'est pas une société, mais bien un organisme, une association à but non lucratif qui s'est donnée pour mission d'améliorer la gestion de projet et de fédérer les chefs de projet dans le monde entier. Il édite le « *Guide du Corpus des Connaissances en Management de Projet* » et propose des certifications en gestion de projet reconnues dans le monde entier.

Question 2

Un processus :

- ◉ Est un ensemble d'actions permettant de transformer des données en entrées, en sorties ou en résultats
- ○ N'est pas utilisé en gestion de projet
- ○ N'utilise pas d'outils ou de technique

Q En informatique ou en gestion de projet, un processus est un ensemble d'actions ou d'activités permettant de transformer des données en entrées en résultats. Cette transformation repose sur l'utilisation d'outils et techniques.

Question 3

Le PMBOK® décrit un ensemble de processus regroupés en domaines de connaissance et groupes de processus.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Q Le PMBOK® décrit un ensemble de bonnes pratiques basées sur 49 processus regroupés en 10 domaines de connaissance et en 5 groupes de processus.

Question 4

Les groupes de processus décrits dans le PMBOK® sont :

- ○ Initialisation, continuation, planning, exécution et finalisation
- ○ Formalisation, planification, exécution, contrôle et clôture
- ○ Formalisation, initialisation, planning, contrôle et clôture
- ◉ Initialisation, planification, exécution, contrôle et clôture

Q Le PMBOK® décrit 5 groupes de processus : initialisation, planification, exécution, contrôle et clôture. Chacun de ces groupes couvre une partie de l'activité du projet : par exemple, le groupe de processus de clôture permet de clore formellement le projet et de transmettre le résultat du projet au client.

Question 5

Le PMBOK® décrit les domaines de connaissance liés à tous les métiers.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Le PMBOK® décrit les domaines de connaissance liés à la gestion de projet, mais n'aborde pas les domaines de connaissance spécifiques à chaque métier.

Question 6

Tous les processus de tous les domaines de connaissance doivent être appliqués à tous les projets.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Aucun projet n'est identique à un autre. Il appartient donc au chef de projet et à son équipe d'adapter les domaines de connaissance et les processus au projet et à son contexte.

Exercice p. 17 Solution n°2

Question 1

Une charte de projet est importante uniquement pour les gros projets.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Une charte de projet est obligatoire, quelle que soit la taille du projet ou sa complexité. Elle permet de lier l'organisation au projet, de nominer le chef de projet et de communiquer le démarrage du projet.

Question 2

Dans les propositions suivantes, quelle est la bonne réponse ?

- ○ Charte de projet et plan de management de projet doivent obligatoirement être signés.
- ◉ La charte de projet doit être signée, le plan de management de projet peut être signé.
- ○ La charte de projet peut être signée, le plan de management de projet doit être signé.
- ○ La charte de projet peut être signée, le plan de management de projet peut être signé.

La charte de projet est obligatoirement signée, le plan de management de projet peut être signé ; en général, c'est le cas pour tous les projets d'envergure ou dans les organisations qui mettent en place un niveau de contrôle élevé.

Question 3

La charte de projet n'est pas utilisée dans l'élaboration du plan de management de projet.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

La charte de projet contient des informations telles que le budget prévisionnel, l'échéancier prévisionnel ou encore l'équipe de projet pressentie. Ces informations serviront à établir le plan de management du projet.

Question 4

Diriger le travail du projet consiste à ne réaliser que ce qui est défini dans la charte de projet.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Diriger et gérer le travail du projet ne consiste pas à ne réaliser que ce qui est défini dans le plan de management du projet. La charte de projet n'est pas assez détaillée pour constituer la définition du travail à effectuer.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 5

Gérer la connaissance du projet consiste uniquement à assurer un bon accès à l'information.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

L'accès à l'information est une partie de la gestion des connaissances, l'autre partie est de s'assurer que les connaissances non écrites soient partagées entre les membres du projet. Ce partage n'est possible que si la confiance est établie dans l'équipe de projet.

Question 6

Maîtriser le projet n'a pas pour but principal de gérer les demandes de changement.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

La gestion des demandes de changement s'effectue dans le processus « *Maîtriser les changements* ».

Question 7

Toutes les demandes de changement, même celles qui n'ont pas d'impact sur le projet, doivent suivre le processus de maîtrise des changements.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Toutes les demandes de changement doivent suivre le processus de maîtrise des changements. Cette règle permet d'éviter les changements de périmètre incontrôlés et ainsi d'éviter l'apparition de risques supplémentaires dans la suite du projet.

Question 8

Le processus de clôture ne vérifie pas en général que l'ensemble des livrables a été accepté par le client.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Le processus de clôture intègre la vérification que l'ensemble des livrables est bien accepté, approuvé par le client. Un projet ne peut pas être clôturé si un ou plusieurs livrables ne sont pas acceptés.

Exercice p. Solution n°3

Un nom de projet « *à définir, par exemple Acquisition* », la description du projet, son budget initial, son échéancier initial, la contrainte du nombre de voyages, son donneur d'ordre, le nom du chef de projet.

Exercice p. Solution n°4

Bien qu'il manque quelques détails, l'énoncé du contexte décrit les jalons les plus importants. L'échéancier suivant respecte ces jalons :

- Écriture et approbation de la charte de projet : janvier.
- Écriture et présentation du Plan de Management de Projet : février.
- Exécution du projet : mars.
- Pilote : avril.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- Correction suite au pilote : mai.
- Présentation pour décision avant production : fin mai.
- Mise en production : juin.

Exercice p. Solution n°5

Cette question est bien entendu très ouverte, mais il est important de sauvegarder :

- La charte de projet et le Plan de Management de Projet ainsi que tous les documents que vous aurez construits, par exemple la liste des problèmes ou la liste des risques. Ces documents pourront servir pour un projet similaire.
- Une des contraintes du projet étant la limitation du nombre de voyages, les solutions techniques telles que les visioconférences ou le partage de fichiers par SharePoint sont autant d'éléments utiles pour un projet similaire.
- Enfin, dans ce projet, le côté humain est primordial. Il est donc important de noter ce que vous avez appris sur les différences culturelles. La manière dont vous avez dépassé les ressentis des employés américains suite à l'acquisition de leur société, et comment vous avez transformé deux équipes en une sont autant de leçons importantes pour le prochain projet.

Exercice p. 19 Solution n°6

Question 1

La demande provient du directeur technique, vous commencez à planifier votre projet.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Malgré l'urgence et la provenance de la demande, vous ne pouvez pas commencer un projet sans avoir une charte de projet écrite et signée par le donneur d'ordre. Expliquez vos raisons au directeur technique et proposez-lui de travailler à l'établissement de la charte de projet.

Question 2

Comment expliquez-vous l'avantage d'établir une charte de projet au directeur technique d'ISER-Soft ?

- ○ La charte de projet permet de gérer les demandes de changements
- ○ La charte de projet permet de fournir un échéancier précis et détaillé du projet
- ○ La charte de projet est obligatoire pour les projets d'acquisition
- ◉ La charte de projet permet d'officialiser le chef de projet et permet de lier le projet à l'organisation

Une charte de projet ne permet pas de gérer les demandes de changement et ne fournit pas de données détaillées (c'est trop tôt). Une charte de projet est obligatoire pour tous les projets et pas uniquement pour les projets d'acquisition. Elle permet de nommer le chef de projet et de faire le lien entre l'organisation qui supporte le projet et le projet lui-même.

Question 3

Le directeur technique se rend à vos arguments et signe la charte de projet que vous lui avez préparée. Que devez-vous faire ensuite ?

- ○ Mettre en place un comité de revue des changements
- ◉ Commencer à planifier votre projet

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- ○ Contrôler que tous les livrables sont acceptés par le directeur technique et son homologue aux USA
- ○ Commencer directement la phase d'exécution du travail du projet

La charte de projet est signée, il est maintenant temps de planifier votre projet et de développer le Plan de Management du Projet. Ce plan pourra être simplifié si l'acquisition se révèle être un projet simple, mais ce plan est obligatoire pour commencer à travailler sur les livrables du projet.

Question 4

Vous prévoyez la mise en place d'un comité de revue et d'approbation des changements. Qui d'après vous devra intégrera ce comité ?

- ○ Un tel comité n'a pas lieu d'être
- ○ Vous-même uniquement
- ◉ Le directeur technique d'ISER-Soft et son homologue américain

Un comité de revue et d'approbation des demandes de changement doit être mis en place, et le directeur technique d'ISER-Soft et son homologue américain sont les personnes les plus appropriées pour gérer les demandes de changement. Le président d'ISER-Soft pourrait en faire partie, mais ce choix ne vous est pas proposé.

Question 5

Votre directeur technique vous demande de lui fournir un rapport décrivant la performance de votre projet et de le délivrer tous les premiers lundis du mois. Vous trouvez cette demande :

- ○ Irrecevable, beaucoup de lundis sont fériés dans les mois à venir
- ○ Trop gourmande en temps, vous essayez de négocier un rapport par trimestre
- ◉ Tout à fait normale, et vous préparez un modèle de tableau de bord pour le soumettre à votre directeur technique et son homologue
- ○ Tout à fait normale, vous réutiliserez un modèle de tableau de bord en provenance d'un précédent projet ou des exigences de votre directeur technique

Cette demande est tout à fait légitime, et il est toujours préférable de se mettre d'accord sur un modèle de tableau de bord plutôt qu'en utiliser un qui ne serait pas en ligne avec le projet.

Question 6

Vous croisez votre président directeur général au coin café, celui-ci vous félicite pour la manière dont vous gérez ce projet d'acquisition et vous confie de manière confidentielle sa volonté d'acquérir une autre société en Europe. Que devez-vous faire ?

- ○ Commencer à préparer une charte de projet pour cette nouvelle acquisition
- ◉ Mettre en place un processus de gestion des connaissances
- ○ Vous assurer que votre plan de projet peut s'adapter à toutes les acquisitions
- ○ Ce projet vous épuise, commencez à chercher du travail chez un concurrent

Ce projet pourrait être suivi d'un projet similaire, mais pas identique, cela n'existe pas. Vous avez tout intérêt à le diriger, et donc à capitaliser sur les connaissances acquises dans le projet en cours. Mettre en place un processus de collecte des connaissances est donc primordial.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite
