La première découpe du projet

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I - Un peu de vocabulaire **4**

A. Qu'est-ce qu'un livrable ? 4

B. Qu'est-ce qu'un Jalon ? 4

C. Qu'est-ce qu'une phase ? 5

D. Pourquoi découper un projet ? 5

II - Exercice : Quiz **6**

III - Description du périmètre du projet **7**

A. Comment recueillir les exigences du projet ? 7

B. Comment décrire le périmètre du projet ? 8

C. Introduction au découpage du projet 8

IV - Exercice : Quiz **9**

V - Découpage du projet **10**

A. Découpage en phase 10

B. Quel est le bon nombre de phases ? 10

C. Work Breakdown Structure (WBS) 10

D. Informations relatives aux lots de travaux 11

E. Quelles sont les règles de découpage de la WBS ? 12

F. Quand s'arrête le découpage de la WBS ? 12

G. En combien de niveaux faut-il découper une WBS ? 13

H. Ne pas confondre WBS et Planning 13

I. Découpage des lots de travaux en tâches 13

VI - Exercice : Quiz **15**

VII - Comment estimer les lots de travaux ou les tâches ? **17**

A. Rappel : l'estimation à dire d'expert 17

B. Rappel : l'estimation par analogie 17

C. Estimation ascendante 17

D. Estimation paramétrique 18

E. Estimations 3 points 18

VIII - Exercice : Quiz **19**

IX - Essentiel **21**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

X - Auto-évaluation **22**

A. Exercice 22

B. Test 22

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I Un peu de vocabulaire

Contexte

Vous avez bien souvent l'impression, au début d'un projet, de ne pas comprendre ses finalités. Vous trouvez que le projet est trop complexe, qu'il y a trop d'éléments, et vous ne comprenez pas ce qu'il faut faire pour le réaliser.

Avec un minimum d'expérience, vous verrez que l'adage « *diviser pour mieux régner* » s'applique parfaitement à la gestion de projet.

Introduction

Avant de rentrer dans le vif du sujet, prenons le temps de revoir ce qu'est un livrable et un jalon. Nous aurons ensuite besoin de comprendre les raisons qui nous forcent à découper un projet et ce qui se cache derrière le terme de phase qui représente le premier niveau de découpage ou décomposition d'un projet.

A. Qu'est-ce qu'un livrable ?

Si nous réalisons des projets, c'est pour délivrer un produit, un service ou un résultat qui apportera de la valeur à notre client. Cette « *finalité* » s'appelle un livrable.

La notion de livrable n'est, heureusement, pas limitée au produit final. Les réalisations intermédiaires, par exemple un prototype, un plan de communication ou un guide d'utilisation, sont aussi des livrables.

On parle souvent de livrable externe quand le livrable est destiné au client et de livrable interne quand il est destiné à l'équipe de projet ou à la gouvernance du projet.

Az Définition

Un livrable peut donc être défini par tout ou partie d'un produit, d'un service ou d'un résultat pouvant être délivré.

Exemple

Dans un projet de développement informatique, le plan de communication ou la mise en place de la plateforme de test sont des livrables internes, le produit informatique final est un livrable externe.

Dans un projet de construction de bâtiment, le gros œuvre, la toiture, les finitions et le bâtiment lui-même sont des livrables.

B. Qu'est-ce qu'un Jalon ?

Pour faciliter la planification du projet, son suivi et la communication de son avancement, le chef de projet associera un jalon à un livrable. Dans ce contexte, le jalon matérialise l'achèvement du livrable. D'une manière plus générale, le terme de jalon recouvre deux notions :

1. La fin d'une étape,
2. Un événement important et significatif pour le projet.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Une date est toujours associée à un jalon. C'est cette date qui permettra le suivi et la communication des progrès du projet. Un jalon ne représentant qu'un instant particulier, aucune tâche et aucune durée ne lui sont associées.

Exemple

Si l'on reprend l'exemple précédent, le produit ou le service délivré par le projet est un livrable, la date de fin de projet est un jalon.

Les jalons de fin de projet et de début de projet sont les plus importants. Les jalons intermédiaires sont, eux, à la discrétion du chef de projet et des parties prenantes.

Alors combien faut-il de jalons ?

Eh bien la réponse dépend du degré de contrôle désiré par le chef de projet et du degré de visibilité réclamé par les parties prenantes. Le bon nombre de jalons est celui qui permet de contrôler le projet et communiquer son avancement de manière efficace.

C. Qu'est-ce qu'une phase ?

Az Définition

Une phase dans un projet se définit par le regroupement de manière logique de plusieurs activités pour permettre l'achèvement d'un ou plusieurs livrables.

Les projets simples ne sont en général pas découpés en phase. Les projets compliqués ou très longs le sont.

Exemple

Dans les projets informatiques, nous parlerons, par exemple, de phase de définition des exigences, de planification du projet, de développement, de tests, et enfin de livraison au client.

D. Pourquoi découper un projet ?

Exemple

Mangeriez-vous une dinde ou un poulet sans le découper ?

À cette question saugrenue, tout le monde répondra non, bien sûr. Il semble logique de commencer par découper la volaille suivant un ordre logique, par exemple, découper les ailes, les pilons puis détacher les filets.

Eh bien un projet c'est la même chose. Si on ne le découpe pas, il devient très difficile de définir puis d'exécuter et contrôler le travail nécessaire à la production du livrable du projet.

De même que la compréhension de l'anatomie d'une volaille va nous aider dans son découpage, la connaissance du périmètre du projet est indispensable pour effectuer le découpage d'un projet.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

II Exercice : Quiz

Question 1

Les livrables sont uniquement destinés au client final.

- Vrai
- Faux

Question 2

Un jalon est un ensemble de tâches permettant de réaliser tout ou partie d'un produit.

- Vrai
- Faux

Question 3

Une phase est un regroupement de manière logique d'activités pour permettre l'achèvement d'un ou plusieurs livrables.

- Vrai
- Faux

Question 4

Il est important de découper un projet pour :

- Rendre complexe ce qui paraît simple
- Pouvoir mieux le définir, l'exécuter et le contrôler
- Se faire plaisir
- S'assurer que le projet sera un succès.

Question 5

Les projets simples ne sont pas découpés.

- Vrai
- Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

III Description du périmètre du projet

En langage de gestion de projet, l'expression « *périmètre du projet* » est souvent utilisée en remplacement de l'expression « *contenu du projet* ».

Le périmètre d'un projet est une description primordiale qui rentrera en jeu dans un grand nombre de processus de la gestion de projet. C'est le cas par exemple du découpage du projet, de l'établissement du planning ou du budget du projet.

La description du périmètre du projet passe par le recueil des exigences des parties prenantes.

A. Comment recueillir les exigences du projet ?

Az Définition

Ce processus consiste à recueillir et documenter les besoins et exigences des parties prenantes sur le produit du projet et sur le projet lui-même.

Pour recueillir les exigences, le chef de projet et son équipe devront communiquer, communiquer et encore communiquer. Cela se fera à l'aide de conversations, réunions, séances de travail, et si besoin, en utilisant des questionnaires.

Exemple

Dans un projet de développement d'une application web, il faudra par exemple collecter les exigences relatives aux :

- But de l'application,
- Interfaces utilisateur,
- Plateformes sur lesquelles l'application doit fonctionner, PC, tablettes et téléphones,
- Etc.

Le périmètre du projet étant plus large que le périmètre du produit, le chef de projet et son équipe devront aussi collecter les informations qui permettront de comprendre et définir :

- Les rapports de performance,
- Les jalons intermédiaires du projet,
- Les limitations de budget, etc.

Une fois les exigences comprises, le chef de projet pourra commencer la description du périmètre du projet.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

B. Comment décrire le périmètre du projet ?

Le chef de projet et son équipe vont établir une description détaillée du produit et du projet.

Ces informations seront consignées dans l'énoncé du périmètre du projet.

Ce document contiendra :

- Une description détaillée du produit,
- Une description des livrables du projet et de leurs critères d'acceptation,
- Les exclusions du projet,
- Les éventuelles contraintes et hypothèses.

La difficulté ne réside pas dans l'écriture de l'énoncé du périmètre, mais bien dans les arbitrages qu'il faudra faire. Ces arbitrages permettront à l'équipe de projet de faire des choix quand certaines exigences sont contradictoires ou impossibles à réaliser dans le cadre du projet.

Une fois l'énoncé du périmètre du projet terminé et accepté, le chef de projet et son équipe pourront passer au découpage aussi appelé décomposition du projet.

C. Introduction au découpage du projet

Le découpage commence souvent par la définition des phases qui couvriront le projet de son début jusqu'à la livraison du produit final. Les petits projets ont souvent une seule phase, les gros plusieurs. Ce découpage est ensuite poursuivi jusqu'à représenter l'ensemble du travail à effectuer.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

IV Exercice : Quiz

Question 1

Il existe 2 types d'exigences.

- Vrai
- Faux

Question 2

En général, un questionnaire est utilisé pour collecter les exigences des projets ayant très peu de parties prenantes.

- Faux
- Vrai

Question 3

Le périmètre du projet est inclus dans le périmètre du produit.

- Vrai
- Faux

Question 4

Pendant la phase de définition du périmètre, le chef du projet n'a pas à gérer de conflits.

- Vrai
- Faux

Question 5

Le découpage du projet adresse uniquement les parties du projet sous-traitées.

- Vrai
- Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

V Découpage du projet

A. Découpage en phase

Le chef de projet aura tendance à découper en plusieurs phases les projets longs ou compliqués. Ce découpage présente un double avantage.

1. D'une part, il augmente le niveau de contrôle en multipliant le nombre de phases,
2. D'autre part, il permet la prise de décision sur la continuation ou l'abandon du projet en fin de chaque phase. La réunion dans laquelle cette décision est prise s'appelle « *Porte de phase* ».

Quand les projets sont découpés en plusieurs phases, chaque phase porte un nom rappelant sa raison d'être.

Exemple

En gestion de projet, de manière générique, l'on trouvera des phases qui regroupent les notions d'initialisation du projet, d'organisation et préparation du projet, d'exécution du travail du projet et enfin de clôture du projet.

Dans le bâtiment, nous parlerons d'étude de faisabilité, d'obtention des autorisations, de conception détaillée du bâtiment, de planification de la construction, de sélection des entreprises, d'exécution du chantier et enfin de livraison du chantier.

B. Quel est le bon nombre de phases ?

Plusieurs phases permettent :

- De mieux gérer la complexité du projet et les risques du projet,
- De mieux estimer les ressources, les délais, les coûts,
- De mieux répartir dans le temps la consommation de ressources,
- De délivrer de la valeur plus rapidement si la livraison s'effectue en fin de phase,
- De s'adapter au calendrier financier de son client,
- De s'adapter au clivage ou aux percées que produiront l'introduction du produit sur le marché.

Alors en combien de phases faut-il découper son projet ?

Eh bien, il n'y a pas de règle absolue, cela dépendra avant tout du degré de contrôle voulu par le chef de projet, de la complexité et de la durée du projet.

Le découpage en phases étant insuffisant pour définir le travail à effectuer avec assez de détails, il sera complété par la création de la WBS ou Work Breakdown Structure.

C. Work Breakdown Structure (WBS)

Le terme anglais de Work Breakdown Structure ou WBS a remplacé les termes francisés de Structure de Découpage du Projet (SDP) ou Organigramme des Travaux du Projet (OTP).

La WBS est la décomposition du périmètre du projet pour définir l'ensemble du travail à effectuer. La WBS se présente sous la forme d'une arborescence dans laquelle le premier niveau représente le projet, le deuxième niveau les éventuelles phases du projet, le troisième niveau les livrables, le dernier niveau correspond aux lots de travaux.

Entre livrables et lots de travaux, le chef de projet pourra intercaler un ou plusieurs éléments qui lui serviront pour grouper des lots de travaux.


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Plus qu'un long discours, ce schéma représente une WBS possible pour la création d'un logiciel.

- En première ligne, nous trouvons le projet,
- Puis, les grandes phases du projet telles que le recueil des exigences ou la conception,
- Et enfin les lots de travaux.


Dans la gestion du projet, les réunions sont utilisées pour regrouper 3 lots de travaux, les réunions Clients, Équipe et Sponsor.

L'équipe de projet ne travaillera que sur les lots de travaux.

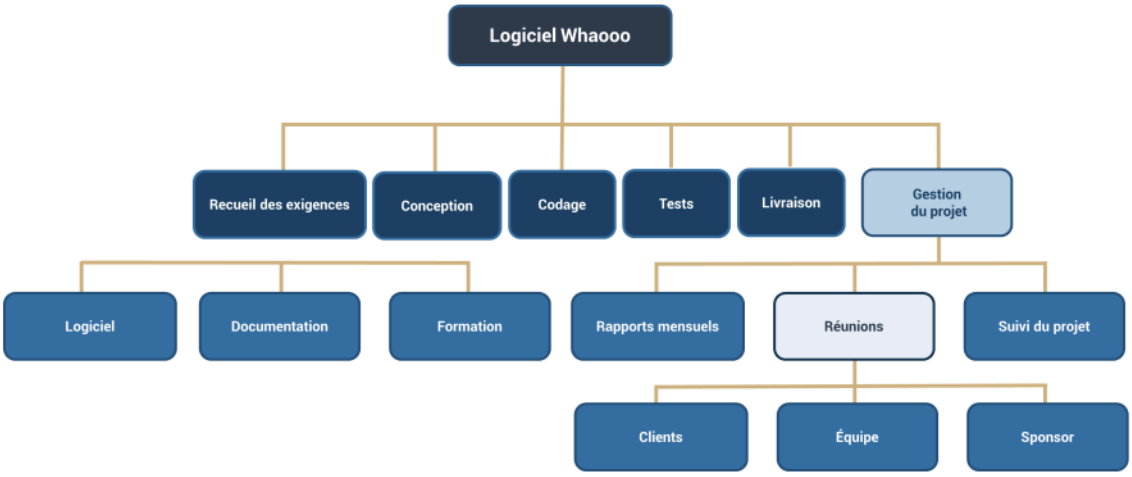

La numérotation des éléments de la WBS

Pour simplifier la lecture et la compréhension de la hiérarchie de la WBS, l'on associe une numérotation qui suit l'arborescence de la WBS. Cette numérotation est faite du haut vers le bas et pour chaque niveau de la gauche vers la droite.

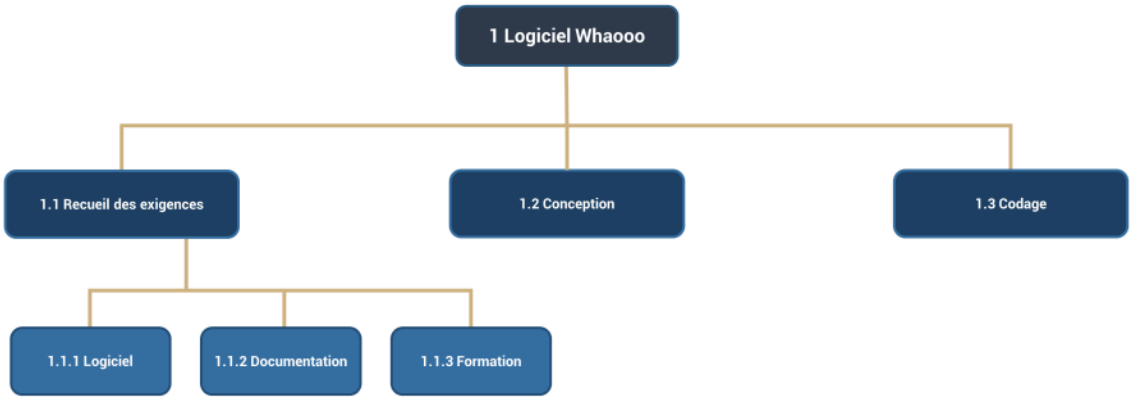

Le dictionnaire de la WBS

La WBS comme toute représentation graphique n'est pas très adaptée à l'ajout d'informations supplémentaires. Ces informations serviront par exemple à expliquer la phase de conception ou lister le nom du programmeur qui sera responsable de faire le codage du logiciel, quand cette ressource sera affectée.

Pour répondre à ce besoin, un fichier appelé Dictionnaire de WBS vient en complément de la WBS. Ce fichier reprendra l'ensemble des informations sur chaque élément de la WBS et en particulier les informations liées aux lots de travaux.

D. Informations relatives aux lots de travaux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Existe-t-il des règles de découpage ?

Les lots de travaux sont le dernier niveau de la WBS, ceux que l'équipe de projet ou les éventuels fournisseurs vont réaliser. Il est donc normal de les documenter de la façon la plus détaillée possible. Les chefs de projet renseignent les informations suivantes :

- Nom et description détaillée,
- Ce que doit produire le lot de travail (par exemple la liste des documents liés à la formation au logiciel),
- Le livrable auquel le lot de travail est rattaché,
- Les critères d'acceptation ou de validation,
- Les contraintes légales et métiers liés à la production du lot de travail.

Au fur et à mesure de l'avancée du projet, des informations supplémentaires seront renseignées. Ce sont par exemple :

- Les ressources utilisées pour le produire,
- La durée prévisionnelle du lot de travail. Cette donnée dépendra de la performance des ressources utilisées,
- Le coût prévisionnel du lot de travail. Le coût dépendra des ressources et des durées.

E. Quelles sont les règles de découpage de la WBS ?

Existe-t-il des règles de découpage ?

Existe-t-il des règles de découpage ?


Eh bien, pas vraiment. Le travail de découpage est avant tout affaire de logique et d'expérience. Les chefs de projet qui ont fait plusieurs projets similaires réutiliseront tout ou partie de la WBS d'un projet précédent.

Des modèles de découpage sont aussi disponibles, soit sur la toile, soit proposés par le service outils et méthodes de la société. Ces modèles sont, bien entendu, adaptés au métier dans lequel évolue le projet.

F. Quand s'arrête le découpage de la WBS ?

Quand s'arrête le découpage ?

Le découpage s'arrête quand le chef de projet et son équipe sont capables d'estimer les ressources, la durée et le coût du lot de travail. Dans l'exemple précédent, il est judicieux de continuer à découper les tests par exemple en établissement de la plateforme de test, collecte des données de test, réalisation des tests techniques et enfin validation du résultat des tests. L'équipe de projet pourra continuer cet exercice en découpant les tests techniques.

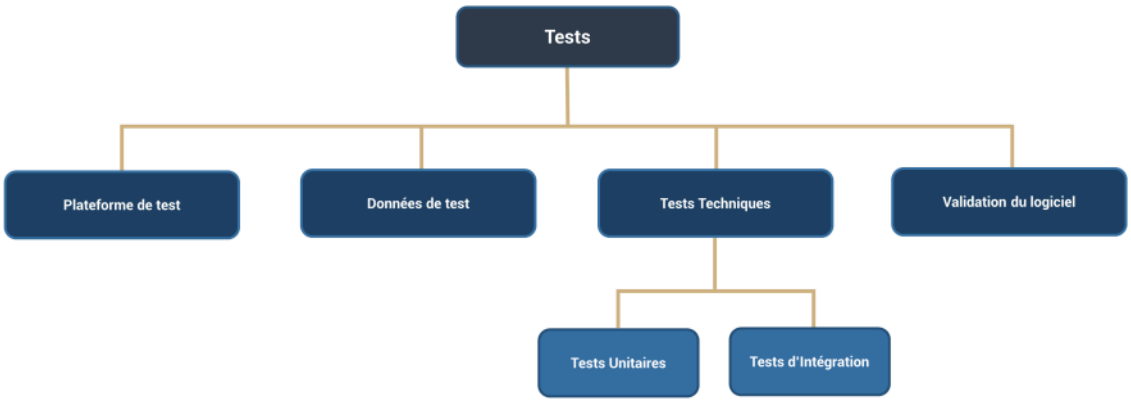

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

La logique de la sous-traitance

Le cas de la sous-traitance est un cas particulier. Si une partie de votre projet est sous-traitée, alors vous laisserez au sous-traitant le soin de découper cette partie.

G. En combien de niveaux faut-il découper une WBS ?

Existe-t-il un nombre de niveaux optimal dans une WBS ?

Ici encore, il n'y a pas de règle absolue. Cela dépendra avant tout du degré de contrôle voulu par le chef de projet et de la complexité du projet.

Dans le passé, les sociétés ont mis en place des règles sur la durée maximale ou sur le nombre maximal de ressources d'un lot de travail. Ces règles ont tendance à disparaître au profit du jugement du chef de projet et son équipe.

H. Ne pas confondre WBS et Planning


Il ne faut pas confondre la WBS et le planning. La WBS contient l'ensemble du travail à effectuer, et uniquement celui-ci. La WBS ne fournit pas d'information sur les dépendances ou l'ordre entre les lots de travaux. Ces informations d'ordre et de dépendances sont par contre au cœur de l'élaboration et la représentation du planning du projet.

Si l'ordre des lots de travaux paraît logique dans la plupart des WBS, c'est parce que l'esprit humain a tendance à classer et représenter les données dans un ordre logique, rien de plus.

Exemple

Dans l'exemple du découpage des tests, le graphique présentait les lots de travaux dans l'ordre : Plateforme de test, Données de tests, Tests techniques, Validation du logiciel.

Un graphique présentant les lots dans l'ordre Validation du logiciel, Données de tests, Tests techniques et Plateforme de test est tout à fait recevable.

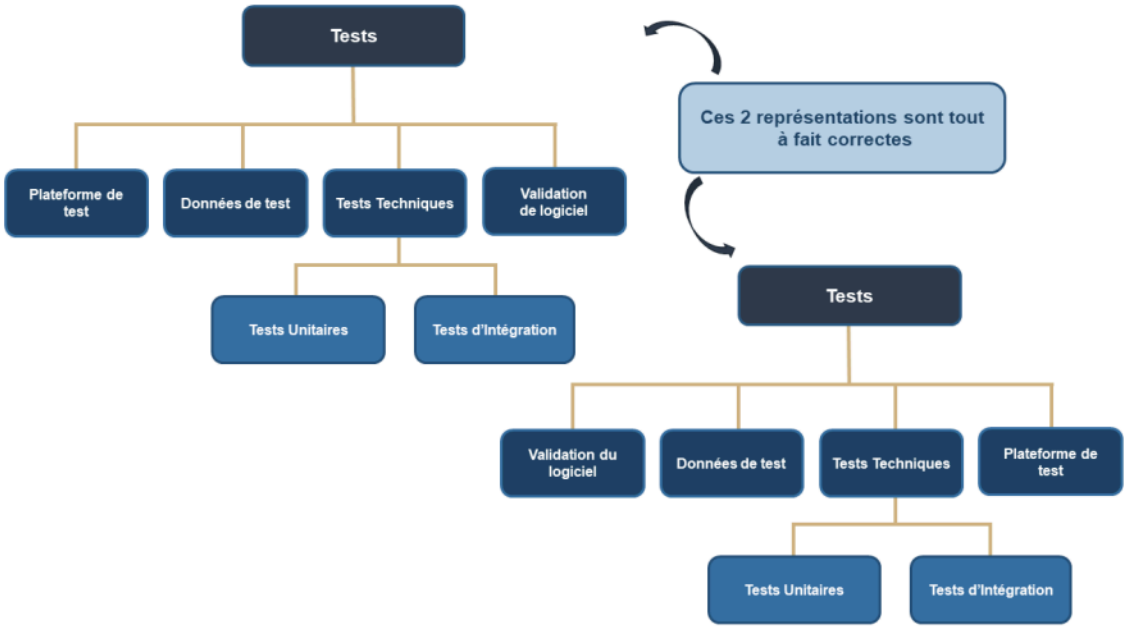

Pour l'établissement du planning, le découpage en lots de travaux ne suffit pas, il va falloir continuer ce découpage pour obtenir des tâches.

I. Découpage des lots de travaux en tâches

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Az Définition

Une tâche est un ensemble d'actions ou d'opérations élémentaires qui permettent la création du contenu d'un lot de travail. Le découpage en tâches se fait à partir du lot de travail.

Les tâches sont trop nombreuses pour être représentées dans la WBS, et seront documentées dans un document appelé la liste des tâches

Exemple

Le lot de travail Validation des tests contiendra par exemple les tâches suivantes :

- Définition du format du document de validation,
- Consignation du résultat des tests par le responsable des tests,
- Réunion de validation,
- Signature et communication du document de validation par le chef de projet.

Conseil

Il est important que le découpage du lot de travail en tâches soit réalisé par le membre de l'équipe de projet qui sera responsable d'effectuer le lot de travail. En effet, celui-ci a ses propres techniques, méthodes et sa propre vision de comment faire le travail.

Si le responsable du lot de travail est un junior, alors le chef de projet pourra lui apporter aide et coaching, tout en lui laissant assez de liberté pour éviter de tomber dans le piège du micro management.

La liste des tâches servira :

- À faire les estimations les plus détaillées des ressources, des durées et des coûts du projet,
- À établir le planning et le budget du projet.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

VI Exercice : Quiz

Question 1

Découper un projet en plusieurs phases permet de prendre la décision de continuer ou d'arrêter le projet à la fin de chaque phase.

- Vrai
- Faux

Question 2

L'idéal est de découper un projet en 3 phases.

- Vrai
- Faux

Question 3

Pour créer la Work Breakdown Structure, le chef de projet va regrouper les données du périmètre.

- Vrai
- Faux

Question 4

Les détails de chaque élément de la WBS sont inscrits dans la WBS.

- Vrai
- Faux

Question 5

Pour décrire sa WBS, le chef de projet va découper les lots de travaux.

- Vrai
- Faux

Question 6

Le découpage du périmètre s'arrête quand l'équipe de projet est en mesure d'estimer la durée et le coût de chaque lot de travail.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Vrai

Faux

Question 7

WBS et planning représentent la même chose.

Vrai

Faux

Question 8

Le découpage en tâches permettra ?

De créer la WBS

De faire une estimation « *fine* » des ressources, durées et coûts

De définir les livrables

De définir les phases

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

VII Comment estimer les lots de travaux ou les tâches ?

Le chef de projet a le choix entre 5 grandes méthodes d'estimation des délais ou des coûts d'un lot de travail ou d'une tâche.

Comme pour l'estimation des ressources, le chef de projet peut utiliser les méthodes d'estimation à dire d'expert et les méthodes d'estimations analogiques.

Si le chef de projet juge que les méthodes à dire d'expert ou analogiques ne sont pas assez adaptées à son projet, il pourra utiliser des méthodes plus détaillées comme les estimations ascendantes, les estimations paramétriques, et enfin les estimations 3 points.

A. Rappel : l'estimation à dire d'expert

Jugement d'expert

Rappel

Si le chef de projet est très expérimenté et s'il a déjà travaillé sur des projets similaires, il estimera les durées et coûts par rapport à son propre jugement. Si besoin, le chef de projet se fera aider par des experts dans ou en dehors de l'entreprise.

B. Rappel : l'estimation par analogie

Rappel

L'estimation par analogie se base sur les estimations de projets antérieurs et similaires pour estimer la durée et le coût du projet.

C. Estimation ascendante

Az Définition

L'estimation ascendante est basée sur l'analyse des durées et des coûts des tâches. Les durées ou les coûts sont ensuite regroupés pour calculer la durée ou le coût du lot de travail puis du livrable, puis du projet.

Exemple

Par exemple, un programme informatique pourra être découpé en 5 sous-programmes. Le chef de projet estimera que chaque sous-programme nécessitera 1 programmeur pendant 1 mois. Dans l'hypothèse d'un développement en parallèle des sous-programmes suivi d'une phase de consolidation d'1 mois par un analyste, le programme dans son ensemble durera 2 mois, nécessitera 1 chef de projet pendant 2 mois, 5 programmeurs pendant 1 mois et 1 analyste pour la consolidation pendant 1 mois.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

D. Estimation paramétrique

L'estimation paramétrique se sert de données historiques pour calculer les durées ou les coûts par unité d'œuvre. À partir de ces données, des formules de calcul simples sont générées.

Exemple

Si les données historiques montrent qu'un programmeur pendant un mois est capable de développer une interface de 500 lignes de code, il faudra 1 programmeur pendant 4 mois pour développer une interface de 2 000 lignes de code.

Attention

Les formules de calcul doivent cependant pouvoir s'adapter au contexte et à la taille du projet, et tenir compte des variations de la performance de l'équipe liées au fur et à mesure de son apprentissage.

E. Estimations 3 points

Pour estimer la durée et les coûts, beaucoup de chefs de projets ont l'habitude d'utiliser des méthodes dites 3 points basées sur une estimation optimiste, une estimation pessimiste et entre les deux une estimation probable. Suivant la confiance du chef de projet dans les 3 estimations, il calculera :

- Soit une estimation dite triangulaire dans laquelle, la moyenne sera calculée en divisant la somme des 3 estimations par 3. Dans ce type d'estimation, le chef de projet considère que les 3 estimations sont réalistes,
- Soit une estimation dite Gaussienne dans laquelle l'estimation la plus probable sera jugée 4 fois plus réaliste que les 2 autres estimations. La moyenne sera alors calculée en divisant par 6, la somme constituée de l'évaluation pessimiste, plus l'évaluation optimiste plus 4 fois l'évaluation probable.

Exemple

Si les estimations de durée sont de 5 jours, 8 jours et 14 jours,

- L'estimation selon la formule triangulaire sera de (5 + 8 + 14) / 3 soit de 9 jours,
- L'estimation selon la formule Gaussienne sera de (5 + 4 x 8 + 14) / 6 soit 8,5 jours.

Complément

Le choix des méthodes d'estimation dépend du chef de projet, de la disponibilité de données fiables sur des projets antérieurs et des règles fixées par l'éventuelle équipe méthode de projet de l'entreprise.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

VIII Exercice : Quiz

Question 1

Il existe 4 méthodes différentes d'estimation.

- Vrai
- Faux

Question 2

La méthode d'estimation ascendante estime les tâches puis par regroupement les lots de travaux, et enfin, toujours par regroupement, la durée ou le coût des livrables et enfin du projet.

- Vrai
- Faux

Question 3

L'estimation par analogie est souvent perçue comme l'estimation la plus simple à mettre en œuvre.

- Vrai
- Faux

Question 4

Quelle est l'estimation triangulaire si 3 personnes estiment un lot de travail à 4 mois, 6 mois, 11 mois ?

- 6 mois
- 6,5 mois
- 7 mois
- Cette estimation est impossible à calculer

Question 5

Quelle est l'estimation Gaussienne si 3 personnes estiment un lot de travail à 4 mois, 6 mois, 11 mois , dont l'estimation probable est 6 mois ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

6 mois

6,5 mois

7 mois

Cette estimation est impossible à calculer

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

IX Essentiel

Vous savez maintenant comment collecter les exigences produit et les exigences projet des parties prenantes. Vous êtes prêt à découper le projet en phases, livrables, lots de travaux et tâches. Il reste maintenant à faire le planning et définir le budget de votre projet. Vous serez alors prêt à commencer à exécuter votre projet et à contrôler son avancement en prenant soin de rester aussi proche que possible du planning et du budget prévu.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

X Auto-évaluation

A. Exercice

Vous êtes chef de projet dans une entreprise de développement informatique de la région Grenobloise ISER-Soft. Le président-directeur général d'ISER-Soft, M. Dir, désire faire la transformation numérique d'ISER-Soft et vous en a confié le projet. Celui-ci consiste à mettre en place un des ERP les plus connus du marché et ainsi automatiser les 3 grands processus de l'entreprise : la gestion des clients, la gestion des fournisseurs et la gestion des produits. Ces trois processus sont d'une égale complexité. Bien qu'ayant carte blanche, les ressources disponibles ne vous permettent pas d'automatiser plus d'1 processus de l'entreprise à la fois. D'autre part le directeur de la sécurité, M. Sec exige de faire un test de sécurité complet de l'ERP avant de commencer à travailler sur les processus de l'entreprise.


L'architecte de solution d'ISER-Soft recommande pour chacun des 3 processus de l'entreprise de faire une maquette ERP du processus, un test de cette maquette, puis un codage définitif.

Question 1

Quelle WBS pouvez-vous dessiner avec les données disponibles ?

Question 2

L'architecte de solution vous a aidé à produire la WBS suivante. Que faites-vous après ?

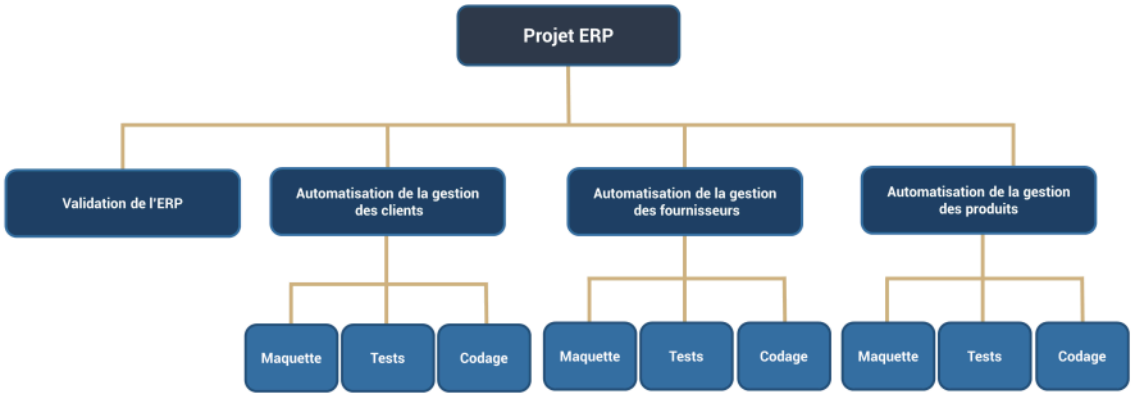

B. Test

Vous êtes chef de projet dans une entreprise de développement informatique de la région Grenobloise ISER-Soft. Le président-directeur général d'ISER-Soft, M. Dir, désire faire la transformation numérique d'ISER-Soft et vous en a confié le projet. Celui-ci consiste à mettre en place un des ERP les plus connus du marché et ainsi automatiser les 3 grands processus de l'entreprise : la gestion des clients, la gestion des fournisseurs et la gestion des produits. Ces trois processus sont d'une égale complexité. Bien qu'ayant carte blanche, les ressources disponibles ne vous permettent pas d'automatiser plus d'1 processus de l'entreprise à la fois. D'autre part le directeur de la sécurité, M. Sec exige de faire un test de sécurité complet de l'ERP avant de commencer à travailler sur les processus de l'entreprise.

L'architecte de solution d'ISER-Soft recommande pour chacun des 3 processus de l'entreprise de faire une maquette ERP du processus, un test de cette maquette, puis un codage définitif.

Exercice 1 : Quiz

Question 1

En combien de phases découperez-vous votre projet ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

1 phase

2 phases

3 phases

4 phases

Question 2

Comment s'appelle la réunion qui permettra de valider la sécurité de l'ERP et ensuite de commencer à travailler sur le premier processus à automatiser ?

La réunion de sécurité

L'entrée de phase

La porte de phase

La sortie de phase

Question 3

Dans le contexte de la mise en place de l'ERP, le processus final d'achat de l'ERP est finalisé après la porte de phase de la première phase.

Vrai

Faux

Question 4

Le découpage en 4 phases vous évite de créer une Work Breakdown Structure (WBS).

Vrai

Faux

Question 5

Votre directeur vous rappelle qu'il est obligatoire de créer une WBS ; quelle méthode allez-vous employer ?

Vous découpez chaque phase en 1 ou plusieurs lots de travaux

Vous découpez chaque phase en plusieurs tâches puis en livrables

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Vous découpez chaque phase en livrables puis en tâches

Vous découpez chaque phase en 1 ou plusieurs livrables puis chaque livrable en 1 ou plusieurs lots de travaux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite
