L'utilité du suivi de la performance

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Contexte **3**

II. Mieux comprendre le concept de performance **3**

A. Appréhender la notion de performance 3

B. Les performances 5

C. Exercice : Quiz 6

III. Connaître les enjeux de la performance de l'équipe projet **6**

A. Le projet, un travail d'équipe 6

B. Démonstration guidée 7

C. Exercice : Quiz 7

IV. Identifier l'importance du suivi et du reporting **7**

A. Le suivi des performances et le reporting 7

B. Les outils de suivi et de reporting d'un projet 9

C. Exercice : Quiz 10

V. L'essentiel **10**

VI. Auto-évaluation **11**

A. Exercice 11

B. Test 11

Solutions des exercices **13**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Contexte

Contexte

Dans notre société ultra-compétitive, la notion de performance est désormais au cœur des préoccupations des entreprises comme des managers d'équipes.

Ce cours vous propose d'appréhender ce qu'est la performance au niveau de l'entreprise, de l'équipe et du collaborateur.

Au centre des activités des entreprises, et en particulier dès qu'il s'agit d'innovation, le mode projet devient un incontournable. Il faudra alors pouvoir déterminer et suivre les performances du projet, intimement liées à la performance de l'équipe qui le mène.

Enfin, nous verrons comment le pilotage de la performance se base sur un reporting efficace permettant de collecter les informations utiles à la décision.

II. Mieux comprendre le concept de performance

A. Appréhender la notion de performance

Étymologiquement, la performance renvoie simplement à la notion de réalisation : le vieux français « *performer* » signifiant « *exécuter* ». La performance est liée à une idée de résultat. Aujourd'hui, plusieurs définitions coexistent et dépendent largement du contexte.

Par exemple, un sportif de haut niveau peut réaliser une « *belle performance* » lors d'une compétition. On entend ici un résultat, associé à un classement permettant une comparaison entre les compétiteurs.

La performance énergétique des bâtiments permet d'évaluer, sur la base de plusieurs indicateurs, la consommation d'énergie liée au fonctionnement normal d'une construction. Là encore, ces mesures permettent de définir un classement (de A pour les plus « *performants* » à G pour les plus médiocres).

La performance d'une entreprise sera généralement liée à ses résultats économiques, alors que dans un projet on parlera de performance pour déterminer l'atteinte des objectifs définis en début de projet.

Définition


La performance est une notion essentielle dans toute activité, qui permet d'évaluer le rapport entre des résultats attendus et une réalité que l'on doit pouvoir mesurer. On relie donc la performance à un « *niveau de réalisation des objectifs* ». Bien évidemment, le monde de l'entreprise en général (et des projets en particulier) est très attaché à la mesure et au suivi de la performance.

Méthode

En 1980, Patrick GILBERT, professeur en sciences de gestion à l'IAE de Paris (université Paris-I Panthéon-Sorbonne) formalise la performance par un triangle dont les 3 sommets sont :

- Les **objectifs** à atteindre (définis par la stratégie de l'entreprise ou les documents de description d'un projet),
- Les **moyens** mobilisés (par exemple, les matières premières ou les ressources humaines nécessaires),
- Les **résultats** attendus (une organisation, un bien, un service, etc. ou le résultat d'un projet).

La performance est issue des relations entre ces 3 sommets. On pourra l'évaluer objectivement sur les 3 axes reliant chaque sommet : la pertinence, l'efficience et l'efficacité. La pertinence, c'est évaluer si les moyens mis à disposition sont bien adaptés aux objectifs du projet.

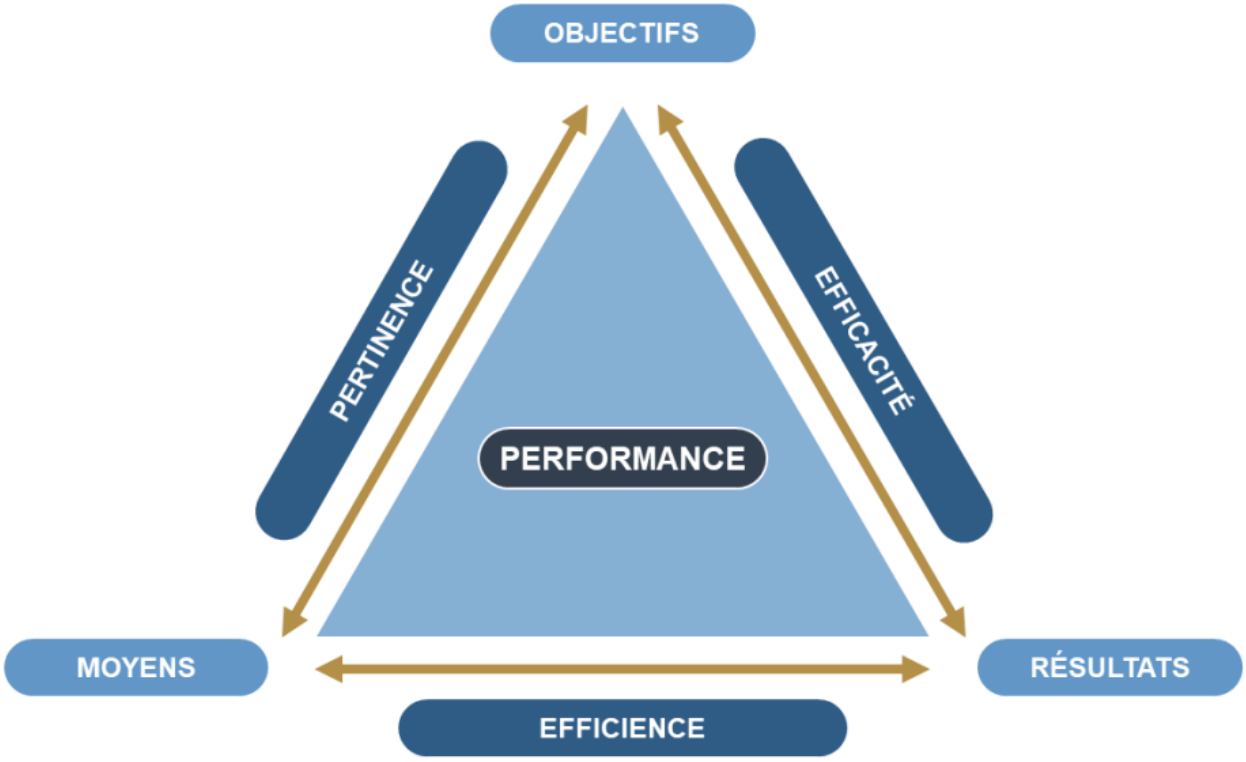

Exemple

Si je souhaite terminer un marathon, je devrais avoir une bonne condition physique, une tenue et des chaussures de course, etc. Et bien entendu, un entraînement adapté. De la même façon, dans un projet, je m'assurerai d'avoir les bonnes compétences et le temps nécessaire à la réalisation du projet. Il sera par exemple compliqué de réaliser une application mobile complexe sans aucun développeur. L'efficience correspond à la relation entre l'utilisation des moyens mis à disposition et le résultat obtenu. Comment les moyens mis en œuvre me permettent-ils d'atteindre mon objectif ?

L'efficience est pour simplifier le rapport entre l'effort produit et le résultat obtenu. Dans une équipe projet, tout le monde ne va pas parvenir au même résultat à la même vitesse ou avec le même niveau d'effort. Des critères externes peuvent également influer sur l'efficience, par exemple l'organisation du projet. Peut-être avez-vous déjà ressenti que de trop nombreuses réunions venaient parasiter votre capacité de production, à tel point que vous deviez travailler plus pour atteindre vos objectifs ? Dans ce cas, l'efficience de l'équipe est dégradée. De même, si je souhaite fabriquer un produit, des technologies ou modes de fabrication adaptés me permettront d'optimiser la quantité de matières premières utilisées, améliorant ainsi l'efficience du cycle de production.

Enfin, l'efficacité témoigne de la relation entre les résultats obtenus et l'atteinte (ou non) des objectifs initiaux. Ainsi, une organisation peut être efficace sans être efficiente. L'inverse est possible aussi, mais c'est beaucoup plus rare.

Si Nathalie, graphiste, passe beaucoup de temps à produire ses illustrations et doit se contenter de petites nuits, mais qu'elle fournit le travail attendu dans les temps, elle sera efficace. L'objectif sera atteint. En revanche, si Georges parvient au même résultat tout en prenant le temps de profiter de ses soirées devant Netflix, non seulement il sera efficace, mais en plus il sera efficient ! Moins d'efforts, pour le même résultat.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

B. Les performances

Performance d'entreprise

La performance peut se définir à différents niveaux de l'entreprise. À chacun de ces niveaux, elle aura des caractéristiques particulières et relèvera d'enjeux spécifiques.

Évoquons tout d'abord la performance de l'entreprise. Dans la plupart des cas, lorsqu'on parle d'une entreprise performante, on évoque sa capacité à générer de la valeur. Ainsi, souvent, la performance d'une entreprise est vue comme sa capacité à obtenir de bons résultats financiers et à développer sa croissance. La mise en place de stratégies d'entreprise lui permettra de mettre en œuvre les actions (et donc les moyens) nécessaires pour atteindre ses objectifs à moyen ou long terme. Toutefois, aujourd'hui, la performance d'une entreprise ne s'évalue plus seulement à ses résultats financiers. Ses impacts environnementaux et sur la société en général sont également à prendre en compte. Ainsi, la mise en place de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) a ancré de nouveaux critères à prendre en compte dans la définition de la performance d'une entreprise. Elle vise à inciter les entreprises à respecter des critères de développement durable, qu'il s'agisse des aspects sociaux, environnementaux ou économiques de ce développement. En France, les lois NRE (Nouvelles Régulations Économiques) ont contraint les entreprises à rendre publiques leurs performances en termes de développement durable.

Performance d'équipe

Évoquons à présent la performance d'équipe.

Une entreprise ne fonctionnera pas sans collaborateurs. Et dans la plupart des organisations, l'activité est organisée sous forme d'équipes différentes qui contribuent à la réalisation d'objectifs communs, issus des plans d'action définis pour atteindre les objectifs stratégiques de l'entreprise. Ces équipes peuvent prendre la forme d'une division ou d'un service de l'entreprise (ventes, fidélisation, communication, IT, etc.), d'une équipe de production (vendeurs, développeurs, créatifs, etc.), d'une entité géographique (comme un bureau local, une implantation pour une enseigne, etc.) ou même d'une équipe interdisciplinaire constituée pour mener un projet spécifique. La performance de l'équipe pourra s'évaluer sur sa capacité à atteindre les objectifs qui lui sont fixés. Ces objectifs sont partagés par tous les membres de l'équipe.

Dans une boutique de vêtements appartenant à un réseau national, par exemple, l'équipe d'un point de vente en particulier peut se voir affecter des objectifs en termes de ventes (chiffre d'affaires), de vente de produits complémentaires (retouches, produits d'entretien, etc., en proportion du chiffre d'affaires global), mais aussi en lien avec la satisfaction client, le nombre de nouvelles cartes de fidélité délivrées, etc. C'est sur l'ensemble de ces objectifs que la performance de l'équipe sera évaluée. Chaque collaborateur, par ses actions individuelles, contribue à la performance collective.

Notons, depuis plusieurs années, le développement du télétravail sur certains métiers, tertiaires notamment. La crise sanitaire de 2019 a bien sûr accéléré la mise en place du télétravail (ou l'a renforcée au sein des entreprises qui le pratiquaient déjà). Sans compter les évolutions qui se font sentir dans les attentes qu'ont les salariés vis-à-vis du monde professionnel, la recherche d'un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle notamment. Cela vient impacter le management qui doit alors se poser la question de la mesure de la performance en distanciel !

Performance individuelle

Quid de la performance individuelle ? Ici encore, la performance sera intrinsèquement liée à la définition d'objectifs par le manager et à la capacité du collaborateur à les atteindre. Mais attention, la performance individuelle ne pourra s'évaluer que sur des critères liés aux fonctions du collaborateur dans l'entreprise. Ces critères peuvent concerner à la fois la réalisation des tâches affectées et ses comportements. L'évaluation des performances ne pourra pas être jugée que sur un seul des 3 axes du triangle de la performance. Ainsi, on veillera à ce que les objectifs soient clairement définis et bien compris (premier sommet du triangle), les moyens nécessaires (second sommet) soient mis à disposition et correctement utilisés pour que le résultat attendu (troisième sommet) soit bien réalisé.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

C. Exercice : Quiz

[solution n°1 p.15]

Question 1

La performance est une notion fortement liée…

- ☐ À la définition de la stratégie d'une entreprise
- ☐ À un niveau de réalisation des objectifs
- ☐ Au rapport entre les résultats attendus et la réalité

Question 2

La performance a été schématisée par Gilbert en 1980 comme une relation entre :

- ○ Objectifs, moyens et résultats
- ○ Objectifs, efficacité, pertinence
- ○ Efficacité, moyens et résultats

Question 3

Qu'est-ce que l'efficacité ?

- ○ La relation entre les moyens et les résultats
- ○ La relation entre les objectifs et les moyens
- ○ La relation entre les objectifs et les résultats

Question 4

La performance d'une entreprise s'évalue uniquement sur sa capacité à générer de la valeur.

- ○ Faux
- ○ Vrai

Question 5

Cette forme de performance s'évalue à la fois sur des critères de réalisation des tâches et de comportement. Il s'agit de :

- ○ La performance d'entreprise
- ○ La performance d'équipe
- ○ La performance individuelle

III. Connaître les enjeux de la performance de l'équipe projet

A. Le projet, un travail d'équipe

La performance se place à tous les niveaux de l'entreprise. Le mode de fonctionnement de la plupart des sociétés aujourd'hui s'organise autour de projets : projets de développement commercial, d'innovation, d'organisation, de production, etc. L'avantage du mode projet ? Il offre plus de flexibilité qu'une organisation classique, hiérarchique. Mais il permet aussi de responsabiliser et d'engager davantage les équipes. La mission est claire, la feuille de route permettant d'être focus sur un livrable à produire, un objectif à atteindre.

Tout projet s'intègre dans une stratégie d'entreprise plus globale. Il vise toujours l'atteinte d'objectifs précis et définis. La mise à disposition de l'équipe constitue souvent l'essentiel des moyens mobilisés, et la livraison finale constituera le résultat attendu du projet. En cela, n'importe quel projet s'intègre parfaitement dans le triangle de la

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

performance. Le mode projet se rencontre dans tous les secteurs et revêt une forme similaire : on trouve un responsable de projet (parfois officiellement « *chef de projet* », mais pas toujours) qui forme (ou à qui on attribue) une équipe multidisciplinaire chargée de parvenir à un résultat. Et c'est la performance de l'équipe, c'est-à-dire sa capacité à atteindre ses objectifs de production et de pilotage, qui conditionnera souvent le succès du projet.

B. Démonstration guidée

C. Exercice : Quiz

[solution n°2 p.16]

Question 1

Dans un projet mené au sein d'une entreprise, la mise à disposition d'une équipe constitue souvent…

- ○ La performance
- ○ L'objectif
- ○ Les moyens

Question 2

Quelle est la nature des objectifs attribués à une équipe projet ?

- ○ Des objectifs stratégiques
- ○ Des objectifs opérationnels

Question 3

Lors de la mesure de la performance de l'équipe, on évaluera sa capacité à produire le résultat du projet tel qu'il aura été défini en amont. De quel objectif opérationnel s'agit-il ?

- ○ Le respect des délais
- ○ Le respect des coûts
- ○ Le respect de la qualité

IV. Identifier l'importance du suivi et du reporting

A. Le suivi des performances et le reporting

Complément **La « loi de Golub »**

« *Aucun grand projet n'est jamais mis en place dans les délais, dans les limites du budget, avec le même personnel qu'au départ… Et le projet ne fait pas ce qu'il était censé faire non plus… Il est fort improbable que le vôtre soit le premier !* » Loi de Golub #1

Cette loi fait partie d'un ensemble aux origines incertaines qui aurait été publié sous forme de trait d'humour dans la revue Data Management dans les années 70. Elle n'en est pas moins vraie : un projet est toujours soumis aux imprévus, et il y a peu de chance que tout se déroule exactement « *comme sur le papier* ». Le mode projet implique la réalisation d'une planification prévisionnelle (au sens de faire un plan, pas uniquement un planning). Cette planification donnera lieu à une mesure fréquente des écarts entre le plan et la réalisation, qui à son tour permettra de mettre en œuvre les actions correctives nécessaires pour maintenir le cap. L'évolution du projet peut ainsi être suivie à tous les niveaux de décision. Vous le comprendrez, on ne peut pas se contenter d'évaluer les écarts entre prévisionnel et réalisé seulement à la fin du projet. L'évaluation doit être répétée et elle nécessite la mise en œuvre

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

d'un suivi régulier de la performance du projet. Le chef de projet suivra avec attention plusieurs indicateurs clés de performance en lien avec les 3 axes coût, qualité et délai. Ce suivi régulier de la performance permettra à l'équipe de planifier des actions correctives, d'agir plutôt que de réagir.

Exemple

Le projet d'***Elecktronik*** a évidemment donné lieu à un suivi des indicateurs liés à la réalisation du projet. Par exemple, nous avons relevé de façon hebdomadaire : le pourcentage d'avancement en nombre de fonctionnalités développées (qualité), le nombre de jours consommés (délai), la charge en nombre de jours d'expertises utilisés par rapport au volume total disponible (coût). On compare les valeurs relevées aux valeurs prévues dans le plan projet, mais aussi les incohérences des valeurs entre elles : 25 % des fonctionnalités développées alors que 40 % des jours d'expertises sont consommés témoignent clairement d'un problème.

Les écarts impliquent toujours un dysfonctionnement dans le déroulement du projet. Par exemple, dans ce projet, une surconsommation des ressources a révélé une difficulté technique imprévue liée à la connexion de l'application avec la gestion des stocks.

De même, un retard peut être lié à une validation qui tarde à venir ou à une démobilisation des équipes. C'est pourquoi l'identification des causes fait partie intégrante du suivi de la performance.

Définition

Le reporting, c'est le fait de rendre compte régulièrement à la direction, au travers d'indicateurs spécifiques, des performances d'une activité ou d'un projet.

L'équipe projet porte la responsabilité de la réalisation, mais, au niveau de l'entreprise, elle est rarement décisionnaire. L'équipe au sens large, et plus spécifiquement le chef de projet, a également la responsabilité de transmettre tous les éléments utiles à l'instance de direction afin que cette dernière ait les bonnes clés en main pour prendre des décisions éclairées. Donner ces informations de manière claire, lisible, et facilement compréhensible, c'est effectuer un reporting. Le reporting est une aide à la décision indispensable dans le pilotage d'une activité, quelle qu'elle soit.

Généralement, c'est à partir du tableau de bord réalisé par le manager que ce reporting est effectué, le tableau de bord présente une vue d'ensemble de l'activité ou du projet tout en permettant d'identifier les indicateurs incohérents avec les prédictions du plan. Sans reporting, il ne peut y avoir de prise de décision, et donc de pilotage.

Méthode

Le reporting devra se faire à tous les niveaux afin d'assurer un bon suivi des performances :

- Une division de l'entreprise présentera l'état de ses activités et de ses performances à sa direction générale afin de confirmer que les actions menées sont bien en accord avec la stratégie d'entreprise.
- Une équipe projet présentera ses performances quant à la réalisation du projet à sa direction afin que cette dernière puisse effectuer les arbitrages nécessaires pour que le projet aboutisse à une réalisation conforme aux objectifs.
- Chaque collaborateur rendra des comptes sur l'avancement de ses tâches au pilote du projet (ou à son manager) afin d'alimenter les indicateurs de performance de l'équipe.

Mais les performances de l'équipe ne peuvent pas reposer que sur les indicateurs projet. L'équipe est dépendante de chacun de ses membres et de ses performances individuelles.

En tant que manager, il sera de votre responsabilité d'appliquer le triangle de la performance à chaque collaborateur. Vous vous assurerez donc que ses objectifs individuels soient bien présentés et compris, que ses résultats (ou livrables) soient correctement identifiés et que le collaborateur dispose bien des moyens nécessaires

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

pour y parvenir. Le bien-être du collaborateur, ses besoins (d'accompagnement ou de formation par exemple) doivent également être pris en compte. D'autres indicateurs comme la météo d'équipe - où chaque collaborateur partage quotidiennement son état d'esprit - peuvent aussi être intégrés dans le suivi.

Exemple

Pour le projet ***Elecktronik***, comme pour tous les autres projets, un système de **reporting individuel** a été mis en place. Il se base sur plusieurs éléments :

- **Informel**, le **stand-up meeting** du matin, inspiré par les approches agiles, permet de faire collectivement et quotidiennement le point sur l'avancement, autour des 3 questions : qu'as-tu fait hier, que vas-tu faire aujourd'hui, quelles difficultés rencontres-tu ? La séquence ne dure jamais plus de 15 minutes.
- **Formel,** le **mail récapitulatif** de fin de journée, chaque ressource indiquant dans un mail (modèle transmis par le manager) l'ensemble des tâches accomplies et leur taux de complétion (pourcentage d'achèvement des tâches). Le format est ultra-synthétique et chaque collaborateur doit l'envoyer à son manager avant de quitter son poste.
- Dans un fonctionnement **multiprojets ou multiclients,** des **feuilles de temps** (***timesheets***) peuvent également être mises en place. Chaque collaborateur indique le volume de temps consacré à tel ou tel projet ou client. Cette indication peut être en heures ou en pourcentage de journée. Ces relevés, combinés, permettent - entre autres éléments d'analyse - de déterminer un *taux* de staffing, ou taux d'occupation, qui peut être pris en compte dans la mesure de la performance de l'équipe.
- **Transversal à l'activité,** une grille d'auto-évaluation, basée sur la feuille de route transmise à chaque collaborateur. Elle permet d'identifier (et de matérialiser) l'atteinte des objectifs individuels. Elle servira également de support aux entretiens d'évaluation (entre 2 et 4 par an selon l'organisation).

La collecte de l'ensemble de ces performances individuelles permettra :

- De constituer une vue agrégée de la performance de l'équipe,
- D'identifier les difficultés individuelles pouvant nuire à la performance globale de l'équipe.

Au niveau du collaborateur, comme à celui de l'équipe ou du projet, identifier rapidement les difficultés ou les variations par rapport au plan permettra de mettre en œuvre rapidement des actions correctives pour assurer la performance globale. Le reporting, même s'il est parfois perçu comme une tâche fastidieuse n'en est pas moins indispensable pour définir la performance.

B. Les outils de suivi et de reporting d'un projet

Méthode

Des outils sont disponibles pour assurer le suivi et le reporting d'un projet, notamment des outils digitaux et des solutions logicielles, des applications mobiles pour les versions nomades. Parmi les plus connus sur le marché, citons Trello et Kantree, tous deux inspirés de la méthode Kanban. Kanban signifie « *panneau* » ou « *tableau d'affichage* », c'est une méthode japonaise des années 1950, utilisée par les usines Toyota comme système de planification pour la fabrication à flux tendus. Visuellement, cela ressemble à un tableau sur lequel on viendrait coller des post-its dans des colonnes thématiques. En ce sens, le Kanban est un outil visuel qui permet, en un seul coup d'œil, d'appréhender les différentes étapes et la progression d'un projet. Trello est un outil gratuit pour la gestion de tâches, et qui fonctionne avec un système de tickets attribués aux diverses parties prenantes du projet. Tout comme Jira d'ailleurs. Les interfaces et les fonctionnalités diffèrent bien entendu d'un concepteur à un autre, et Trello met d'ailleurs en avant le côté ludique de la sienne. Quant à Kantree, c'est également un outil qui s'adresse aux équipes pour qu'elles puissent partager des tâches[1], gérer des projets[2] ou exécuter des workflows[3]. L'avantage de ces outils en ligne est qu'ils s'adaptent aux nouveaux modes de collaboration : ils

1 https://kantree.io/fr/solutions/collaboration-equipe
2 https://kantree.io/fr/solutions/gestion-de-projet
3 https://kantree.io/fr/solutions/gestion-de-processus

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

permettent une connexion depuis l'extérieur de l'entreprise (idéal pour les télétravailleurs ou les expatriés, par exemple). En revanche, il reste possible de revenir aux méthodes classiques « *papier crayon* » pour des projets gérés en interne, avec des équipes en 100 % présentiel.

Complément

Quelques liens pour retrouver ces outils :

- Trello | Atlassian[1]
- Jira| Logiciel de suivi des tickets et des projets (atlassian.com)[2]
- Kantree, la plateforme de gestion du travail vraiment flexible[3]

C. Exercice : Quiz

[solution n°3 p.16]

Question 1

Comment pouvez-vous organiser le suivi de la performance de façon pertinente ?

- O En mesurant les écarts entre le plan et la réalisation, régulièrement, tout au long du projet
- O En vérifiant les écarts à la fin du projet sur les indicateurs de coût, qualité et délai
- O En additionnant les performances individuelles

Question 2

Que permet le reporting dans le pilotage de la performance ?

- O Le reporting permet à la direction de transmettre ses consignes aux opérationnels
- O Le reporting, c'est le fait de construire un tableau de bord, il n'a rien à voir avec la prise de décision
- O Le reporting permet à la direction de prendre des décisions éclairées, sur la base d'indicateurs spécifiques et fiables

Question 3

À quel niveau se situe le reporting dans une organisation ?

- O Uniquement au niveau de la business unit (division) vis-à-vis de la direction générale
- O Entre le collaborateur et la direction générale de l'entreprise
- O Seulement au sein de l'équipe projet, quand il faut faire des arbitrages
- O Entre chaque strate de gouvernance de l'entreprise, du collaborateur au manager, de l'équipe à la direction, de la division à la direction générale

V. L'essentiel

Le mode projet semble aujourd'hui prédominer parmi les différents modes collaboratifs recensés en entreprise, et plus largement au sein des organisations. Qu'il s'agisse d'un projet « *cœur de métier* », en lien direct donc avec les enjeux du métier (marketing, commercial, RH ou autre), ou qu'il s'agisse d'un projet de réflexion relative à l'amélioration continue des pratiques, des process (transversal), on retrouve cette notion de projet. Et donc indirectement, de performance : la performance se mesure à différents niveaux, celui de l'entreprise, de l'équipe

1 https://www.atlassian.com/fr/software/trello
2 https://www.atlassian.com/fr/software/jira
3 https://kantree.io/fr

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

(qui conduit le projet) et celui de l'individu, du collaborateur. Mesurer la contribution, la réussite de ces diverses participations (et responsabilités) implique nécessairement de réaliser un reporting. Il s'en trouve facilité par l'émergence des nouveaux outils collaboratifs en ligne inspirés de la méthode Kanban pour la plupart.

VI. Auto-évaluation

A. Exercice

Vous **pilotez une équipe de commerciaux** au sein d'une chaîne d'agences immobilières. Votre direction générale a décidé d'une **nouvelle organisation des forces de vente** et vous a communiqué sous forme d'un petit guide les **30 nouvelles pratiques** que vous allez devoir mettre en place dans votre équipe.

Vous disposez d'un crédit de 8 heures par collaborateur pour les **former** aux nouveaux **process** et **outils** (y compris un nouveau logiciel de gestion des clients et prospects), afin qu'ils soient tous opérationnels dans un mois.

Question

[solution n°4 p.17]


Indiquez quel **reporting** vous allez mettre en place pour rendre des comptes à votre direction et comment vous allez **suivre les performances individuelles** de votre équipe dans le cadre de ce projet de transformation de l'organisation.

B. Test

Exercice 1

[solution n°5 p.18]

Associez les bons termes aux numéros indiqués sur le **triangle de la performance** ci-dessous :

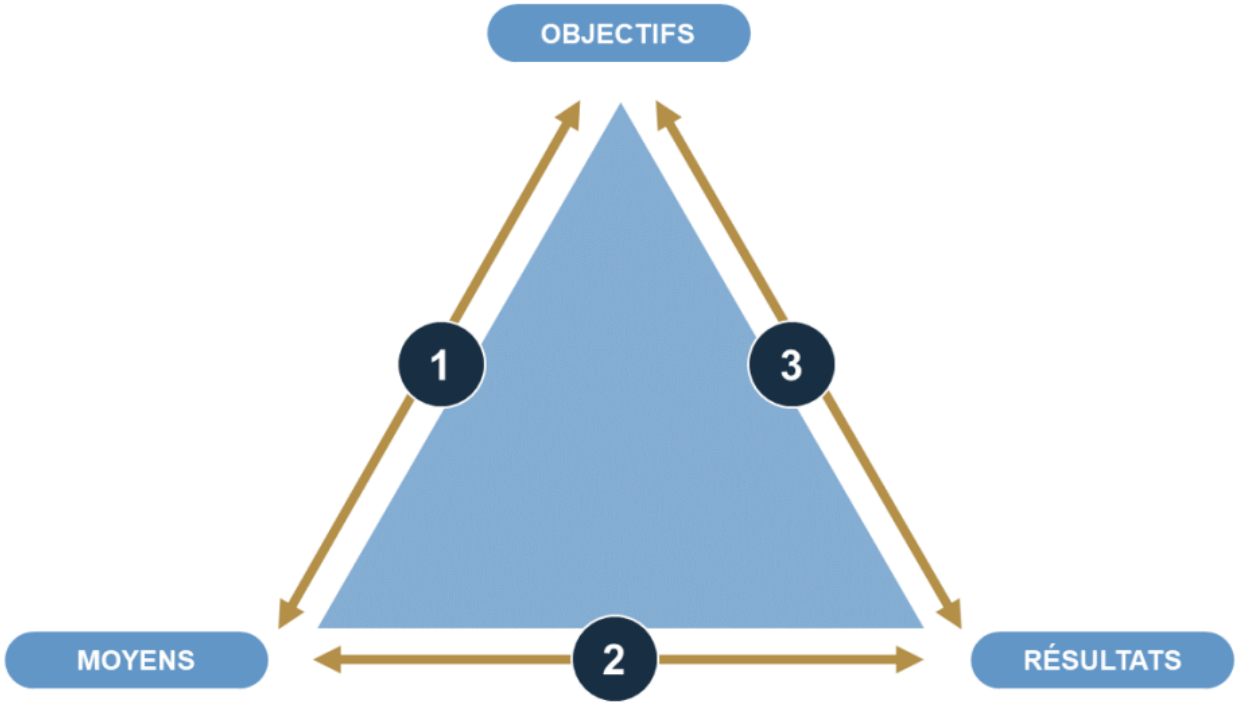

Efficience | Pertinence | Efficacité

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

1	2	3

Exercice 2 : Quiz

[solution n°6 p.18]

Question 1

Vous trouverez ci-dessous cinq affirmations. Selon vous, lesquelles permettent d'établir un niveau de performance ? (Plusieurs réponses possibles)

- ☐ Magalie s'entraîne chaque samedi avec un coach.
- ☐ L'appartement que je viens d'acheter a un score « *D* », d'après son étiquette énergétique
- ☐ Yohan est arrivé vingt-deuxième à son dernier 10 km
- ☐ L'entreprise dans laquelle je travaille a mis en place de nouveaux process pour gérer les projets
- ☐ Stéphanie a livré son projet dans les temps, mais elle a utilisé 10 jours de plus que prévu pour les développements techniques

Question 2

Parmi les propositions ci-dessous, identifiez celle qui est **exacte** ? (Une seule réponse juste)

- ○ La pertinence permet d'évaluer si les moyens permettent bien de parvenir aux résultats attendus
- ○ L'efficacité d'une équipe, c'est sa capacité à produire vite
- ○ L'efficience d'un processus de fabrication peut être améliorée grâce à une nouvelle technologie réduisant le temps de production, sans consommer plus de ressources
- ○ La performance, c'est la capacité d'une organisation à bien utiliser des ressources

Question 3

Parmi les propositions suivantes, lesquelles désignent des objectifs opérationnels ? (Plusieurs réponses possibles)

- ☐ Renforcer la crédibilité de l'entreprise
- ☐ Fabriquer le produit sans dépasser le volume de ressources attribué
- ☐ Livrer le site Web avant le 15 octobre afin d'être opérationnel pour les fêtes de fin d'année
- ☐ Gagner en notoriété sur un marché émergeant
- ☐ Augmenter de 5 % le chiffre d'affaire de l'organisation en deux mois

Question 4

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Identifier parmi les propositions suivantes celles qui représentent des outils de suivi de la performance de l'équipe ? (Plusieurs réponses possibles)

- ☐ Un process de recadrage des comportements déplacés.
- ☐ Un stand-up meeting quotidien.
- ☐ Un tableau de bord présentant le suivi des indicateurs CQD (Coût, Qualité, Délai).
- ☐ Un tableau magnétique pour suivre la météo d'équipe.

Question 5

Quels outils de suivi sont aujourd'hui mis à la disposition des chefs de projet ?

- ☐ Méthode Kanban
- ☐ Plateformes collaboratives en ligne
- ☐ Métaplan

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 6 **Solution n°1**

Question 1

La performance est une notion fortement liée…

- ☐ À la définition de la stratégie d'une entreprise
- ☑ À un niveau de réalisation des objectifs
- ☑ Au rapport entre les résultats attendus et la réalité

La performance est une notion essentielle dans toute activité qui permet d'évaluer le rapport entre des résultats attendus et une réalité que l'on doit pouvoir mesurer. On relie donc la performance à un « *niveau de réalisation des objectifs* ». C'est pour cela que la mesure et le suivi de la performance sont essentiels dans le pilotage d'une activité.

Question 2

La performance a été schématisée par Gilbert en 1980 comme une relation entre :

- ◉ Objectifs, moyens et résultats
- ○ Objectifs, efficacité, pertinence
- ○ Efficacité, moyens et résultats

La performance est issue des relations entre les **objectifs** (définis par la stratégie de l'entreprise), les **moyens** mobilisés pour les atteindre et les **résultats** attendus. On la mesure sur les 3 axes reliant chacun de ces sommets : la pertinence, l'efficience et l'efficacité.

Question 3

Qu'est-ce que l'efficacité ?

- ○ La relation entre les moyens et les résultats
- ○ La relation entre les objectifs et les moyens
- ◉ La relation entre les objectifs et les résultats

L'efficacité témoigne de la relation entre les **résultats** obtenus et l'atteinte (ou non) des **objectifs** initiaux. La relation entre les moyens et les résultats obtenus correspond à l'efficience ; les objectifs et les moyens déterminent la pertinence.

Question 4

La performance d'une entreprise s'évalue uniquement sur sa capacité à générer de la valeur.

- ◉ Faux
- ○ Vrai

Aujourd'hui, la performance d'une entreprise ne s'évalue plus seulement à ses résultats financiers. Ses impacts environnementaux et sur la société en général sont également à prendre en compte.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 5

Cette forme de performance s'évalue à la fois sur des critères de réalisation des tâches et de comportement. Il s'agit de :

- ○ La performance d'entreprise
- ○ La performance d'équipe
- ◉ La performance individuelle

La performance individuelle est liée à la définition d'objectifs par le manager et à la capacité du collaborateur à les atteindre. On l'évalue sur des critères liés aux fonctions du collaborateur dans l'entreprise. Ces critères peuvent concerner à la fois la réalisation des tâches affectées et ses comportements.

Exercice p. 7 **Solution n°2**

Question 1

Dans un projet mené au sein d'une entreprise, la mise à disposition d'une équipe constitue souvent…

- ○ La performance
- ○ L'objectif
- ◉ Les moyens

Un projet s'intègre dans une stratégie d'entreprise et vise toujours l'atteinte d'objectifs précis et définis. La mise à disposition de l'équipe constitue souvent l'essentiel des moyens mobilisés, et la livraison finale constituera le résultat attendu du projet. C'est la capacité de l'équipe à atteindre ses objectifs de production et de pilotage, c'est-à-dire sa performance, qui conditionnera souvent le succès du projet.

Question 2

Quelle est la nature des objectifs attribués à une équipe projet ?

- ○ Des objectifs stratégiques
- ◉ Des objectifs opérationnels

Le projet, c'est-à-dire l'ensemble des efforts de l'équipe projet, conduira à une réalisation. Cette réalisation vise à atteindre des objectifs stratégiques définis au niveau de l'entreprise.

L'équipe projet, elle, se voit confier des objectifs opérationnels, afin de garantir la réalisation du résultat du projet. C'est cette capacité à satisfaire ces objectifs opérationnels qui conditionnera la performance de l'équipe.

Question 3

Lors de la mesure de la performance de l'équipe, on évaluera sa capacité à produire le résultat du projet tel qu'il aura été défini en amont. De quel objectif opérationnel s'agit-il ?

- ○ Le respect des délais
- ○ Le respect des coûts
- ◉ Le respect de la qualité

La capacité à produire conformément à la description du résultat attendu correspond à l'axe qualité.

Exercice p. 10 **Solution n°3**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 1

Comment pouvez-vous organiser le suivi de la performance de façon pertinente ?

- ◉ En mesurant les écarts entre le plan et la réalisation, régulièrement, tout au long du projet
- ○ En vérifiant les écarts à la fin du projet sur les indicateurs de coût, qualité et délai
- ○ En additionnant les performances individuelles

On ne peut pas se contenter de mesurer les écarts seulement en fin de projet. Ce serait trop tard pour mettre en place des actions correctives. On suivra régulièrement la performance de l'équipe projet et mesurant les écarts éventuels de coût, qualité et délai de façon répétée, tout au long du projet.

Question 2

Que permet le reporting dans le pilotage de la performance ?

- ○ Le reporting permet à la direction de transmettre ses consignes aux opérationnels
- ○ Le reporting, c'est le fait de construire un tableau de bord, il n'a rien à voir avec la prise de décision
- ◉ Le reporting permet à la direction de prendre des décisions éclairées, sur la base d'indicateurs spécifiques et fiables

Le reporting permet de présenter à la direction, au travers d'indicateurs spécifiques, les performances d'une activité ou d'un projet. C'est un outil d'aide à la décision indispensable pour piloter une activité ou un projet.

Question 3

À quel niveau se situe le reporting dans une organisation ?

- ○ Uniquement au niveau de la business unit (division) vis-à-vis de la direction générale
- ○ Entre le collaborateur et la direction générale de l'entreprise
- ○ Seulement au sein de l'équipe projet, quand il faut faire des arbitrages
- ◉ Entre chaque strate de gouvernance de l'entreprise, du collaborateur au manager, de l'équipe à la direction, de la division à la direction générale

Le reporting doit se faire à tous les niveaux de l'entreprise. Il vise à transmettre les informations relatives à la performance pour ajuster les trajectoires et aider à la prise de décision. Le reporting a lieu entre chaque strate de l'organisation, des plus opérationnelles aux plus stratégiques.

p. 11 Solution n°4

- Le projet de transformation de l'organisation doit satisfaire ses objectifs sur les axes **coût, qualité** et **délai**.

  En termes de **qualité**, il conviendra par exemple de suivre le **nombre de nouveaux process** effectivement mis en place au sein de l'équipe.

  Les **coûts** sont liés à la mobilisation des commerciaux pour les moments de formation. C'est le **temps affecté à cette formation** qui sera comptabilisé.

  Les **délais** sont imposés par les objectifs : 1 mois est accordé pour effectuer cette transition, on comptabilisera le **nombre de jours** consommés et le nombre de jours restants avant l'échéance.

  Ces **indicateurs CQD comparés aux estimations** de la direction constitueront les **éléments de reporting** liés aux performances du projet.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite


Le reporting permettra d'indiquer si tout se passe comme prévu ou si, par exemple, des **besoins complémentaires** en formation seront nécessaires (coûts), si un **délai supplémentaire** sera requis pour mener le projet à son terme.

Idéalement, le reporting sera **hebdomadaire** pour évaluer dans les temps les éventuelles actions correctives à mettre en œuvre.

- Dans le contexte de ce **projet de transformation**, les performances de l'équipe seront importantes à suivre. Au niveau **individuel**, il conviendra de donner l'opportunité à chaque collaborateur de transmettre du **feedback** sur l'évolution de la mise en application des nouvelles pratiques. Par exemple :
  - En organisant un rapide **point quotidien** avec l'ensemble de l'équipe pour identifier l'avancement et détecter rapidement les éventuelles difficultés,
  - En suivant au travers des **timesheets** le temps passé à la formation ou la **prise en main** des nouvelles méthodes et nouveaux outils,
  - En proposant aux collaborateurs un système d'**auto-évaluation** sur la maîtrise des nouveaux process à appliquer.

Exercice p. 11 **Solution n°5**

Associez les bons termes aux numéros indiqués sur le **triangle de la performance** ci-dessous :

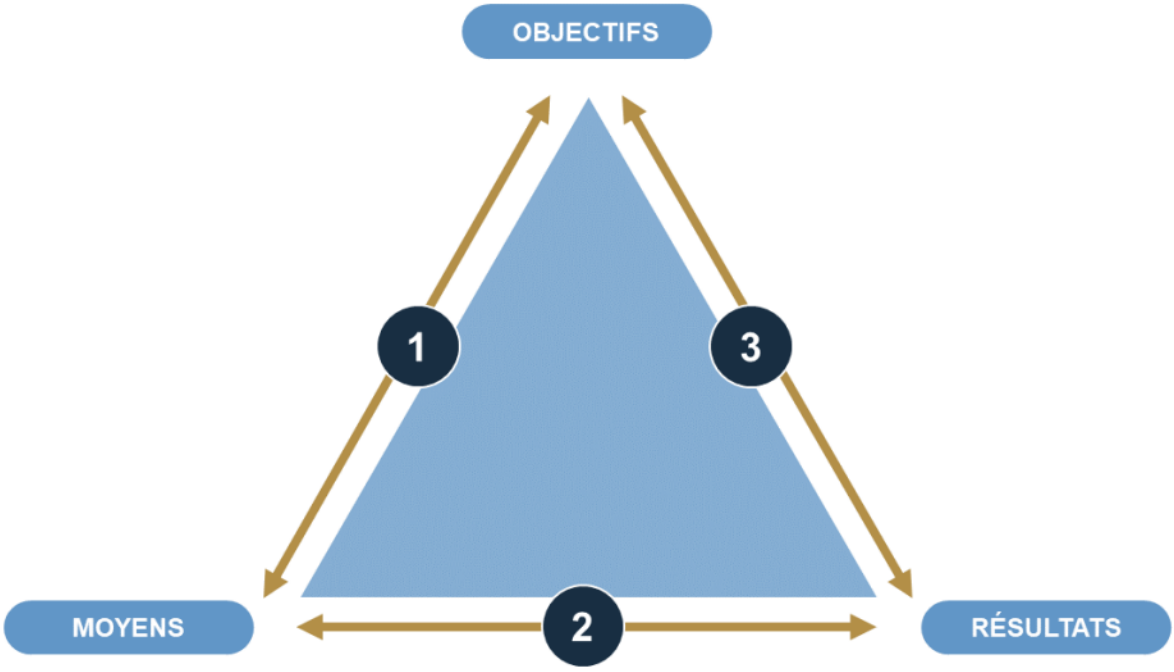

1	2	3
Pertinence	Efficience	Efficacité

La pertinence (1) témoigne de l'adéquation des moyens aux objectifs. **L'efficience** (2) correspond à l'utilisation des moyens en vue d'atteindre un résultat. **L'efficacité** (3) c'est la capacité à obtenir un résultat cohérent avec les objectifs.

Exercice p. 12 **Solution n°6**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 1

Vous trouverez ci-dessous cinq affirmations. Selon vous, lesquelles permettent d'établir un niveau de performance ? (Plusieurs réponses possibles)

- ☐ Magalie s'entraîne chaque samedi avec un coach.
- ☑ L'appartement que je viens d'acheter a un score « *D* », d'après son étiquette énergétique
- ☑ Yohan est arrivé vingt-deuxième à son dernier 10 km
- ☐ L'entreprise dans laquelle je travaille a mis en place de nouveaux process pour gérer les projets
- ☑ Stéphanie a livré son projet dans les temps, mais elle a utilisé 10 jours de plus que prévu pour les développements techniques

La performance permet d'évaluer le rapport entre des résultats attendus et une réalité que l'on doit pouvoir mesurer. La performance, c'est un niveau de réalisation des objectifs. Les propositions 2, 3 et 5 permettent bien de la mettre en évidence. En revanche, le fait de s'entraîner ou la mise en place d'une nouvelle organisation sont de simples moyens qui ne visent pas nécessairement une amélioration des performances.

Question 2

Parmi les propositions ci-dessous, identifiez celle qui est **exacte** ? (Une seule réponse juste)

- ○ La pertinence permet d'évaluer si les moyens permettent bien de parvenir aux résultats attendus
- ○ L'efficacité d'une équipe, c'est sa capacité à produire vite
- ◉ L'efficience d'un processus de fabrication peut être améliorée grâce à une nouvelle technologie réduisant le temps de production, sans consommer plus de ressources
- ○ La performance, c'est la capacité d'une organisation à bien utiliser des ressources

La pertinence, c'est le rapport entre les moyens et les objectifs, pas les résultats. L'efficacité d'une équipe, ce sera sa capacité à atteindre ses objectifs. Sa capacité à les atteindre plus ou moins vite, par exemple, témoignera plutôt de son efficience. Et la performance se construit par un bon équilibre entre objectifs, moyens et résultats, pas uniquement par une bonne utilisation des ressources.

En accélérant un processus de fabrication par une nouvelle technologie, à consommation de ressources égale, on augmentera l'efficience. La 3e proposition est la bonne réponse.

Question 3

Parmi les propositions suivantes, lesquelles désignent des objectifs opérationnels ? (Plusieurs réponses possibles)

- ☐ Renforcer la crédibilité de l'entreprise
- ☑ Fabriquer le produit sans dépasser le volume de ressources attribué
- ☑ Livrer le site Web avant le 15 octobre afin d'être opérationnel pour les fêtes de fin d'année
- ☐ Gagner en notoriété sur un marché émergeant
- ☐ Augmenter de 5 % le chiffre d'affaire de l'organisation en deux mois

Les objectifs opérationnels sont liés à la réalisation du projet en elle-même et sont attachés aux axes qualité (faire ce qui était prévu), coût (sans dépasser le budget) et délai (tout en respectant le calendrier convenu). Le résultat du projet, lui, vise à atteindre des objectifs stratégiques. On évaluera la performance d'une part au niveau de l'atteinte des objectifs stratégiques du projet, et d'autre part au niveau de l'équipe projet en mesurant sa capacité à atteindre ses objectifs opérationnels.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 4

Identifier parmi les propositions suivantes celles qui représentent des outils de suivi de la performance de l'équipe ? (Plusieurs réponses possibles)

- ☐ Un process de recadrage des comportements déplacés.
- ☑ Un stand-up meeting quotidien.
- ☑ Un tableau de bord présentant le suivi des indicateurs CQD (Coût, Qualité, Délai).
- ☑ Un tableau magnétique pour suivre la météo d'équipe.

En tant que manager, vous devrez suivre la capacité de l'équipe à produire le résultat attendu. Il sera alors utile d'utiliser un tableau de bord projet, orienté CQD. Le Stand-up meeting quotidien vous aidera à suivre l'avancement et à détecter d'éventuels problèmes. L'équipe étant constituée d'individus, vous devrez aussi vous assurer que les objectifs individuels soient bien satisfaits. Le bien-être du collaborateur et ses besoins doivent également être pris en compte. Un indicateur comme la météo d'équipe peuvent aussi être intégrés dans le suivi.

Question 5

Quels outils de suivi sont aujourd'hui mis à la disposition des chefs de projet ?

- ☑ Méthode Kanban
- ☑ Plateformes collaboratives en ligne
- ☐ Métaplan

Le métaplan est un outil de brainstorming, utilisé en amont de la phase projet pour faire émerger un maximum d'idées et d'opportunités.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite
