Le rôle de la note de cadrage

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Rôle de la note de cadrage **3**

A. Document de référence pour partager les enjeux du projet 3

B. Présenter le besoin 4

C. Préciser les objectifs avec l'arbre d'objectifs 6

II. Exercice : Quiz **9**

III. Esquisser la solution **10**

A. QQOQCCP pour résumer le projet 10

B. Border les contours du projet : le périmètre fonctionnel 13

IV. Exercice : Quiz **17**

V. Version préparatoire du cahier des charges **18**

A. Préparer l'organisation du projet 18

B. Définir la feuille de route : le macro-planning prévisionnel 22

C. Présenter (ou non) une enveloppe budgétaire 23

VI. Exercice : Quiz **25**

VII. Auto-évaluation **26**

A. Exercice : Cas Tartempion 26

B. Test 26

VIII. Essentiel **29**

Solutions des exercices **30**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Rôle de la note de cadrage

Contexte

Le chef de projet n'a **pas pour seule mission** d'assurer le suivi de la **production**. Il est aussi impliqué dans les **phases préparatoires** et de **définition** du projet.

Afin de pouvoir l'**aborder dans les meilleures conditions** il devra, dans un **document unique**, rassembler **toutes les informations clés** issues des **études préalables** au lancement. Un document qui lui permettra de **définir le périmètre** de son projet et d'en **partager les informations essentielles** avec toutes les personnes qui seront **impliquées dans son déroulement.**

Ce document de synthèse s'appelle une « ***note de cadrage*** ». Elle présentera le **contexte** du projet, les **objectifs** à atteindre, **l'organisation générale**, etc. Bref, tout ce qui sera nécessaire pour **bien** « ***cadrer*** » le projet et **sécuriser** sa **réalisation**.

Dans ce cours, nous allons vous présenter les **contenus incontournables** à faire figurer **dans une note de cadrage.**

A. Document de référence pour partager les enjeux du projet

Dans le **cycle projet**, la note de cadrage **fait suite à l'étude d'opportunité.**

Rappel

L'étude d'opportunité constitue la **première étape** du cycle projet. Elle permet, par une **analyse complète** de la **demande** initiale, de **l'environnement** du projet **interne** et **externe**, la réalisation d'une **étude de terrain** et la définition des **cibles** et de leurs **attentes**, de **valider l'opportunité** que représente un projet.

Notez que **selon l'organisation de votre projet**, l'étude d'opportunité pourra être **partagée ou non** par le commanditaire. En effet, il y a autant de **situations différentes** que de projets, et le prestataire pourra être **embarqué dès les phases préparatoires** ou, au contraire, **beaucoup plus tard** dans la phase avant-projet, lorsque le **cahier des charges** sera **entièrement finalisé.**

Dès lors que **l'intérêt** de mener à bien le projet est **acté**, la **note de cadrage** permettra d'en **dessiner les contours et l'organisation**, en **rassemblant** dans un seul et même document **toutes les informations essentielles**. C'est donc un **document de synthèse**. Elle peut constituer le **livrable** de **l'étude d'opportunité.**

La note de cadrage est un **document rédigé**. Vous utiliserez donc de préférence un **traitement de texte** (comme *Microsoft Word* ou *Google Docs*) qui vous permettra, au-delà de travailler une **mise en forme professionnelle et soignée**, de générer automatiquement une **table des matières** (votre note de cadrage doit être **facilement consultable**) et accessoirement de **signaler vos fautes** éventuelles.

La note de cadrage sera **partagée avec l'ensemble des acteurs** du projet :

- **Pour l'initiateur du projet** (ou le **commanditaire**), elle permettra de **définir clairement la demande** à l'origine du projet. Elle l'aidera à **structurer son expression de besoin** de façon à s'assurer que **rien d'important n'ait été oublié.**
- **Pour l'équipe en charge de la réalisation** du projet (qu'elle soit **interne** ou **externe**), la note de cadrage aidera à **formaliser le besoin** et **la solution envisagée**. C'est un outil efficace pour s'assurer de la **bonne compréhension** du besoin initial et donc **garantir la réalisation d'un résultat conforme**, utile à la **satisfaction des objectifs stratégiques.**
- **Dans le cadre d'une relation commanditaire - prestataire**, elle permettra à ce dernier de **« *border* » le périmètre** de sa prestation. Les **grandes lignes** des prestations prévues seront **décrites** dans la note de cadrage. C'est un document utile pour **sécuriser le périmètre de réalisation** et ne pas se retrouver à devoir effectuer des **tâches non financées** à cause d'une **incompréhension** initiale. À noter aussi que dans ce type de relation projet, il reviendra la plupart du temps **au prestataire** de **rédiger la note de cadrage**.

- **Pour les acteurs temporaires du projet**, la note de cadrage donnera une **vision d'ensemble** du projet et les aidera à réaliser leurs prestations **en toute cohérence** avec le reste du projet et les **équipes** mobilisées.

Vous le voyez, la note de cadrage est un **document structurant** dans une approche projet classique, de type cascade ou cycle en V. Fondamentale et consultée par **tous les participants au projet**, elle devra être **rédigée avec soin.**

Dans sa **trame globale**, la note de cadrage devra présenter :

- L'origine du **besoin** et son **analyse**, les **enjeux** identifiés,
- Le **contexte** du projet (**interne**) et son **environnement** (**externe**),
- Les grandes lignes de la **solution** proposée,
- Une **trajectoire** prévisionnelle de déroulement du projet,
- Une estimation du **budget** octroyé au projet (prévisionnel également pour le moment).

On présente ici les **informations essentielles** pour **décrire** le projet, mais **on ne précisera pas les détails de la réalisation** à produire. Ce n'est pas l'objet de ce document. D'ailleurs, les détails du projet **ne peuvent pas être connus à ce stade.** On précise le « ***quoi*** », ce qu'il y a à faire, pas le « ***comment*** » on va le réaliser.

B. Présenter le besoin

La **note de cadrage** doit donc **présenter le besoin** qui a été **défini** ou **précisé** lors de **l'étude d'opportunité**, ce besoin constituant **la raison d'être** du projet. C'est par cette partie que vous **commencerez** votre note de cadrage.

Dans le cadre d'une **relation commanditaire - prestataire**, cette **reformulation** du besoin et **l'analyse** qui en sera faite **démontreront au commanditaire** que son expression de besoin a bien été **prise en compte et comprise** par le **prestataire**.

Dans cette partie, vous détaillerez :

Le contexte du projet

Quelle est **l'origine** de la demande ? Le projet sera-t-il mené en **interne** ou **externalisé** ? Quel est le **SI** (Système d'Information) en place dans l'organisation ? Impose-t-il des **contraintes** spécifiques ? Quelles sont les **parties prenantes** identifiées à date ? Quelle est **l'équipe** mobilisée ?

Les objectifs du projet

Quels sont les **objectifs stratégiques**, tels que formalisés par l'initiateur du projet ? Comment seront-ils **évalués** ? Vous pourrez présenter ici les principaux **KPI** (*Key Performance Indicators*) identifiés lors de l'étude d'opportunité.

Le marché dans lequel le résultat du projet sera amené à exister

Quelles sont les **grandes caractéristiques** de ce marché (en lien avec votre projet) ? Qui en sont les **principaux acteurs** (offre) ? Quelle est la **segmentation** de l'offre ? Comment est **structurée** la **demande** ? Ce marché est-il en **croissance** ? Ou au contraire **stagne**-t-il ? Idéalement, une **représentation visuelle** de type **matrice de positionnement** indiquant la **position cible** de votre projet aidera à la **visualisation** de cet environnement.

Les cibles identifiées

Vous **qualifierez** ensuite vos cibles, les **utilisateurs** du résultat de votre projet. Ils sont **l'expression de la demande** de votre **marché**. Vous pourrez utiliser des **fiches *personas*** pour les **incarner** et les **présenter** de façon **concise**. Ces fiches *personas* mettront en évidence leurs **caractéristiques**, leurs **objectifs** propres, leurs **besoins** et les **difficultés** qu'elles rencontrent dans la situation actuelle, avant la réalisation du projet.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple

Une **fiche *persona*** incarne un **utilisateur** du résultat du projet. Elle présente les **caractéristiques** du **groupe cible**, son **profil** sur des **critères en lien avec le projet**, son **besoin** et ses **objectifs**, ainsi que les **freins** qu'elle rencontre pour accéder à un bien ou à un service.



Le périmètre général du projet

Le **périmètre fonctionnel** du projet sera **détaillé un peu plus loin** dans la note de cadrage. Néanmoins, vous préciserez ici les **attendus** en termes de **réalisation**. Sur **quoi** porte le projet ? **Qu'envisagez-vous** de réaliser ? Quels sont les **principaux supports** prévus ?

Exemple

Dès l'origine du projet, son initiateur a **une idée de ce qu'il souhaite réaliser**. On précisera ainsi les **livrables** attendus afin de déterminer la portée du projet. Devra-t-on réaliser un simple **site Web** ? Une **application** mobile ? Doit-on prendre en considération la **stratégie digitale globale** pour **générer du trafic** sur le site ? Le travail de **SEO** est-il à prendre en compte ou une **agence spécialisée** est-elle mandatée pour cela ? Devrons-nous également envisager **l'hébergement** ? Le projet intègre-t-il la **création d'une identité de marque** ? Y aura-t-il des **contenus vidéo** à produire ? Etc.

Les contraintes identifiées

Lors de l'étude d'opportunité, afin de valider l'intérêt du projet, vous avez également **identifié un certain nombre de contraintes**. Ces contraintes peuvent être d'ordre **organisationnel, technique, légal**, ou encore liées aux **ressources** disponibles ou à **l'environnement global** du projet. Vous les reprendrez **de façon synthétique** dans la note de cadrage.

Il pourra être utile également de placer une **matrice SWOT** ainsi que sa conclusion dans cette partie.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Rappel

Le **SWOT** est un **outil marketing**, utilisé en projet lors des **phases de définition**. Vous aurez pu le réaliser **en synthèse de votre étude d'opportunité.** Il présente les **informations essentielles** concernant le projet, à la fois du point de vue **interne** (**forces** et **faiblesses**) et **externe** (**menaces** et **opportunités**). On le matérialise par une **matrice à 4 cases**, dans lesquelles sont **listés** chacun de ces éléments :



La matrice SWOT **ne se suffit pas à elle-même** et est assortie d'une **conclusion** permettant d'en présenter **l'analyse**.

C. Préciser les objectifs avec l'arbre d'objectifs

Pour **préciser les buts à atteindre** et aider à déterminer ce qui **constituera le périmètre de réalisation**, il est possible de construire un **arbre d'objectifs.**

L'arbre d'objectifs est un outil qui peut être utilisé de **différentes manières**. Dans certaines démarches projet, la construction de cet arbre vient **après** la formalisation d'un « ***arbre à problèmes*** » et il aide à **guider le choix de projets** à réaliser pour résoudre des **difficultés spécifiques.**

Dans le cadre de notre **note de cadrage**, nous utiliserons l'arbre d'objectifs pour **identifier les défis principaux** que le projet devra relever et **aboutir à une esquisse des fonctionnalités** qui seront proposées par le résultat du projet. En cela, c'est un **outil de cadrage** efficace, que nous pourrons également exploiter plus loin dans la note de cadrage, lorsque nous définirons le **périmètre fonctionnel.**

L'arbre d'objectif part d'un **objectif général**, qui sera **détaillé** en **objectifs intermédiaires**, qui eux-mêmes seront **déclinés** en **objectifs opérationnels**, qu'on pourra à leur tour **traduire** en **fonctionnalités concrètes** à développer au cours du projet. Outre le fait qu'il permet d'appréhender une **vision d'ensemble** du projet, il vous aidera aussi à **justifier** les fonctionnalités proposées en **donnant du sens** à chacune d'elles.

La **construction** de l'arbre d'objectifs pourra faire l'objet d'une **séance de travail collaborative**, et dans le cadre d'une prestation d'**AMOA** (Assistance à Maîtrise d'Ouvrage), il sera très utile de **faire participer le client** et ses collaborateurs.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Pour mieux comprendre, nous allons **réaliser un arbre d'objectifs** autour d'un **projet** fictif, mais **concret**.

Exemple


Mme **Tartempion** a inventé un **chewing-gum révolutionnaire** dont le goût dure plus de deux heures. Elle le vend déjà chez quelques distributeurs, mais souhaite **donner de l'ampleur** à son activité. Dans le cadre de son développement, elle a décidé de mettre en place toute une **stratégie digitale** et notamment de **réaliser un site Web** sur lequel elle compte **vendre** ses chewing-gums. Elle prévoit une **boutique en ligne** classique, mais pense aussi à un **système d'abonnement**, permettant aux consommateurs de recevoir régulièrement leurs chewing-gums préférés à domicile, sans avoir besoin de penser à les acheter lorsqu'ils font leurs courses.

Dans le cadre de son étude d'opportunité, elle a défini plusieurs **objectifs stratégiques**, qu'elle a pris soin de formuler de façon « ***SMART*** ». Parmi eux, elle a retenu : « ***Le site Tartempion générera 50.000 € HT de chiffre d'affaires par semestre en ventes de boîtes de chewing-gums*** ». Cet objectif stratégique constituera **l'objectif général** (ou principal) de son arbre d'objectifs.




De cet objectif général, elle pourra établir **plusieurs objectifs secondaires**. Ici en l'occurrence, que devra-t-elle mettre en place afin d'**atteindre son objectif stratégique** ? Le nombre d'objectifs secondaires n'est **pas limité**, mais prenons trois exemples :

- « ***Présenter l'offre produit de façon attractive*** » aidera sans aucun doute à **transformer** les visiteurs du site en clients.
- « ***Développer une solution e-commerce*** » sera évidemment incontournable pour pouvoir vendre en ligne, elle ne pourra pas gérer des commandes passées par courriel, etc.
- « ***Générer du trafic sur le site Web*** » sera indispensable, impossible d'atteindre l'objectif général si une **stratégie** n'est pas **mise en œuvre** pour **capter** des internautes et les **diriger** sur le site e-commerce.



Ces **objectifs secondaires** seront à nouveau **déployés** afin d'identifier quels seront les **objectifs opérationnels** du projet. Comme précédemment, le **nombre d'objectifs opérationnels** n'est **pas limité**, vous pourrez en proposer autant que vous le jugerez utile pour votre projet.

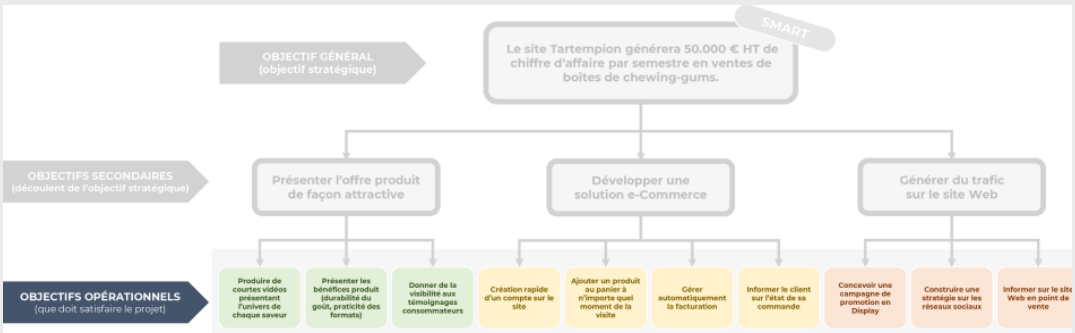


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Dans cet exemple, de l'objectif secondaire « *présenter l'offre produit de façon attractive* », on pourra déduire qu'il faudra :

- « ***Produire des vidéos présentant l'univers de chaque saveur*** »,
- « ***Présenter les bénéfices produit (durabilité du goût, praticité du conditionnement)*** »,
- « ***Mettre en avant les témoignages consommateurs*** »,
- Etc.

Chaque objectif secondaire donnera naissance **à plusieurs objectifs opérationnels**.

De ces objectifs opérationnels, il sera aisé de **déterminer** quelles seront les **fonctionnalités essentielles** attendues.

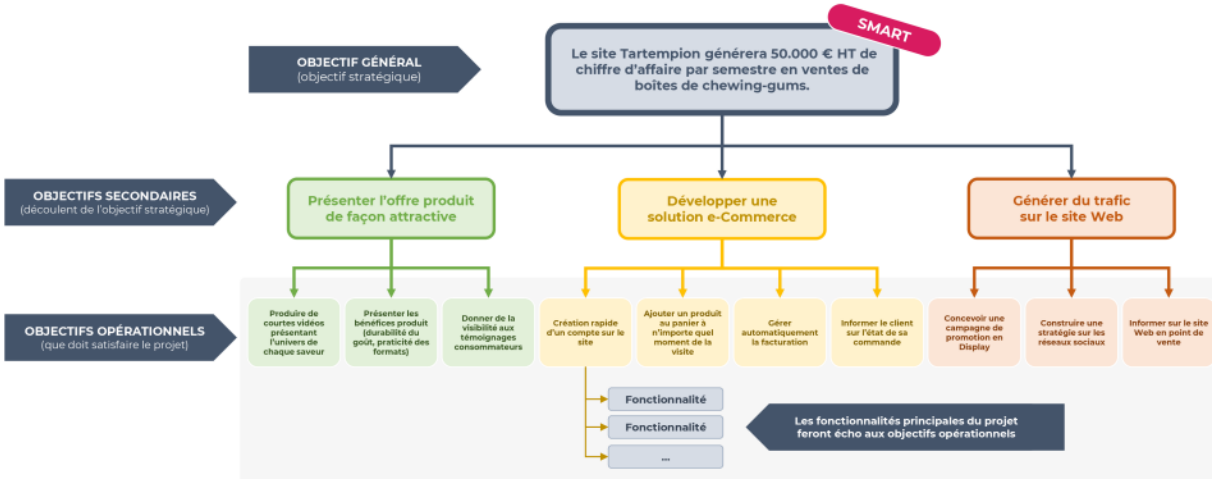

Cet arbre d'objectifs est une façon **concise et explicite** de présenter **la portée de la demande,** tout en **légitimant** les **supports** envisagés et les **fonctionnalités principales** imaginées. En cela, il a toute sa place dans la première partie de votre note de cadrage consacrée à la **présentation de la demande.**

Complément

Si vous organisez la construction de l'arbre d'objectifs lors d'un **atelier collaboratif**, vous pourrez rédiger les **objectifs secondaires, opérationnels** et lister les **fonctionnalités** sur des post-it de **couleurs différentes**. Vous obtiendrez ainsi une **représentation globale** des attentes que le projet devra satisfaire.

Pour **synthétiser ce travail**, ou lorsque vous serez seul pour réaliser l'arbre, les outils de **Mindmapping** vous aideront **à matérialiser le fruit de vos réflexions**. Plusieurs outils sont **disponibles en ligne.**

Regardez du côté de **Framindmap**[1](ou pour un accès en ligne direct à une version simplifiée[2]). Vous pouvez aussi utiliser le logiciel libre **Freemind**[3] ou divers outils payants mais souvent avec plus d'options et un design plus abouti comme **Mindmaster**[4], **MindMeister**[5] ou encore **XMind**[6].

Notez aussi que des outils simples comme **PowerPoint** ou **Google Slides** peuvent également être utilisés.

1. https://framindmap.org/
2. https://framindmap.org/mindmaps/index.html
3. http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Download
4. https://www.edrawsoft.com/fr/mindmaster/
5. https://www.mindmeister.com/
6. https://www.xmind.net/fr/

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Notez enfin que vous devrez réaliser un arbre d'objectifs **pour chacun des objectifs stratégiques définis.** Parfois, certains objectifs secondaires ou opérationnels seront **présents dans plusieurs arbres**, il sera alors **inutile de les redétailler.**

Une dernière remarque : parfois, vous aurez à définir des **projets plus complexes**. Dans ce cas, il est possible d'**ajouter une étape** entre les objectifs secondaires et les objectifs opérationnels. On parlera alors d'**objectifs intermédiaires.**

Exercice : Quiz

[solution n°1 p.31]

Question 1

À quel moment du cycle projet rédige-t-on une note de cadrage ? (Une seule réponse juste)

- ○ Avant l'étude d'opportunité, pour formuler le besoin
- ○ Après l'étude d'opportunité, dont elle constitue le livrable
- ○ Après la rédaction du cahier des charges

Question 2

La **note de cadrage** doit **définir avec précision** comment la solution sera développée. En cela, elle permet de **sécuriser le déroulement** du projet. (Une seule réponse juste)

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 3

À quoi sert la présentation d'une ***persona*** dans une note de cadrage ? (Plusieurs réponses possibles)

- ☐ Présenter de façon concise un groupe d'utilisateurs cibles
- ☐ Incarner la demande identifiée dans l'étude de marche
- ☐ Aider les développeurs à s'adapter à l'environnement technologique des utilisateurs

Question 4

Dans la **description du besoin**, pourquoi pourrez-vous utiliser une **matrice SWOT** ? (Une seule réponse juste)

- ○ Pour mettre en lumière les opportunités et menaces auxquelles le résultat du projet sera confronté
- ○ Pour rendre visibles et compréhensibles les KPI associés aux objectifs stratégiques du projet
- ○ Pour présenter de manière condensée l'ensemble des acteurs impliqués dans le projet

Question 5

Dans un **arbre d'objectifs**, à partir de quel type d'objectifs pourra-t-on imaginer les **fonctionnalités** possibles ? (Une seule réponse juste)

- ○ Les objectifs généraux
- ○ Les objectifs secondaires
- ○ Les objectifs opérationnels
- ○ Les objectifs SMART

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

III. Esquisser la solution

Le **besoin** et les **objectifs** du projet étant maintenant **décrits**, vous pourrez vous attacher à **compléter le cadrage** de votre projet en **présentant rapidement** la **solution envisagée**. On le rappelle : il ne s'agit pas ici de détailler avec précision chacun des écrans de votre solution digitale. Des **livrables spécifiques** y pourvoiront, comme la **charte graphique digitale** et le **cahier de créations** produits en fin de **phase de création**, ou les **spécifications fonctionnelles et techniques** issues de la phase de **conception**.

Dans la note de cadrage, on se limitera à présenter en quoi consiste le projet et comment on compte l'organiser. Le **QQOQCCP** et le **périmètre fonctionnel** vous y aideront.

A. QQOQCCP pour résumer le projet

Le **QQOQCCP** est un **outil de questionnement systématique** qui vous aidera à présenter les **caractéristiques** de votre projet de façon **synthétique**.

Chacune des lettres représente **une question**, à laquelle la note de cadrage doit **apporter une réponse claire :**

Q : Quoi ?

En réponse à cette question, vous rédigerez une ou deux **phrases courtes** présentant **le projet dans sa globalité. Sans jargon** métier, **sans construction alambiquée**, votre lecteur devra **comprendre rapidement en quoi consiste** le projet.

Exemple

Reprenons l'exemple des chewing-gums Tartempion, utilisé pour vous présenter la construction de l'arbre d'objectifs. Nous allons aider Mme Tartempion à **construire son QQOQCCP**. Pour cette première question « ***Quoi ?*** », nous pourrions écrire :

« ***Réalisation d'un site internet e-commerce de présentation et de vente en ligne de paquets de chewing-gums, à la commande ou par abonnement. Conception et mise en œuvre d'une stratégie digitale globale.*** »

Q : Qui ?

Ici, vous allez lister les **personnes** et **organisations** clés **impliquées dans le projet** ainsi que **les parties prenantes principales**. Vous indiquerez aussi quelles sont les **cibles** visées par le projet. Comme pour tous les éléments de la note de cadrage, on cherchera à **rester concis** : les **listes** à puces, les **tirets**, sont de bons moyens pour répondre à cette question.

Exemple

- « ***La société Tartempion, commanditaire du projet, représentée par Mme Tartempion - Décisionnaire MOA***
- ***Mathilde, Cheffe de projet en alternance, pilote du projet côté client***
- ***Alice, Directrice de clientèle - Décisionnaire prestataire MOE***
- ***Amory, Chef de projet, agence digitale prestataire***
- ***Société de production vidéo (à identifier)***
- ***Société d'hébergement (à identifier)***
- ***Tenir compte des distributeurs, pour lesquels le site représente une concurrence***
- ***Cibles : Personnes connectées, moins de 50 ans, déjà acheteur en ligne*** »

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Comme vous pouvez le constater dans cet exemple, il est **possible de lister des contributeurs** au projet qui ne sont **pas encore identifiés** lors de la rédaction de la note de cadrage. Néanmoins, **l'analyse des parties prenantes** réalisée au moment de l'étude d'opportunité aura permis de les repérer.

O : Où ?

Le « ***où*** » précise **à quel endroit** le projet sera mené. Vous pourrez indiquer aussi les **sous-traitances** envisagées en décrivant ce qui sera réalisé en **interne** ou ce qui sera **externalisé**. Dans **certains contextes projets**, en particulier lorsque votre projet devra **manipuler des données sensibles** par exemple, votre commanditaire pourra refuser que la réalisation soit faite **en dehors du territoire européen**. Dans ce cas, même si vous n'avez pas recours à de la sous-traitance, vous devrez **déplacer vos équipes** de réalisation (ou en trouver d'autres) pour satisfaire cette **contrainte**.

Exemple

- « ***Réunions projet sur site client, Niort***
- ***Pilotage projet, conception et création, à l'agence digitale, La Rochelle***
- ***Développements techniques par le studio de production, Lyon***
- ***Hébergement par une société implantée en France*** »

Q : Quand ?

Même si vous n'avez logiquement pas encore réalisé le planning détaillé de votre projet (il est trop tôt pour cela...), vous devrez **indiquer la dimension temporelle** associée à celui-ci. Généralement, c'est **l'initiateur du projet** qui **fixera des délais** pour la **mise en production** de son projet, et éventuellement quelques **dates** « ***impératives*** » **intermédiaires** liées à ses obligations, comme des **présentations internes** par exemple. Dans tous les cas, indiquez ici **l'ensemble des dates** dont vous avez connaissance et qui **conditionneront l'organisation générale** du projet. À minima vous préciserez **la date de début** du projet.

Exemple

- « ***Réunion de lancement (kick off) : 20 janvier***
- ***Durée prévisionnelle projet : 3 mois***
- ***Ateliers de conception : 1re semaine de février***
- ***Présentation des créations aux actionnaires : 27 février***
- ***Salon des mâcheurs professionnels : 25 mars*** »

C : Comment ?

Pour répondre à cette question, vous vous attacherez à préciser, **dans les grandes lignes, comment** le projet **sera réalisé**. Vous présenterez rapidement **la méthode projet** qui sera employée, ainsi que **l'organisation générale** de son déroulement. Le but : **comprendre** comment on envisage **la mise en œuvre.**

Exemple

- ***« Méthode projet en cascade, validation des livrables de chaque étape nécessaire pour lancer la suivante***
- ***Réunions de suivi (comités de pilotage) mensuelles***
- ***2 ateliers prévus au cours de la phase de conception (participation utilisateurs - à recruter)***
- ***Validation des créations sur prototype (utilisé pour démo actionnaires)***
- ***Développements techniques itératifs, 3 démonstrations intermédiaires***

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- ***Technologies employées : PHP, socle CMS e-commerce (Prestashop pressenti) »***

C : Combien ?

La réponse à cette question doit représenter **l'effort nécessaire** pour mener à bien le projet. On précisera donc les **coûts envisagés**, sans oublier les **achats** à effectuer. Généralement, dans une relation commanditaire - prestataire, il s'agira d'un **effort financier.**

Notez que ce « *combien* » peut être précisé en indiquant des **volumes de ressources humaines** mises à disposition pour réaliser le projet, on l'exprimera alors en **jours** par profil, ou « *jours / hommes* ».

Exemple

- ***« Budget global projet : 60k €***
- ***Site Web : 30k €***
- ***Production de contenu : 10k €***
- ***Plan de communication digitale : 20k €***
- ***Affectation Mathilde : 100 % de février à avril »***

Comme pour le « *quand ?* », **vous n'aurez pas à ce stade les éléments nécessaires à la construction d'un budget précis**. Il s'agit ici d'indiquer **l'effort consenti** pour réaliser le projet. Pour rappel, c'est bien la maîtrise d'ouvrage qui est décisionnaire en termes de budget. Il conviendra donc de préciser (quitte à ne pas le diffuser si le projet n'est pas réalisé en interne) **quel montant** sera octroyé au projet. Si vous prévoyez de **ne pas indiquer d'informations budgétaires** dans votre note de cadrage, vous ne donnerez **pas de réponse** à cette question et vous préciserez à la place une **mention** de type « *à déterminer à la suite de l'appel d'offres* » ou un simple « *confidentiel* ».

P : Pour quoi ?

La réponse à cette question consiste à rappeler les **finalités** du projet, dans **quels buts** il sera mené. On reprendra les **objectifs stratégiques** identifiés dans l'expression de besoin.

Exemple

- ***« Créer la notoriété de la marque (20 % en citation spontanée 6 mois après le lancement)***
- ***Générer 50k € de CA / semestre sur le site »***

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Même si vous pouvez répondre à l'ensemble de ces questions dans plusieurs paragraphes rédigés, la présentation **sous forme de tableau** sera beaucoup plus **digeste** et **rapide à consulter**. Rappelez-vous que la note de cadrage sera **consultée par l'ensemble de l'équipe projet**, au sens large : on doit pouvoir **accéder rapidement aux informations** recherchées.

QQOQCCP

Questions	Réponses
Quoi ?	
Qui ?	
Où ?	
Quand ?	
Comment ?	
Combien ?	
Pour quoi ?	

B. Border les contours du projet : le périmètre fonctionnel

Ce qui fera **le cœur d'un projet digital**, c'est **l'ensemble des fonctionnalités** qui seront proposées par la réalisation résultant du projet. C'est **sur la base de ces fonctionnalités** qu'on établira les premières **estimations de charges**. Dans la note de cadrage, il sera donc essentiel de **définir ce périmètre**, même si **en cours de projet** les fonctionnalités seront **précisées et détaillées.**

Le périmètre fonctionnel, c'est présenter **de façon unifiée ce que l'on prévoit de réaliser** en cours de projet. Tout ce qui est **décrit** dans ce périmètre est bien **prévu** et **sera fait**, c'est dans le « ***scope*** » du projet. En revanche, tout ce qui ne sera **pas explicitement précisé** dans le périmètre fonctionnel ne sera **pas prévu**, ce sera « ***hors scope*** ».

Le périmètre fonctionnel présenté dans la note de cadrage sera très utile pour **sécuriser le périmètre** projet, et donc **éviter des dérives budgétaires** qui seraient liées à la réalisation de fonctionnalités qui semblaient « *évidentes* » pour le commanditaire, mais qui n'avaient **pas été anticipées** par le prestataire. Dès lors que le périmètre fonctionnel est présent dans la note de cadrage, **tout ce qui n'y est pas décrit n'est pas prévu**. On limitera ainsi des sources de conflit potentielles ultérieures.

Encore une fois, dans la note de cadrage, on précise **ce qu'on souhaite** pour le projet, mais **pas comment** on va le réaliser. Le **niveau de détail** reste donc très **macro**.

Le **périmètre fonctionnel** tiendra compte évidemment des **fonctionnalités principales** qui seront proposées aux **utilisateurs** de la solution. Mais bien souvent, lorsqu'on pense « *utilisateur* », on se concentre sur nos **cibles**. Or, afin de **mettre à jour** le site Web ou l'application mobile, **le commanditaire** du projet sera **également un utilisateur** à prendre en compte. Ainsi les fonctionnalités dites de « ***back office*** » qui permettront la **mise à jour** et **l'exploitation** au quotidien de la solution ne devront pas être oubliées.


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Parmi les équipes digitales qui seront largement mobilisées pour réaliser le projet, on retrouvera essentiellement les équipes **créatives** et les équipes de **développement**. Le périmètre fonctionnel **guidera les premières estimations** faites par ces deux catégories métier pour envisager les charges nécessaires à la réalisation du projet. Mais toutes ne vont pas se baser sur les mêmes informations :

- **Pour les créatifs**, ce qui compte avant tout, c'est le **nombre d'écrans types** (on parle aussi de « ***gabarits*** », de « ***templates*** » ou de « ***masters*** ») qui constituent l'application à réaliser. Un **écran** correspond à **une page** pour un **site web** ou une section d'une **application mobile**. Cette **volumétrie** ainsi que les **fonctionnalités principales** seront présentées par le périmètre fonctionnel.
- **Pour les développeurs**, le nombre d'écrans est une donnée, qui guidera par exemple les estimations en termes **d'intégration HTML/CSS**, mais ce qui constituera **l'essentiel de la charge** est porté par **la liste des fonctionnalités** envisagées. Selon la manière dont vous présenterez les fonctionnalités, vous donnerez aux équipes de développement la possibilité de faire des **estimations** plus ou moins justes.


Exemple

Prenons l'exemple d'une fonctionnalité « ***moteur de recherche*** ». Si c'est un **simple champ de saisie** permettant de faire une **recherche plein texte** dans l'ensemble des contenus du site, son développement devrait être assez **rapide**. En revanche, si vous prévoyez que l'utilisateur puisse **sélectionner dans quelle section du site** il veut effectuer sa recherche, comme sur *Amazon* par exemple :

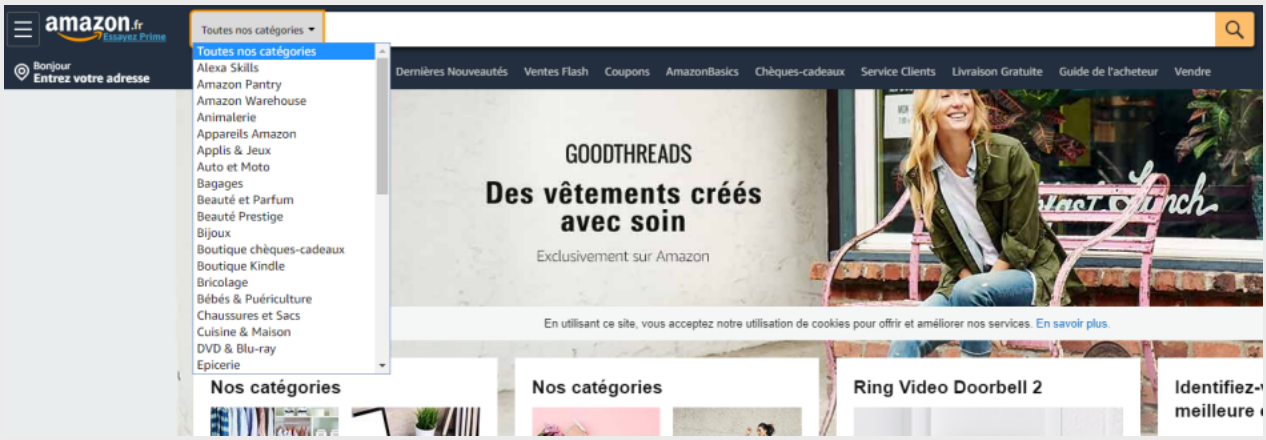

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Ou que des **suggestions** soient proposées **au fur et à mesure de la saisie** pour **guider la recherche**, comme sur *Google* :

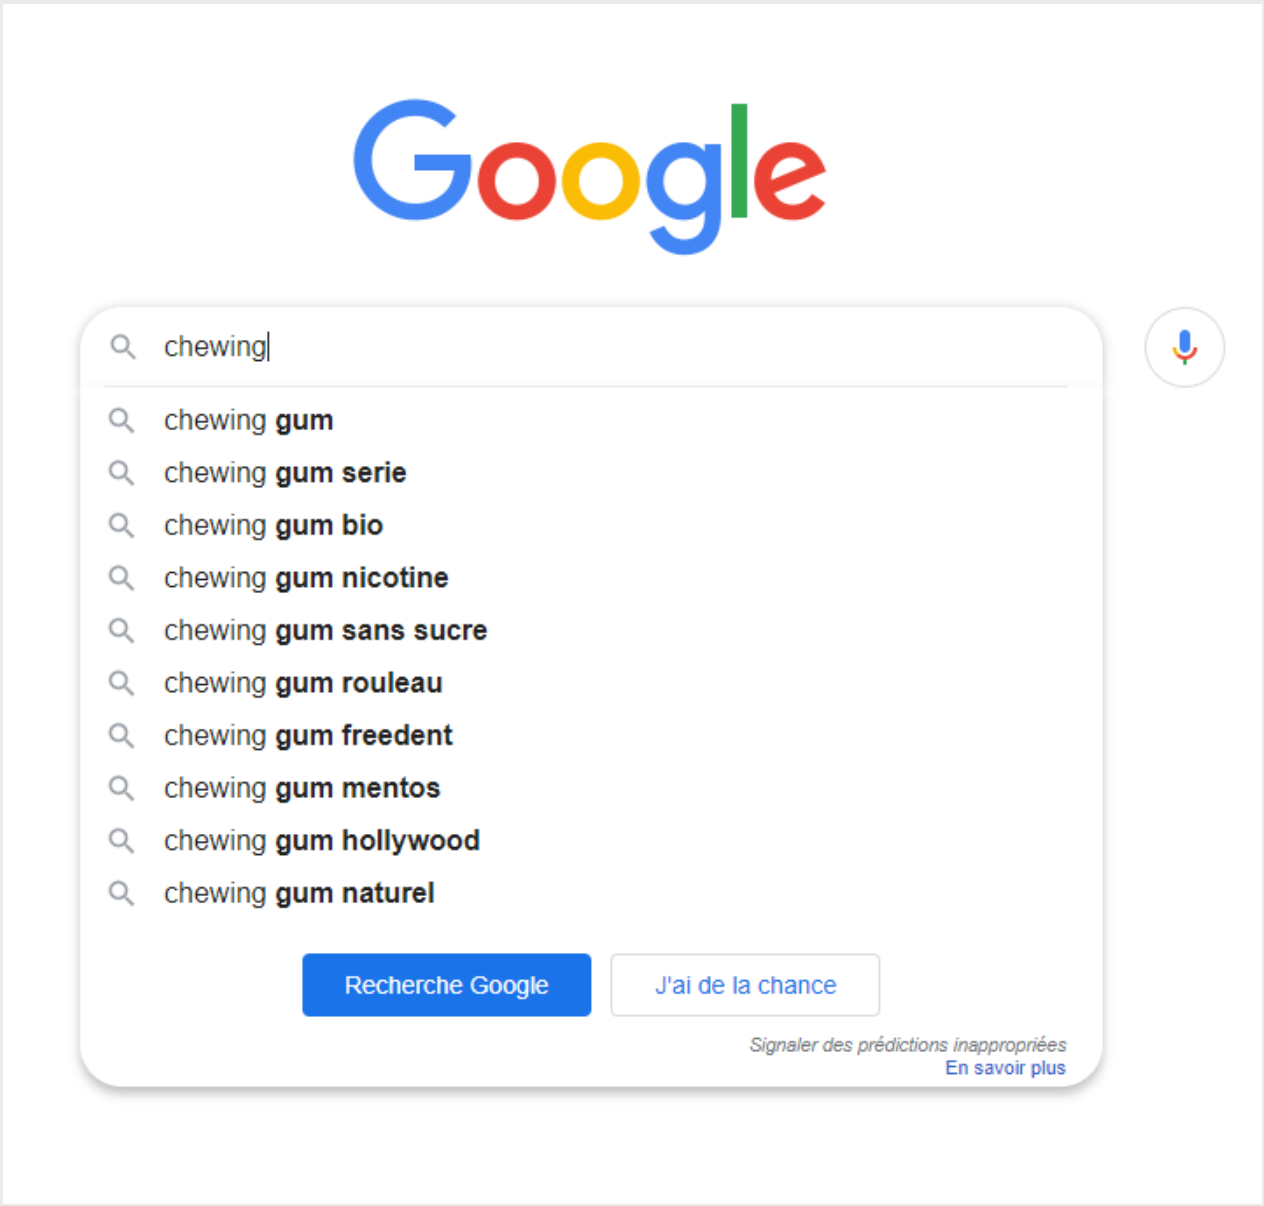

La **complexité de réalisation** de la fonctionnalité « *moteur de recherche* » sera **très différente**. Ce sera une **indication majeure pour les développeurs,** mais, dans un cas comme dans l'autre, l'effort à produire pour les créatifs sera similaire.

Il sera donc important de **présenter ces deux aspects** dans votre périmètre fonctionnel :

- La **volumétrie** des écrans types à produire,
- **L'ensemble des fonctionnalités** envisagées.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Le **format tableau** est pratique, car il vous permet de **présenter à l'aide d'un seul support** les différents écrans envisagés **et** les **fonctionnalités**. Mais vous pourrez aussi présenter la volumétrie du site en produisant une **arborescence des contenus** d'une part et la **liste des fonctionnalités** d'autre part. Notez toutefois que l'arborescence des contenus est le **résultat d'un travail de conception**, et que vous risquez dès la note de cadrage de **contraindre** ou **limiter** les **possibilités d'évolution** dans la suite du projet. **Évitez si possible de prendre des décisions prématurées** dans la note de cadrage. Encore une fois, la note de cadrage indique ce dont on a besoin, pas comment on va le réaliser.

Le tableau périmètre fonctionnel

Le tableau pour présenter le périmètre fonctionnel sera composé de **plusieurs colonnes** pour **apporter les informations utiles** de façon **condensée**. **Le nombre de colonnes pourra varier** en fonction de vos besoins, mais voici un exemple concret que vous pourrez réexploiter :

Le périmètre fonctionnel

Réf.	Type	Nom	Description	Complexité	Priorité	V1	V2
A	Écran	**Page d'accueil**	Page d'accueil sur le site	3	1	X	
A1	Fonctionnalité	**Nouveautés**	Carrousel de présentation des nouveautés / promotions	2	1	X	
A2	Fonctionnalité	**Présentation**	Zone de présentation de la marque + avantages produit	1	1	X	
A3	Fonctionnalité	**Commentaires clients**	Mise en avant des commentaires client	2	2		X
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
Z	Écran	**Éléments récurrents**	Présents sur toutes les pages du site	n/a	n/a	n/a	n/a
Z1	Fonctionnalité	**Lise des liens**	Liens vers toutes les sections du site	1	1	X	
A3	Fonctionnalité	**Réseaux sociaux**	Liens vers les différents réseaux (4)	1	1	X	
...	...	...	...	...	...	...	...

1. **Les quatre premières colonnes** décrivent les **éléments** présentés dans le périmètre fonctionnel, **écrans et fonctionnalités**. On y retrouvera :
    1. Une **référence unique**, permettant d'identifier l'écran ou la fonctionnalité sans ambiguïté,
    2. Le **type** pour préciser explicitement s'il s'agit d'un écran ou d'une fonctionnalité ou, pourquoi pas d'un **contenu** spécifique,
    3. Le **nom**,
    4. Et une **description**.
2. **Les quatre colonnes suivantes** peuvent préciser :
    1. Un **niveau de complexité**, qui sera utile pour estimer les charges. On peut par exemple utiliser **une échelle de 1 à 3** pour signifier une complexité de réalisation **facile (1), intermédiaire (2) ou complexe (3).**
    2. Une **priorité**, qui servira à identifier si les fonctionnalités ou les sections de l'application sont **indispensables** (priorité **1**), **intéressantes** (priorité **2**) ou « ***un plus*** » (priorité **3**). Cette priorisation est importante dans la mesure où, **en fonction des événements** qui surviendront **durant le projet**, vous pourriez par exemple être amenés à **faire des choix** parmi les fonctionnalités à développer afin de tenir les délais. Les fonctionnalités de priorité 1 seront alors **privilégiées**, considérant qu'elles **apportent plus de valeur** pour le commanditaire ou pour les utilisateurs.
    3. La **planification éventuelle** pour une **version initiale (V1)** ou une **version ultérieure (V2)**. Cette planification reste **optionnelle**, beaucoup de projets sont prévus sans anticiper une seconde version dans le futur.
3. Remarquez que, pour **faciliter la lecture**, les différents écrans types vont constituer des **sections différentes** du tableau. On les identifie dans une **couleur dédiée** et on **regroupe** en dessous les fonctionnalités envisagées pour cet écran.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

4. Quand des **fonctionnalités** seront **présentes dans plusieurs écrans**, on les **rassemble** dans une section nommée par exemple « ***éléments récurrents*** ». Ce sera le cas des fonctionnalités du ***footer*** (pied de page) ou du ***header*** (en-tête de page - comme **l'accès à un compte client** par exemple), des **menus de navigation** ou encore de **blocs d'information** identiques présents dans plusieurs écrans différents. On ne les développera pas plusieurs fois.

Vous devrez bien entendu prévoir **autant de lignes que nécessaire** pour présenter la **volumétrie** totale de votre projet en termes d'écrans différents et de fonctionnalités.

Attention

Attention ! N'oubliez pas non plus de **décrire les fonctionnalités attendues en back-office** pour **l'utilisation quotidienne** par les **futurs administrateurs** de la solution. Si votre projet doit s'appuyer sur un CMS, vous **listerez quand même les fonctionnalités attendues** pour la **gestion du site**. Cela vous aidera, le moment venu, à **sélectionner un CMS** adapté ou à identifier des fonctionnalités particulières qui nécessiteront des **développements spécifiques.**

Le **format tableau** vous aidera, en **tenant compte de la complexité** de chacun des éléments présentés, de **produire des estimations de charges globales**. Selon **l'expérience acquise** dans le cadre de votre organisation, vous pourrez déterminer **combien de temps** est nécessaire pour **concevoir**, faire la **création** ou **développer** un élément simple, intermédiaire ou complexe.

Exercice : Quiz

[solution n°2 p.32]

Question 1

Quels sont les **outils utiles** pour présenter **l'esquisse de la solution** envisagée ? (Plusieurs réponses possibles)

- ☐ Un outil de mind mapping
- ☐ Le QQOQCCP
- ☐ L'arbre d'objectifs
- ☐ Le périmètre fonctionnel
- ☐ Le CQOQOCP

Question 2

Dans **quelle(s) section(s) du QQOQCCP** pourriez-vous indiquer si la réalisation sera **en partie sous-traitée** ? (Plusieurs réponses possibles)

- ☐ Q
- ☐ Q
- ☐ O
- ☐ Q
- ☐ C
- ☐ C
- ☐ P

Question 3

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Vous devez **compléter un QQOQCCP** pour votre note de cadrage. Mais les **informations financières** concernant les **coûts des ressources** ne vous sont **pas accessibles**. Comment dans ce cas allez-vous pouvoir compléter la section « ***Combien*** » ? (Une seule réponse juste)

- ○ Je ne la complète pas, puisque je ne peux pas indiquer d'informations chiffrées
- ○ Je cherche les prix des ressources sur le Net pour pouvoir indiquer une estimation malgré tout
- ○ Je n'indique pas de montants en Euros, à la place je précise des nombres de jours estimés par métier

Question 4

À quoi sert un **périmètre fonctionnel** ? (Plusieurs réponses possibles)

- ☐ Détailler les fonctionnalités à réaliser pour guider les développements
- ☐ Représenter le volume du projet, en notamment le nombre de gabarits envisagés
- ☐ Lister les fonctionnalités essentielles envisagées
- ☐ Estimer plus facilement les charges nécessaires à la réalisation du projet
- ☐ Indiquer les dates de livraison pour les différents chantiers du projet

Question 5

De **quel(s) métier(s)** pourrez-**vous estimer les charges** à l'aide d'un **périmètre fonctionnel** ? (Plusieurs réponses possibles)

- ☐ Les créatifs
- ☐ Les développeurs
- ☐ Le chef de projet
- ☐ Le directeur de clientèle

V. Version préparatoire du cahier des charges

A. Préparer l'organisation du projet

Tout projet va nécessiter **une organisation** pour pouvoir **fonctionner**. L'organisation du projet se matérialise au travers de **deux éléments fondamentaux :**

- **L'équipe** en charge de sa réalisation,
- **La gouvernance** mise en place pour le déroulement du projet.

L'équipe projet

Un **organigramme** est un moyen efficace pour **présenter l'équipe mobilisée** pour un projet.


- **Dans le cadre d'un projet interne**, il indiquera les **besoins pressentis** en termes de **ressources humaines,** qu'il faudra libérer pour les **affecter** à la réalisation du projet.
- **Dans le cadre d'une relation commanditaire - prestataire**, elle permettra au **prestataire** d'indiquer **quels profils** il compte mobiliser (ce qui témoignera des **expertises** affectées au projet), de **rassurer** sur le bon déroulement du projet en **matérialisant la volumétrie de ces ressources**, de **représenter les échanges** pendant le déroulement du projet par des liens de **collaboration**, d'identifier les **points de contact** pour le commanditaire et de représenter le **processus d'escalade** possible en représentant les **liens de subordination** entre les membres de l'équipe projet.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Dans tous les cas, la représentation de l'équipe sous forme d'organigramme permettra de **mesurer l'ampleur de la coordination nécessaire**, les différentes **responsabilités**, et **rassurera** sur les **capacités** à mener le projet à son terme dans de bonnes conditions.

Exemple

Un **organigramme d'équipe** pour un projet Web pourrait se présenter de la façon suivante :

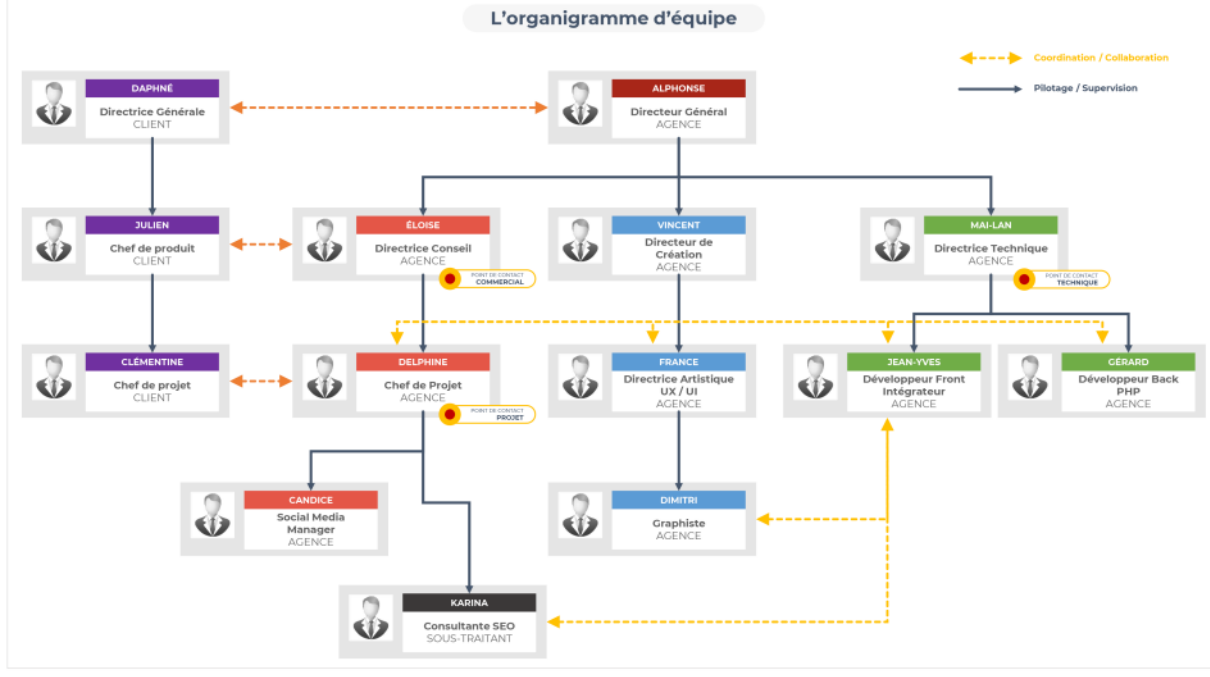

Ici, **chaque corps de métier** est présenté d'une **couleur spécifique** pour bien les **repérer**. On identifie **l'interlocuteur privilégié** dans l'équipe projet prestataire qui sera en relation avec les différents niveaux de hiérarchie côté client. Par ailleurs, les **points de contact** thématiques sont identifiés **de manière visible** pour **faciliter les échanges** en cours de projet. Ainsi, dans cet exemple, si le commanditaire à une question sur la **facturation**, il saura qu'il doit contacter **Éloïse** ; pour traiter un point projet ou demander des éléments de **reporting**, il devra prendre contact avec **Delphine**. Et si sa **DSI** doit échanger des **informations techniques**, elle contactera directement **Mai-Lan**. Identifier ces points de contact assure de **trouver immédiatement les compétences recherchées.**

Vous pourrez aussi, dans la note de cadrage, préciser les coordonnées de ces points de contact.

Les relations **tracées en pointillés jaunes** indiquent quelles seront les **collaborations majeures** en cours de projet. Il va sans dire que **le chef de projet est un cas particulier**, car il aura à interagir avec **toutes les ressources** durant le projet.

Les relations **tracées en bleu avec des flèches à sens unique** matérialisent les **relations hiérarchiques** entre les membres de l'équipe projet. Savoir **qui rend des comptes à qui** incarnera pour le client un **processus d'escalade** en cas de problème rencontré durant le projet. Dans cet exemple, bien que le point de contact projet soit Delphine, **en cas de difficulté ou de désaccord**, le client visualise qu'il pourra contacter **Éloïse** afin de résoudre son problème, et à défaut **Alphonse**.

On peut ainsi en un seul schéma **visualiser l'équipe** chargée de la réalisation du projet et **son fonctionnement** envisagé.

Bien entendu, vous ne représenterez pas l'organigramme de toute l'organisation, mais **uniquement des profils affectés à la réalisation du projet.**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

La gouvernance du projet

La **gouvernance** est une notion décrivant **comment une organisation est dirigée**. Ainsi, vous pourrez rencontrer des gouvernances d'entreprises, d'entités territoriales, d'ONG, etc. **Dans un projet,** on se réfère aux **mêmes principes** : la gouvernance définit **comment l'information circulera**, au sein de quelles **instances**, qui seront les **profils décisionnaires** concernés et comment on **prendra des décisions** tout au long du projet. Elle vous permet de poser un **cadre organisationnel** au sein duquel le projet va se dérouler et sera incarnée par plusieurs types de **réunions** ou de **comités**.


Votre gouvernance devra être **adaptée à la nature et à l'ampleur de votre projet**. Toutefois, vous pourrez vous baser sur le **modèle** suivant **à trois niveaux**, généralement appliqué dans le cadre d'un projet digital.

Niveau opérationnel : le suivi de production

Ce niveau de gouvernance explicite **comment les échanges quotidiens seront réalisés** en cours de projet. Ces échanges se feront simplement par **email, téléphone** ou **visioconférence**. Il n'est pas nécessaire d'organiser des réunions coûteuses. Les **participants** sont listés, la plupart du temps les **chefs de projet** et les **ressources** affectées au projet seront **principalement concernés** par ce niveau de gouvernance. On y prendra des **décisions opérationnelles mineures** (sans impact sur les objectifs du projet). La gouvernance précisera également un **moyen de consigner les échanges essentiels**, ce qui peut passer par la tenue d'un **journal projet** ou l'utilisation d'un **outil de ticketing** de type *Redmine*.

Exemple

La note de cadrage privilégiant les **formats concis**, un **tableau standardisé** pour chaque niveau de gouvernance sera un choix judicieux :



Ce **niveau minimal** est présent dans **toute organisation projet**, quelle que soit la nature ou l'ampleur du projet, dans la mesure où une **communication régulière** conditionnera **sa réussite.**


Niveau coordination : la conduite de projet

À ce **niveau intermédiaire de gouvernance**, on veillera à **sécuriser l'avancement** du projet, en **vérifiant les réalisations effectuées** et la **trajectoire** vers l'objectif de réalisation. Cette instance prendra souvent la forme d'une **réunion hebdomadaire. L'avancement du projet** pourra être suivi au travers d'un document de type ***worklist*** qui regroupera **les différents chantiers en cours**. L'état de chacun de ces chantiers, partagé avec le commanditaire, contribuera à **l'informer sur le déroulement du projet**. Ce sera également l'occasion de pouvoir faire des **arbitrages non stratégiques**, comme **l'affectation de ressources complémentaires** ou la **dépriorisation** de certains travaux. C'est pour cela qu'au-delà de la présence du chef de projet, des **managers** devront être présents afin d'entériner ces éventuelles décisions qui affecteront les **objectifs CQD** (Coût, Qualité ou Délais) du projet. Cette réunion n'est **pas nécessairement longue**, surtout lorsque tout se passe bien, mais elle contribue à un **bon outil de suivi.**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple

Voici un exemple pour ce **second niveau** de gouvernance :




Notez que tous les projets, et en particulier les plus petits, **ne nécessitent pas de niveau intermédiaire**. Vous veillerez, en définissant votre gouvernance, à **ne pas démultiplier des réunions** qui, si on n'a rien à partager, peuvent s'avérer **inutiles** et constituer un **surcoût** conséquent, tout en **ralentissant la production...**

Niveau décisionnaire : le pilotage du projet

Des réunions avec les **initiateurs du projet** viendront rythmer son déroulement. Ce sera notamment le rôle du **comité de pilotage**, qui permettra de faire un **point formel** sur **l'avancement** du projet, de **présenter les réalisations finalisées** et de **faire les arbitrages** nécessaires en cours de projet. Cette instance rassemble les **décisionnaires** du projet, habilités à prendre des **décisions stratégiques** pouvant en modifier les contours **pendant la durée** du projet. Le comité de pilotage est par exemple légitime pour **augmenter ou réduire la portée du projet,** décider de l'octroi de **budget complémentaire**, modifier les **contraintes de délais**, etc.

Exemple

Voici un exemple pour ce **troisième niveau** de gouvernance :



La **fréquence** des comités de pilotage sera elle aussi **adaptée à la nature du projet et à sa complexité**. Il sera par exemple inutile de préciser ce niveau de gouvernance pour un projet prévu sur deux mois. En revanche, un point intermédiaire avec les décideurs et une réunion de livraison finale pourrait dans ce cas être un **compromis efficace.**

Un socle : les process et les outils

La gouvernance d'un projet peut aussi présenter **les process** à utiliser en cours de projet (comme le processus de transmission et d'examen d'une nouvelle demande), ainsi que **les outils** mis à la disposition de l'équipe projet. On pourra par exemple présenter des **outils de conversation en direct**, des systèmes de **suivi d'activité** fonctionnant par **tickets**, des outils d'organisation et de visualisation de l'avancement comme ***Trello***, un environnement de **stockage partagé** pour les livrables importants et la documentation projet, etc.

Puisque la gouvernance donne **un cadre à la circulation de l'information** au sein de l'équipe projet, ce type de précisions peut être judicieusement ajouté à votre document de cadrage.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Dans votre **note de cadrage**, avec une **équipe** bien construite et une **gouvernance** clairement établie, vous tracerez **les contours de votre organisation projet.**

B. Définir la feuille de route : le macro-planning prévisionnel

Le **planning du projet** est un **livrable** en lui-même, qui devra être **construit par le chef** de projet afin **d'organiser** et de **piloter la production**. C'est un document qui **demande du temps**, et il serait **prématuré** de le réaliser maintenant. Toutefois, **dans la note de cadrage**, même si vous ne présenterez pas un planning détaillé, vous devrez indiquer comment vous envisagez **la projection de votre projet dans le temps**. Pour cela, vous construirez la **feuille de route** de votre projet. On parlera également de « ***roadmap projet*** » ou de « ***macro-planning*** ».

Cet exercice vous aidera à donner une **dimension concrète** au projet, mais surtout à **mettre à plat les échéances essentielles** sur lesquelles **vous vous accorderez avec le commanditaire** du projet. Dans la première partie de la note de cadrage, vous avez dû tenir compte d'un certain nombre de **contraintes** posées par l'initiateur du projet ; votre **feuille de route** devra les **intégrer**.

Votre roadmap va au-delà de la réponse au « *Quand ?* » du QQOQCCP. Elle présentera **deux types d'informations** utiles pour bien comprendre comment **le déroulement** du projet est envisagé :


- Les principaux **jalons**
- Les **grandes phases** du projet

Ces **jalons**, pour simplifier, ce seront les **échéances principales :** quand le projet à proprement parler va-t-il **commencer** et à quel moment allez-vous remettre les principaux **livrables clés** ? Bien entendu, vous préciserez aussi à quelle date vous prévoyez la **livraison finale**. C'est le « *quand ?* » du QQOQCCP.

Le **macro-planning** vous aidera aussi à présenter les **grandes phases** de votre projet : quelles **natures de tâches**, quels types d'activités, allez-vous réaliser ? **À quel moment** ? Dans **quel ordre** ? Vous indiquerez également quelles phases vont se conduire **en parallèle**, quelles autres devront **se succéder.**

Exemple

Voici un exemple de **roadmap projet** que vous pourriez inclure dans une note de cadrage :

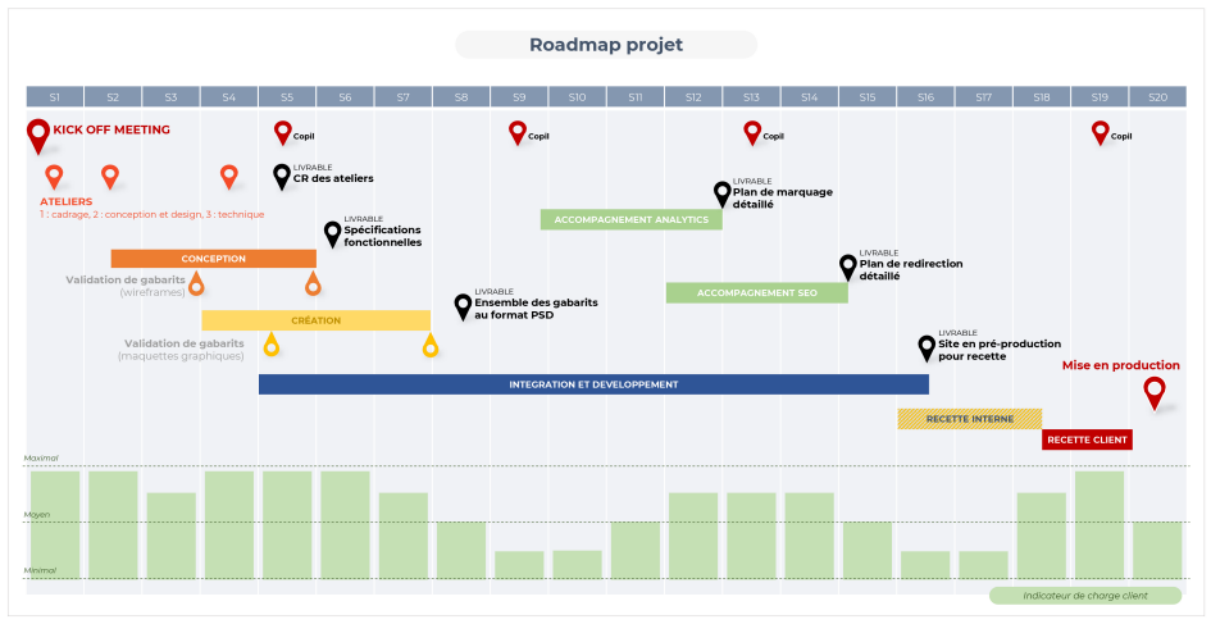

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Complément

Vous l'avez probablement remarqué dans cet exemple, une **information complémentaire** a été ajoutée : « ***l'indicateur de charge client*** ». **Dans le cadre d'une relation commanditaire - prestataire**, si vous devez réaliser le macro-planning du projet, vous pourrez aussi préciser **comment vous allez solliciter votre client** durant le projet. C'est une information souvent oubliée, mais qui présente de **nombreux avantages :**

- Elle **implique le fait que votre client ne sera pas un simple donneur d'ordre** : pour réussir le projet, il devra y **contribuer** réellement.
- Elle aide le client à **organiser sa participation** au projet en lui permettant **d'anticiper** les périodes au cours desquelles il sera plus fortement mobilisé et de **se libérer** pour cela.
- Elle montre à votre commanditaire que **vous le prenez en considération**, que vous vous intéressez (vraiment) à lui. En cela, c'est un indicateur **très largement apprécié** des clients...

Il est utile de rappeler que le **macro-planning** réalisé dans la note de cadrage n'est que **prévisionnel**. Il donnera lieu, **dans la suite du cycle projet**, à la construction d'un **véritable planning détaillé**. Mais un planning, même s'il reflète **la dimension de délai** des **objectifs CQD** est avant toute chose un **outil de pilotage** du projet. Il sera amené à **évoluer au cours de son déroulement,** car il est peu probable que toutes les échéances définies au moment de la note de cadrage seront respectées dans les faits...

C. Présenter (ou non) une enveloppe budgétaire

Si le **macro-planning** vous permet d'incarner la **réalité temporelle** de votre projet, le **budget prévisionnel** matérialisera lui les **efforts concrets** à produire pour le mener à bien. Il y a toutefois **deux cas** à prendre en considération : soit **le budget pour votre projet est imposé**, et il aura toute sa place dans la note de cadrage en étant présenté sous forme de **contrainte**, soit il n'est **pas encore figé** et vous devrez vous baser sur la **description de la solution** (et **périmètre fonctionnel** notamment vu plus haut) pour produire une **estimation** ou un **budget prévisionnel.**

Le budget du projet est imposé

Dans ce cas, la note de cadrage se bornera à **présenter le budget général** affecté au projet. Il ne sera **pas détaillé**, une **somme globale** sera indiquée. **L'étude de faisabilité** qui suivra devra tenir compte de cette **contrainte** pour **évaluer** si les fonctionnalités envisagées, la portée globale du projet, sont **adaptées** à ce montant. Dans l'affirmative tout ira bien, et si ce n'est pas le cas, des **arbitrages** devront être réalisés à l'issue de cette étude.

Le budget n'est pas défini

Dans ce contexte, votre note de cadrage présentera **une première estimation de charges**. Dans le cadre d'un **projet interne**, elle pourra indifféremment être présentée en **jours-personnes** ou **valorisée** financièrement.

Dans le cadre d'un **projet externalisé**, la note de cadrage étant généralement produite par le prestataire, la construction du budget prévisionnel équivaut à une **proposition de cadre budgétaire**. Il sera donc **important de mentionner le budget**, mais il sera naturellement **amené à évoluer** au cours des étapes suivantes de la phase avant-projet et pourra faire l'objet de **négociations**. Il sera donc construit **dans les grandes lignes**, en se basant sur le **périmètre fonctionnel** comme **référentiel** de la portée du projet.

Toutefois, le **périmètre projet** ne donnera que des informations sur **les productions à réaliser**. Ce sera **insuffisant pour estimer le coût global** du projet. Vous devrez également tenir compte :

- **Des achats éventuels** à réaliser, vous pourrez éventuellement prévoir des « ***provisions*** », comme pour de l'achat d'art par exemple.
- **Des coûts liés à la gouvernance**. Les réunions, c'est du temps passé par des profils identifiés, et donc elles représentent une **valeur facturable**.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- **Des coûts de pilotage** : le chef de projet contribuera largement au projet, mais comme il n'intervient **pas directement** dans la production, on estimera sa charge **en fonction d'un ratio**. Le travail effectué par le chef de projet sera équivalent, selon l'organisation à laquelle il appartient, à **15 à 30 % du temps passé par les ressources productives**. Ainsi, une fois que vous aurez défini vos charges de production, vous devrez **ajouter au budget** ce pourcentage de pilotage de projet.

Le **budget prévisionnel** présenté dans la note de cadrage ne sera **pas détaillé**, mais présentera les **postes principaux**. Il sera formalisé sous forme d'un **tableau de synthèse**, permettant une **perception rapide** de **l'affectation des charges.**

Une **bonne pratique** consiste à reprendre les **grandes phases** identifiées **dans la roadmap** projet afin d'en **faciliter la compréhension.**

Exemple

Voici comment nous pourrions présenter un **budget prévisionnel** dans une note de cadrage. Nous nous appuyons ici sur le **macro-planning présenté plus haut.**

Budget prévisionnel

Charges	Coût estimé
Initialisation et coordination du projet	**5.500 €**
Pilotage projet (20%)	**13.200 €**
Conception fonctionnelle et ateliers	**8.000 €**
Création graphique	**5.000 €**
Provision pour achat d'art	**1.500 €**
Intégration et développement	**39.000 €**
Accompagnement Analytics	**3.000 €**
Accompagnement SEO	**4.000 €**
Tests et recette	**7.800 €**
Total projet	**87.000 €**

Montants Hors Taxes

Ce budget prévisionnel pourrait aussi comporter les **charges globales** en j/h (jours / personnes). Notez que parfois, un **budget détaillé** pourra vous être demandé **dès la note de cadrage**. Dans cette hypothèse, vous pourrez présenter la **synthèse budgétaire** dans le document de cadrage et vous placerez le **budget détaillé** en **annexe**.

Remarque

L'opportunité de **présenter des informations budgétaires dans la note de cadrage** sera **liée au contexte** de votre projet. En particulier, **dans le cadre d'une relation commanditaire - prestataire** donnant lieu à une **consultation** (un appel d'offres), il ne sera **pas du tout pertinent** de communiquer une enveloppe budgétaire aux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

répondants : vous risqueriez de ne recevoir, comme par hasard, que des propositions correspondant à votre budget ! Mieux vaudra alors **ne pas aborder le budget** dans la note de cadrage si elle est communiquée aux soumissionnaires en guise d'expression de besoin.

Le budget présenté, votre note de cadrage est maintenant **terminée** ! Vous aurez, dans ce **document de synthèse**, présenté l'ensemble des **données indispensables** caractérisant votre projet.

Exercice : Quiz

[solution n°3 p.34]

Question 1

Dans une note de cadrage, comment présente-t-on une **organisation projet** ? (Une seule réponse juste)

- ○ Par une méthode projet et une gouvernance
- ○ Par un planning et une équipe
- ○ Par une équipe et une gouvernance

Question 2

Quels sont les **objectifs visés** par la présentation d'un **organigramme d'équipe** ? (Plusieurs réponses possibles)

- ☐ Définir des collaborations plus efficaces en tenant compte des affinités
- ☐ Pour un projet interne, identifier les ressources qui seront nécessaires
- ☐ Rassurer sur la capacité de l'équipe projet pressentie à réaliser la solution
- ☐ Matérialiser un processus d'escalade en cas de difficulté en cours de projet

Question 3

« *La **gouvernance** décrit un **cadre** pour faciliter la **prise de décision** en cours de projet.* » Vrai ou faux ? (Une seule réponse juste)

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 4

Parmi les affirmations ci-dessous concernant le **budget, identifiez celle qui est FAUSSE**. (Une seule réponse juste)

- ○ Dans le cas où le budget du projet est imposé, il ne sera pas détaillé, mais devra être précisé dans la note de cadrage pour guider le choix de la solution
- ○ On n'oubliera pas de tenir compte des coûts liés à la gouvernance et au pilotage du projet dans la construction du budget
- ○ Il est important pour structurer le projet et éviter les mauvaises surprises de présenter systématiquement un budget détaillé
- ○ La note de cadrage présente un budget prévisionnel par grands postes, et si le contexte projet le rend nécessaire un budget détaillé sera placé en annexe

Question 5

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Les **rendez-vous réguliers importants**, comme les comités de pilotage par exemple, seront **matérialisés dans la roadmap** projet. Vrai ou faux ? (Une seule réponse juste)

- ○ Vrai
- ○ Faux

VII. Auto-évaluation

A. Exercice : Cas Tartempion

Dans le cadre du **projet des chewing-gums Tartempion** que nous avons utilisé en exemple dans ce cours, **Amaury**, le chef de projet, a réalisé cette **gouvernance** pour la présenter dans sa note de cadrage. Il s'est inspiré du modèle présenté dans ce cours :

EXERCICE ACTIVITÉ

SUIVI DE PRODUCTION			Niveau OPÉRATIONNEL
Explication : • Points et échanges quotidiens entre le chef de projet client (MOE) et le chef de projet prestataire (MOA). • Gestion des décisions mineures sans impact sur les objectifs CQD • Production effectuée sur la base de briefs rédigés	*Format :* **Réunions physiques** *Modalités :* • **Réunions régulières à l'agence** • **Briefs formalisés** • **Mails de livraison** *Fréquence :* **Quotidienne**	*Participants concernés :* • **Le chef de projet client** • **Le chef de projet prestataire**	*Livrables et archivage :* • **E-mails** • **Briefs formalisés pour les ressources**
PILOTAGE DE PROJET			**DÉCISIONNAIRE**
Explication : • Réaliser les démonstrations intermédiaires. • Présenter l'avancement projet, le reporting financier et les problèmes éventuels. • Réaliser les priorisations stratégiques. • Effectuer les arbitrages technologiques, fonctionnels, de délais ou financiers sur proposition de l'équipe projet.	*Format :* **Réunions physiques** *Modalités :* • **Chez le client** *Fréquence :* **Mensuelle,** **Planifiée selon livrables clés**	*Participants concernés :* • **Le chef de projet client** • **Le chef de projet prestataire** • **Alice, directrice de clientèle** • **Les responsables de pôle concernés selon la phase projet**	*Livrables et archivage :* • **Tableau de bord projet** • **Support de présentation** • **Démonstrations éventuelles** • **Compte-rendu de réunion**

Question

[solution n°4 p.35]

Pouvez-vous identifier les éventuelles omissions et erreurs commises par Amaury ?

B. Test

Exercice 1 : Quiz

[solution n°5 p.35]

Question 1

Parmi les propositions suivantes, **quels sont les objectifs** de la note de cadrage ? (Plusieurs réponses possibles)

- ☐ Structurer l'expression de besoin par le commanditaire
- ☐ Sécuriser le périmètre de réalisation pour un prestataire
- ☐ Confirmer la faisabilité du projet
- ☐ Partager une vue d'ensemble avec les contributeurs ponctuels au projet

Question 2

Quand le **prestataire prend en charge la rédaction** de la note de cadrage, quel est l'intérêt de **présenter le besoin** ? (Une seule réponse juste)

- ○ Justifier dès le début du projet une proposition financière détaillée
- ○ Démontrer la bonne compréhension du besoin exprimé par le commanditaire
- ○ Garder la main sur le projet pour pouvoir en maîtriser les objectifs CQD

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 3

À la suite de votre demande pour intégrer une fonctionnalité mineure (une pagination à la place d'une liste sans fin), le chef de projet **côté prestataire** vous répond par la négative. Pour lui c'est « ***hors scope*** ». Qu'est-ce que cela veut dire ? (Une seule réponse juste)

- « *Ce n'était pas clair dans votre expression de besoin, c'est trop tard maintenant !* »
- « *Cette fonctionnalité ne fait pas partie du périmètre fonctionnel, elle n'est donc pas prévue et ne sera pas réalisée.* »
- « *Elle ne répond à aucun objectif opérationnel de l'arbre d'objectifs, il n'y a donc aucun intérêt à la réaliser.* »
- « *Mercure est en bélier, ce n'est pas la meilleure configuration astrale pour réaliser cette modification !* »

Question 4

Quelles **informations** devriez-vous **intégrer dans un organigramme d'équipe** ? (Plusieurs réponses possibles)

- ☐ Les relations hiérarchiques
- ☐ Les points de contact client
- ☐ Les relations de coordination
- ☐ Les relations de collaboration

Question 5

Quel **format de projection du projet dans le temps** sera **le plus adapté** dans une note de cadrage ? (Une seule réponse juste)

- Le macroplanning
- Le planning détaillé
- Le diagramme de Gantt
- Le microplanning
- Une simple liste de dates clés

Exercice 7 : Quiz

[solution n°6 p.37]

Question 1

Pour préciser le besoin et donner **une vue d'ensemble du projet**, nous vous avons présenté le **QQOQCCP**. Choisissez la lettre correspondante aux propositions suivantes :

- Réalisation d'un site internet e-commerce de vente en ligne de lessive, à la commande ou par abonnement,
- Conception et mise en œuvre d'une stratégie digitale globale.

- Q
- O
- C
- P

Question 2

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Pour préciser le besoin et donner **une vue d'ensemble du projet**, nous vous avons présenté le **QQOQCCP**. Choisissez la lettre correspondante aux propositions suivantes :

- La société TouDou, commanditaire du projet, représentée par M. Alphonse - Président fondateur,
- Franck, Chef de projet, agence digitale prestataire,
- Société d'hébergement (OVH).

- Q
- O
- C
- P

Question 3

Pour préciser le besoin et donner **une vue d'ensemble du projet**, nous vous avons présenté le **QQOQCCP**. Choisissez la lettre correspondante aux propositions suivantes :

- Pilotage projet, conception et création, à l'agence digitale,
- Développements techniques filiale Tunisie,
- Hébergement en France.

- Q
- O
- C
- P

Question 4

Pour préciser le besoin et donner **une vue d'ensemble du projet**, nous vous avons présenté le **QQOQCCP**. Choisissez la lettre correspondante aux propositions suivantes :

- Durée prévisionnelle projet : 5 mois,
- Ateliers de conception : 1re semaine de juin,
- Présentation des créations aux actionnaires : 24 juillet.

- Q
- O
- C
- P

Question 5

Pour préciser le besoin et donner **une vue d'ensemble du projet**, nous vous avons présenté le **QQOQCCP**. Choisissez la lettre correspondante aux propositions suivantes :

- Méthode projet en cascade, validation des livrables de chaque étape nécessaire pour lancer la suivante,
- Réunions de suivi (comités de pilotage) mensuelles,
- Développements techniques itératifs, 2 démonstrations intermédiaires,
- Technologies employées : PHP, socle CMS e-commerce (Prestashop pressenti).

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- Q
- O
- C
- P

Question 6

Pour préciser le besoin et donner **une vue d'ensemble du projet**, nous vous avons présenté le **QQOQCCP**. Choisissez la lettre correspondante aux propositions suivantes :

- Budget global projet : 75k €,
- Production de contenu : 20k €,
- Affectation chef de projet MOA : 100 % de mai à juillet, 50 % d'août à octobre.

- Q
- O
- C
- P

Question 7

Pour préciser le besoin et donner **une vue d'ensemble du projet**, nous vous avons présenté le **QQOQCCP**. Choisissez la lettre correspondante aux propositions suivantes :

- Créer la notoriété de la marque (20 % en citation spontanée 6 mois après le lancement),
- Générer 50k € de CA / semestre sur le site.

- Q
- O
- C
- P

VIII. Essentiel

Fondamental

La **note de cadrage** est un **document de référence** présentant toutes les **informations essentielles** à connaître **avant d'aborder la réalisation** d'un projet. Elle fait suite à l'étude d'opportunité dont elle constitue **la synthèse**. La note de cadrage est d'autant plus importante qu'elle sera **partagée avec tous les acteurs** du projet. **Émise** ou **validée** par le **commanditaire**, elle présentera les **objectifs** et **enjeux** du projet aux équipes de réalisations, qu'elles soient permanentes ou temporaires.

Document de **cadrage**, elle détaillera **ce qui doit être fait** sans préciser ***comment*** cela devra être réalisé.

S'appuyant sur le besoin à l'origine du projet, on en précisera le **contexte**, et **l'environnement**, les **cibles** visées et les **contraintes**. L'ensemble de ces informations pourra être résumé dans une **matrice SWOT** pour présenter rapidement les aspects **positifs** et **négatifs** du projet et de son environnement. Afin de **préciser les objectifs** à atteindre, un outil comme **l'arbre d'objectifs** aidera à comprendre **la portée du projet** et en **légitimera** la nature.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

La note de cadrage présentera également **les grandes lignes de la solution** envisagée. On privilégiera les **outils de synthèse** : un **QQOQCCP**, pour un questionnement systématique, vous aidera à lister **toutes les caractéristiques** du projet de façon **concise** et **lisible**, tandis que le **périmètre fonctionnel** vous permettra de **définir les réalisations à venir** et d'y **poser des limites claires**. Ce sera aussi un outil utile aux **estimations de charges.**

Enfin, la note de cadrage dévoilera **l'organisation projet**. En définissant une **équipe** et une **gouvernance**, vous indiquerez les **acteurs mobilisés** et définirez un **cadre organisationnel** qui posera les principes de la **circulation de l'information** au sein du groupe projet.

Pour ancrer le projet dans la réalité, la **feuille de route** (ou **macro-planning**) projettera dans le temps les **grandes étapes** prévues pour le projet et mettra en lumière les **principaux jalons**. Pour compléter, un **budget prévisionnel** sera utile pour appréhender les **charges** nécessaires.

La **note de cadrage** présente ainsi toutes les **informations structurantes** du projet et constitue le **socle** du **futur cahier des charges.**

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 9 Solution n°1

Question 1

À quel moment du cycle projet rédige-t-on une note de cadrage ? (Une seule réponse juste)

- ○ Avant l'étude d'opportunité, pour formuler le besoin
- ◉ Après l'étude d'opportunité, dont elle constitue le livrable
- ○ Après la rédaction du cahier des charges

Dans un cycle projet classique, la note de cadrage peut constituer le livrable de l'étude d'opportunité. Elle sera donc rédigée après cette analyse du besoin.

Question 2

La **note de cadrage** doit **définir avec précision** comment la solution sera développée. En cela, elle permet de **sécuriser le déroulement** du projet. (Une seule réponse juste)

- ○ Vrai
- ◉ Faux

C'est faux. La note de cadrage présente les informations essentielles pour décrire le projet, mais n'en précisera jamais les détails de réalisation. Même si la solution peut être esquissée dans une note de cadrage afin de pouvoir comprendre la portée du projet, elle a vocation à définir le « *quoi* » sans jamais expliciter le « *comment* ».

Question 3

À quoi sert la présentation d'une ***persona*** dans une note de cadrage ? (Plusieurs réponses possibles)

- ☑ Présenter de façon concise un groupe d'utilisateurs cibles
- ☑ Incarner la demande identifiée dans l'étude de marche
- ☐ Aider les développeurs à s'adapter à l'environnement technologique des utilisateurs

Dans la note de cadrage, les *personas* prennent place dans la présentation du contexte projet, et en particulier pour représenter la demande type sur le marché étudié. Pour être explicites sur le besoin côté utilisateur, elles présenteront leurs attentes et leurs freins. En revanche, les informations liées aux technologies sont présentées pour témoigner d'un usage et justifier les supports qui seront déployés dans le projet. Elles ne contiennent pas de détails précis pouvant guider les développeurs.

Question 4

Dans la **description du besoin**, pourquoi pourrez-vous utiliser une **matrice SWOT** ? (Une seule réponse juste)

- ◉ Pour mettre en lumière les opportunités et menaces auxquelles le résultat du projet sera confronté
- ○ Pour rendre visibles et compréhensibles les KPI associés aux objectifs stratégiques du projet
- ○ Pour présenter de manière condensée l'ensemble des acteurs impliqués dans le projet

Le SWOT est un outil marketing utilisé pour présenter de façon concise à la fois les caractéristiques d'un produit (ses forces - S et faiblesses - W) et celles de son environnement (les opportunités - O et menaces - T). Comme il aura pu être utilisé dans l'étude d'opportunité, on pourra le reprendre dans la note de cadrage pour éclairer la description de l'environnement du projet.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 5

Dans un **arbre d'objectifs**, à partir de quel type d'objectifs pourra-t-on imaginer les **fonctionnalités** possibles ? (Une seule réponse juste)

- ○ Les objectifs généraux
- ○ Les objectifs secondaires
- ◉ Les objectifs opérationnels
- ○ Les objectifs SMART

L'objectif général est celui qui se place tout en haut de l'arbre d'objectifs. Il est issu de l'étude d'opportunité et sera rédigé de façon SMART afin qu'il soit utilisable. Il donnera naissance à des objectifs secondaires, qui éventuellement déboucheront sur des objectifs intermédiaires. De chacun de ces derniers, on fera émerger des objectifs opérationnels. Ce sont eux qui donneront naissance aux fonctionnalités que le résultat du projet devra intégrer.

Exercice p. 17 **Solution n°2**

Question 1

Quels sont les **outils utiles** pour présenter **l'esquisse de la solution** envisagée ? (Plusieurs réponses possibles)

- ☐ Un outil de mind mapping
- ☑ Le QQOQCCP
- ☐ L'arbre d'objectifs
- ☑ Le périmètre fonctionnel
- ☐ Le CQOQOCP

Si le « *CQOQOCP* » n'existe pas (!), le QQOQCCP aidera à présenter les caractéristiques générales du projet de façon concise et structurée en répondant aux questions essentielles permettant de le décrire. Le périmètre fonctionnel décrira les fonctionnalités envisagées dans la solution. Elles peuvent être identifiées à la suite de la réalisation d'un arbre d'objectifs, mais ce dernier a vocation à présenter un besoin, du point de vue du commanditaire. Les outils de mind mapping sont utilisés dans de nombreux contextes, mais ne seront pas très adaptés à la présentation d'une solution.

Question 2

Dans **quelle(s) section(s) du QQOQCCP** pourriez-vous indiquer si la réalisation sera **en partie sous-traitée** ? (Plusieurs réponses possibles)

- ☐ Q
- ☑ Q
- ☑ O
- ☐ Q
- ☐ C
- ☐ C
- ☐ P

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

La sous-traitance éventuelle, si elle est connue, doit être précisée dans le QQOQCCP. On identifiera les acteurs dans la seconde section, le « *Qui* ». On pourra également préciser quelle portion du projet ou quels sous-chantiers seront externalisés dans le « *Où* ».

Question 3

Vous devez **compléter un QQOQCCP** pour votre note de cadrage. Mais les **informations financières** concernant les **coûts des ressources** ne vous sont **pas accessibles**. Comment dans ce cas allez-vous pouvoir compléter la section « ***Combien*** » ? (Une seule réponse juste)

- ○ Je ne la complète pas, puisque je ne peux pas indiquer d'informations chiffrées
- ○ Je cherche les prix des ressources sur le Net pour pouvoir indiquer une estimation malgré tout
- ◉ Je n'indique pas de montants en Euros, à la place je précise des nombres de jours estimés par métier

Le « *Combien* » peut être précisé en indiquant des volumes en jours / hommes, c'est-à-dire des quantités de travail estimées pour chaque type de ressource impliqué dans le projet. L'important dans cette section du QQOQCCP est d'indiquer l'effort nécessaire pour mener à bien le projet. N'inventez jamais des montants financiers, ni dans une note de cadrage ni ailleurs. En revanche, l'effort nécessaire est indispensable à connaître, car il incarnera l'axe « *Coûts* » de votre projet (le « *C* » de votre triangle CQD).

Question 4

À quoi sert un **périmètre fonctionnel** ? (Plusieurs réponses possibles)

- ☐ Détailler les fonctionnalités à réaliser pour guider les développements
- ☑ Représenter le volume du projet, en notamment le nombre de gabarits envisagés
- ☑ Lister les fonctionnalités essentielles envisagées
- ☑ Estimer plus facilement les charges nécessaires à la réalisation du projet
- ☐ Indiquer les dates de livraison pour les différents chantiers du projet

Le périmètre fonctionnel présente de façon condensée ce qui devra être réalisé dans le cadre du projet, en listant les différentes fonctionnalités de la solution digitale envisagée. Par sa structure, il indiquera également le nombre d'écrans types (ou gabarits) prévus. Ces deux informations faciliteront grandement les estimations de charges à produire en ce début de projet. Toutefois, ces fonctionnalités ne seront pas détaillées pour le moment, les spécifications fonctionnelles y pourvoiront plus tard dans le cycle projet. Enfin, un périmètre fonctionnel n'indique aucune date précise de livraison.

Question 5

De **quel(s) métier(s)** pourrez-**vous estimer les charges** à l'aide d'un **périmètre fonctionnel** ? (Plusieurs réponses possibles)

- ☑ Les créatifs
- ☑ Les développeurs
- ☐ Le chef de projet
- ☐ Le directeur de clientèle

L'effort à produire par les ressources productives (créatifs et développeurs) pourra être estimé sur la base du périmètre fonctionnel. Les créatifs tiendront compte du nombre de gabarits envisagés, les développeurs se concentreront sur les fonctionnalités et le nombre d'écrans types. Les profils commerciaux (directeur de clientèle par exemple) et de coordination (chef de projet) seront bien entendu impactés par la volumétrie du projet, mais d'autres éléments interviendront pour l'estimation de leurs charges.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 25 **Solution n°3**

Question 1

Dans une note de cadrage, comment présente-t-on une **organisation projet** ? (Une seule réponse juste)

- ○ Par une méthode projet et une gouvernance
- ○ Par un planning et une équipe
- ◉ Par une équipe et une gouvernance

L'organisation projet sera présentée dans la note de cadrage au travers de deux éléments essentiels : la présentation de l'équipe en charge du projet et la gouvernance qui en assurera le bon déroulement. La méthode pourra éventuellement être rapidement décrite dans la gouvernance.

Question 2

Quels sont les **objectifs visés** par la présentation d'un **organigramme d'équipe** ? (Plusieurs réponses possibles)

- ☐ Définir des collaborations plus efficaces en tenant compte des affinités
- ☑ Pour un projet interne, identifier les ressources qui seront nécessaires
- ☑ Rassurer sur la capacité de l'équipe projet pressentie à réaliser la solution
- ☑ Matérialiser un processus d'escalade en cas de difficulté en cours de projet

La présentation de l'équipe projet sous forme d'organigramme permet de présenter de manière compacte l'ensemble des intervenants directs. En interne, c'est un bon moyen de mettre en évidence le besoin de ressources. Pour un projet externalisé, il confirmera l'adéquation de l'équipe avec les besoins du projet et rassurera le commanditaire. En présentant les relations hiérarchiques, il matérialisera un processus d'escalade. Les affinités individuelles n'ont pas de lien ni avec les besoins du projet ni avec cet outil de présentation.

Question 3

« *La **gouvernance** décrit un **cadre** pour faciliter la **prise de décision** en cours de projet.* » Vrai ou faux ? (Une seule réponse juste)

- ◉ Vrai
- ○ Faux

C'est vrai. La gouvernance décrit comment l'information circulera en cours de projet, au travers de quelles instances et identifiera des profils décisionnaires. Même si ce n'est pas son seul objectif, en posant un cadre organisationnel clair, la gouvernance facilite la prise de décision en cours de projet afin de fluidifier la production.

Question 4

Parmi les affirmations ci-dessous concernant le **budget, identifiez celle qui est FAUSSE**. (Une seule réponse juste)

- ○ Dans le cas où le budget du projet est imposé, il ne sera pas détaillé, mais devra être précisé dans la note de cadrage pour guider le choix de la solution
- ○ On n'oubliera pas de tenir compte des coûts liés à la gouvernance et au pilotage du projet dans la construction du budget
- ◉ Il est important pour structurer le projet et éviter les mauvaises surprises de présenter systématiquement un budget détaillé

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- La note de cadrage présente un budget prévisionnel par grands postes, et si le contexte projet le rend nécessaire un budget détaillé sera placé en annexe

La note de cadrage sert à « *cadrer* » le projet. Quand le budget est imposé, il sera important de le préciser, mais comme le commanditaire n'est généralement pas en charge de la réalisation, il saura quel montant il peut dépenser, pas nécessairement comment le répartir. Quand il s'agit d'un projet externalisé, le budget présenté ne sera généralement pas détaillé. Il présentera les grands postes envisagés et pourra être affiné par la suite. Un budget détaillé peut toutefois être requis dans certains cas, à la demande du commanditaire, mais la réalisation n'étant pas encore définie avec précision, il ne pourra être qu'estimatif.

Question 5

Les **rendez-vous réguliers importants**, comme les comités de pilotage par exemple, seront **matérialisés dans la roadmap** projet. Vrai ou faux ? (Une seule réponse juste)


- (•) Vrai
- ( ) Faux

La roadmap projet doit permettre une compréhension immédiate des étapes et des événements clés prévus en cours de projet. Si tous les rendez-vous de la gouvernance n'ont pas à apparaître, les réunions structurantes comme les comités de pilotage dans lesquels des décisions importantes seront prises devraient y figurer. Par ailleurs, comme ces réunions impliquent la présence de décisionnaires, il sera capital que ces derniers puissent les anticiper.

p. 26 **Solution n°4**

Ce projet est relativement simple, Amaury a fait le choix d'une gouvernance à deux niveaux seulement, ce qui semble suffisant vu la portée de ce projet.

Dans les deux strates de gouvernance présentées, des erreurs et oublis sont cependant à identifier :

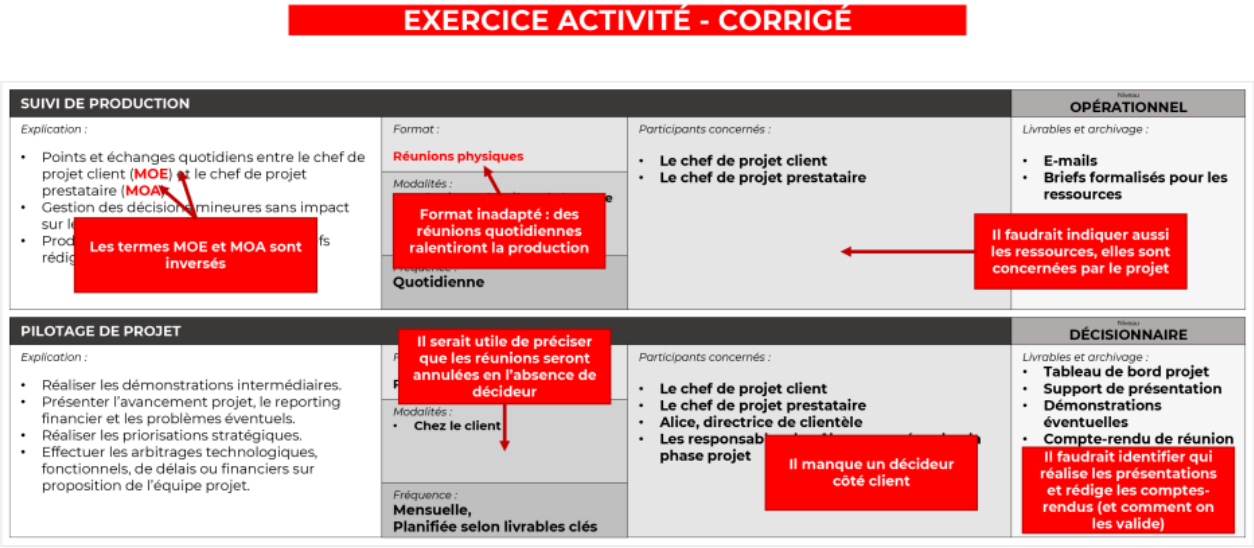

Exercice p. 26 **Solution n°5**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 1

Parmi les propositions suivantes, **quels sont les objectifs** de la note de cadrage ? (Plusieurs réponses possibles)

- [x] Structurer l'expression de besoin par le commanditaire
- [x] Sécuriser le périmètre de réalisation pour un prestataire
- [ ] Confirmer la faisabilité du projet
- [x] Partager une vue d'ensemble avec les contributeurs ponctuels au projet

La note de cadrage est un document de synthèse qui permettra à la fois au commanditaire d'exprimer son besoin de façon structurée et au prestataire de border son périmètre de prestation en levant les ambiguïtés sur ce qu'il prendra en charge. Comme elle reprendra les éléments fondateurs du projet, ce sera un bon support pour partager les enjeux du projet avec des intervenants ponctuels. Ce document n'est pas conçu pour évaluer la faisabilité du projet.

Question 2

Quand le **prestataire prend en charge la rédaction** de la note de cadrage, quel est l'intérêt de **présenter le besoin** ? (Une seule réponse juste)

- ○ Justifier dès le début du projet une proposition financière détaillée
- ◉ Démontrer la bonne compréhension du besoin exprimé par le commanditaire
- ○ Garder la main sur le projet pour pouvoir en maîtriser les objectifs CQD

La reformulation du besoin dans une note cadrage rédigée par un prestataire permettra de démontrer au client que son besoin a bien été compris et analyse. En faisant cela, le prestataire envoie un message positif au commanditaire en lui démontrant que, son besoin assimilé, la solution proposée contribuera effectivement à le satisfaire.

Question 3

À la suite de votre demande pour intégrer une fonctionnalité mineure (une pagination à la place d'une liste sans fin), le chef de projet **côté prestataire** vous répond par la négative. Pour lui c'est « ***hors scope*** ». Qu'est-ce que cela veut dire ? (Une seule réponse juste)

- ○ « *Ce n'était pas clair dans votre expression de besoin, c'est trop tard maintenant !* »
- ◉ « *Cette fonctionnalité ne fait pas partie du périmètre fonctionnel, elle n'est donc pas prévue et ne sera pas réalisée.* »
- ○ « *Elle ne répond à aucun objectif opérationnel de l'arbre d'objectifs, il n'y a donc aucun intérêt à la réaliser.* »
- ○ « *Mercure est en bélier, ce n'est pas la meilleure configuration astrale pour réaliser cette modification !* »

Le périmètre fonctionnel sert à présenter de façon unifiée ce que l'on prévoit de réaliser en cours de projet. Tout ce qui est décrit dans ce périmètre est bien prévu et sera fait, c'est dans le « *scope* » du projet. En revanche, tout ce qui ne sera pas explicitement précisé dans le périmètre fonctionnel ne sera pas prévu ; ce sera « *hors scope* ». L'arbre d'objectifs présente comment satisfaire les attentes du commanditaire, avec un impact fonctionnel. Mais il ne permettra pas d'aboutir à toutes les fonctionnalités requises qui elles seront rassemblées dans le périmètre fonctionnel.

Question 4

Quelles **informations** devriez-vous **intégrer dans un organigramme d'équipe** ? (Plusieurs réponses possibles)

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- [x] Les relations hiérarchiques
- [x] Les points de contact client
- [ ] Les relations de coordination
- [x] Les relations de collaboration

L'organigramme d'équipe est conçu pour présenter une vision d'ensemble de l'équipe mobilisée pour le projet. Les relations entre ses membres sont importantes à matérialiser pour en comprendre le fonctionnement. Les relations hiérarchiques et de collaboration y figureront donc naturellement. Les points de contact pour le client seront également utiles. En revanche, et par définition, le coordinateur du projet sera amené à interagir avec tous les profils. On ne représentera pas ces liens au risque de rendre le graphique totalement illisible.

Question 5

Quel **format de projection du projet dans le temps** sera **le plus adapté** dans une note de cadrage ? (Une seule réponse juste)

- (●) Le macroplanning
- ( ) Le planning détaillé
- ( ) Le diagramme de Gantt
- ( ) Le microplanning
- ( ) Une simple liste de dates clés

Le macro-planning, ou raodmap projet, sera parfaitement adapté à la note de cadrage. Il présentera les grandes phases et les jalons principaux du projet. À ce stade, il serait prématuré de construire un planning détaillé, représenté par le diagramme de Gantt. Une simple liste de dates ne facilitera pas la compréhension du déroulement du projet. Le microplanning quant à lui n'existe pas.

Exercice p. 27 **Solution n°6**

Question 1

Pour préciser le besoin et donner **une vue d'ensemble du projet**, nous vous avons présenté le **QQOQCCP**. Choisissez la lettre correspondante aux propositions suivantes :

- Réalisation d'un site internet e-commerce de vente en ligne de lessive, à la commande ou par abonnement,
- Conception et mise en œuvre d'une stratégie digitale globale.

- (●) Q
- ( ) O
- ( ) C
- ( ) P

Le QQOQCCP est un moyen mnémotechnique de n'oublier aucune des questions essentielles pour décrire un projet : Quoi ? Qui ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Pour quoi ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 2

Pour préciser le besoin et donner **une vue d'ensemble du projet**, nous vous avons présenté le **QQOQCCP**. Choisissez la lettre correspondante aux propositions suivantes :

- La société TouDou, commanditaire du projet, représentée par M. Alphonse - Président fondateur,
- Franck, Chef de projet, agence digitale prestataire,
- Société d'hébergement (OVH).

- (●) Q
- ( ) O
- ( ) C
- ( ) P

Le QQOQCCP est un moyen mnémotechnique de n'oublier aucune des questions essentielles pour décrire un projet : Quoi ? Qui ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Pour quoi ?

Question 3

Pour préciser le besoin et donner **une vue d'ensemble du projet**, nous vous avons présenté le **QQOQCCP**. Choisissez la lettre correspondante aux propositions suivantes :

- Pilotage projet, conception et création, à l'agence digitale,
- Développements techniques filiale Tunisie,
- Hébergement en France.

- ( ) Q
- (●) O
- ( ) C
- ( ) P

Le QQOQCCP est un moyen mnémotechnique de n'oublier aucune des questions essentielles pour décrire un projet : Quoi ? Qui ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Pour quoi ?

Question 4

Pour préciser le besoin et donner **une vue d'ensemble du projet**, nous vous avons présenté le **QQOQCCP**. Choisissez la lettre correspondante aux propositions suivantes :

- Durée prévisionnelle projet : 5 mois,
- Ateliers de conception : 1re semaine de juin,
- Présentation des créations aux actionnaires : 24 juillet.

- (●) Q
- ( ) O
- ( ) C
- ( ) P

Le QQOQCCP est un moyen mnémotechnique de n'oublier aucune des questions essentielles pour décrire un projet : Quoi ? Qui ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Pour quoi ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 5

Pour préciser le besoin et donner **une vue d'ensemble du projet**, nous vous avons présenté le **QQOQCCP**. Choisissez la lettre correspondante aux propositions suivantes :

- Méthode projet en cascade, validation des livrables de chaque étape nécessaire pour lancer la suivante,
- Réunions de suivi (comités de pilotage) mensuelles,
- Développements techniques itératifs, 2 démonstrations intermédiaires,
- Technologies employées : PHP, socle CMS e-commerce (Prestashop pressenti).

- ○ Q
- ○ O
- ◉ C
- ○ P

Le QQOQCCP est un moyen mnémotechnique de n'oublier aucune des questions essentielles pour décrire un projet : Quoi ? Qui ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Pour quoi ?

Question 6

Pour préciser le besoin et donner **une vue d'ensemble du projet**, nous vous avons présenté le **QQOQCCP**. Choisissez la lettre correspondante aux propositions suivantes :

- Budget global projet : 75k €,
- Production de contenu : 20k €,
- Affectation chef de projet MOA : 100 % de mai à juillet, 50 % d'août à octobre.

- ○ Q
- ○ O
- ◉ C
- ○ P

Le QQOQCCP est un moyen mnémotechnique de n'oublier aucune des questions essentielles pour décrire un projet : Quoi ? Qui ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Pour quoi ?

Question 7

Pour préciser le besoin et donner **une vue d'ensemble du projet**, nous vous avons présenté le **QQOQCCP**. Choisissez la lettre correspondante aux propositions suivantes :

- Créer la notoriété de la marque (20 % en citation spontanée 6 mois après le lancement),
- Générer 50k € de CA / semestre sur le site.

- ○ Q
- ○ O
- ○ C
- ◉ P

Le QQOQCCP est un moyen mnémotechnique de n'oublier aucune des questions essentielles pour décrire un projet : Quoi ? Qui ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Pour quoi ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite
