Le cahier des charges fonctionnel : l'organisation du projet

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Définir un cadre pour l'organisation projet **3**

A. Partager la méthode projet 3
1. Présenter la méthode 3
2. Justifier la méthode 5

B. Présenter l'équipe 6

II. Exercice : Quiz **8**

III. Prévoir le fonctionnement en cours de projet **9**

A. Définir la gouvernance 9
1. Le niveau opérationnel : au quotidien, pouvoir suivre la production 9
2. Le niveau de la coordination : faciliter la conduite de projet 10
3. Le niveau stratégique : arbitrer et prendre des décisions 11

B. Présenter les outils pour fonctionner 11
1. Des outils pour faciliter le travail de l'équipe 12
2. Des outils pour simplifier la relation avec le commanditaire 13

C. Veiller au suivi des risques 15

IV. Exercice : Quiz **16**

V. Essentiel **17**

VI. Auto-évaluation **17**

Solutions des exercices **20**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Définir un cadre pour l'organisation projet

Contexte

Le **cahier des charges fonctionnel** propose, avant toute chose, de **décrire la solution attendue** à l'issue du projet. Mais c'est aussi **un document socle** pour en **définir l'organisation**, c'est-à-dire quelle **méthode** sera employée, quelle **équipe** sera mobilisée et quelles en seront **les règles de fonctionnement**.

Au travers de la **présentation du contexte et du besoin**, votre cahier des charges **détaille les raisons d'être** du projet. En **présentant la solution**, il précise le « ***quoi*** », ce qui sera réalisé. En **décrivant l'organisation** projet, vous allez vous concentrer sur le « ***comment*** ».

Une fois cette **organisation définie dans le cahier des charges**, tous les acteurs **connaîtront les règles du jeu**, sauront facilement **identifier leurs rôles** et **quels outils** seront mis à leur disposition **pour réussir le projet**.

Dans ce cours, nous allons vous présenter **comment intégrer toutes ces informations structurantes** à votre cahier des charges fonctionnel.

L'équipe et la **gouvernance** sont **le cœur de l'organisation projet**. La première **incarne l'énergie** que vous allez **mobiliser** pour **parvenir au résultat attendu**. La seconde désigne **la « *machinerie* »** de votre organisation, **son fonctionnement et ses rouages**. Mais **avant de désigner les acteurs** et de **présenter les modes de fonctionnement**, vous allez devoir **expliquer**, même rapidement, **la méthode choisie** pour mener à bien le projet.

A. Partager la méthode projet

Il y a, dans les faits, **presque autant de méthodes que de projets menés**. De **très nombreuses approches** existent, certaines **déclinées en méthodes** plus ou moins proches.

Chaque structure, chaque **équipe projet**, va **déployer et faire évoluer** au cours du temps **des outils et des processus qui lui sont propres**. Dans les grandes lignes, un projet va se dérouler **en suivant les mêmes étapes**, mais la « **façon de faire** », les **processus internes**, les **modèles** utilisés au sein des équipes vont être **très spécifiques**.

Un projet réunit le plus souvent **un grand nombre d'acteurs** ; pour eux, il faudra **présenter la méthode employée** afin qu'ils puissent **l'assimiler** et **contribuer efficacement** au projet. Ce sera **aussi** utile **pour le commanditaire**, s'il n'a pas l'habitude de travailler avec votre équipe.

1. Présenter la méthode

La **gestion de projet** se structure autour de **deux grandes approches** assez différentes.

- Les **approches descendantes**, traditionnelles, qui visent à **décrire la solution** dans ses moindres détails **avant** d'entamer la réalisation. Elles permettent de **décrire précisément les attendus**, ce qui **facilite la production** (on sait **ce qu'il y a à faire**, en détails), **sécurise les estimations** (comme la solution est définie, **l'effort** est **plus facile à évaluer**), et **simplifie la réception** du produit en fin de projet (on pourra sans équivoque **en vérifier la conformité**, sur une base fiable).

  La contrepartie, c'est qu'il sera **très compliqué de faire évoluer la solution** en cours de réalisation.
- Les **approches ascendantes**, ou **agiles**, sont, elles, **très séduisantes**. Plutôt que de décrire la solution attendue, elles **se focalisent sur une définition approfondie du besoin**. Elles s'appuient sur des **principes itératifs et incrémentaux** : **on développe rapidement un produit imparfait** mais qui **répond valablement à une partie du besoin** qu'on a précisément identifié, et **on le soumet à l'épreuve** des utilisateurs. On en tire

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

alors **des enseignements** pour **faire évoluer le produit**, **améliorer** ce qui fonctionne moins bien et **lui ajouter des fonctionnalités** d'itération en itération. C'est **une approche d'une grande souplesse** qui **tient compte des évolutions** du contexte et des besoins, et permet d'y répondre. Elle vise à **améliorer la satisfaction** et à **optimiser le taux de réussite** des projets.

En retour, le produit n'est **pas défini en début de projet**, les **estimations** sont donc **très compliquées à réaliser**, le **périmètre** n'est **jamais véritablement figé**.

Ces deux approches ont donné lieu à **de nombreuses méthodes et cadres de travail** plus ou moins formalisés (*Kanban, Lean, PMI, Prince2, Scrum, 3P, Cascade, etc.*). Que vous vous appuyiez sur l'une de ses méthodes ou que vous ayez **développé la vôtre**, votre cahier des charges devra **en présenter les grandes lignes et les avantages**.

Attention

Votre cahier des charges **ne devra pas se transformer en un manuel de gestion de projet**. Il ne s'agira pas de présenter par le menu le détail de chaque processus en place dans votre organisation. Vous indiquerez toutefois quelles en sont **les grandes lignes et ses spécificités**. Cela vous permettra de **poser un cadre** avant de présenter la suite de votre organisation projet, en cohérence avec ce cadre global.

Une méthode, c'est un **ensemble de processus** bien définis. Vous devrez donc **trouver la mesure** entre un guide méthodologique et **une présentation concise mais suffisante** pour le cahier des charges. Vous **ne direz jamais dans un cahier des charges** que vous appliquez « ***la méthode agile*** ». D'abord, parce que **cela n'a aucun sens**, l'agilité étant **une philosophie** et en aucun cas une méthode, ensuite parce que **c'est beaucoup trop vague**.

La méthode **influence l'ensemble du projet**, y compris **la formalisation de tel ou tel document**. **Pensez-y** avant de vous ruer sur **une** méthode agile (« *agile* » étant utilisé ici en tant qu'**adjectif qualificatif** et pas pour désigner une méthode spécifique). **Si vous êtes en train de rédiger un cahier des charges fonctionnel** – ce qui est notre contexte ici – qui **décrit dans les détails la réalisation** que vous allez produire, il est **très peu probable que vous pourrez appliquer une méthode basée sur Scrum**, par exemple, pour la suite de votre projet.

Si vous êtes en train de réaliser votre cahier des charges tel que nous le décrivons dans ce cours, **vous appliquez probablement une méthode en cascade...**

En revanche, **rien ni personne ne pourra vous empêcher d'utiliser des outils provenant d'autres méthodes** ou approches, si vous estimez qu'ils viendront **faciliter le fonctionnement** de votre équipe ou **le déroulement** du projet.

Exemple

Vous pouvez tout-à-fait décider d'**utiliser une méthode en cascade pour l'ensemble de votre projet** et indiquer que **chaque livrable de phase** (les spécifications fonctionnelles, les cahiers de création, les intégrations, etc.) **devra être validé** par le commanditaire **pour permettre le déroulement de la phase suivante**.

Vous pourrez aussi **ajouter un peu de souplesse** au moment de la **phase de production créative**, par exemple, ou **lors des développements**. Notamment en précisant que vous envisagez des **tests utilisateurs** au moment du **prototypage**, avec une **prise en compte des retours** pour affiner votre conception en cohérence avec **un besoin** qui sera alors **plus affiné**.

Cette étape pourra être **imposée par votre méthode de travail**. Elle sera **présentée** ici et aura **des impacts inévitables** sur votre **planning** et votre **budget**. Dans cette partie comme **dans l'ensemble de votre document**, restez vigilants sur **la cohérence globale de votre cahier des charges**.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite


Pour **présenter votre méthode**, vous indiquerez donc dans le cahier des charges :

- Les **grandes étapes** du projet, si nécessaire regroupées par **phases**,
- Les **livrables** qui seront associés à chaque étape,
- Les **événements** récurrents,
- Les **processus** principaux et **règles** transversales.

Un schéma sera bien souvent beaucoup plus adapté qu'un long texte descriptif.

Exemple

Vous êtes en train de réaliser le cahier des charges fonctionnel de votre **projet Web** pour le fabricant de trottinettes *Trot'Bidulle*. **Dans votre structure**, vous utilisez **une méthode en cascade**, mais, sous l'impulsion de vos développeurs, vous avez recours à **quelques outils issus de la mouvance agile**. Vous pouvez ainsi **sécuriser votre périmètre projet** tout en autorisant une **légère flexibilité pendant les phases de développement**. Vous **limitez ainsi « *l'effet tunnel* »** (cette parfois longue période de développement pendant laquelle le client ne voit rien de sa réalisation tant attendue) et dans le même temps, vous **sécurisez votre phase de recette** en permettant à votre client de faire des **retours réguliers** sans attendre une livraison finale.

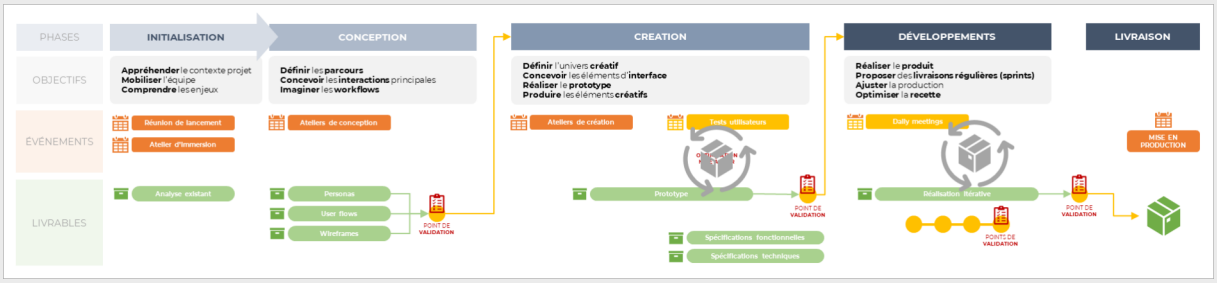

Vous utilisez également des **outils de management visuel**, tel que le tableau de suivi de production installé dans l'open space et inspiré par la méthode **Kanban**, qui permet à l'équipe projet de **savoir en permanence où en est le projet**.

Pour **fluidifier la production technique**, vos développeurs organisent chaque matin un ***stand-up meeting***, rituel inspiré par le cadre de travail Scrum.

2. Justifier la méthode

En filigrane, vous devrez toujours **mettre en évidence dans votre cahier des charges** les **bénéfices** de la méthode employée. Comme vous avez pu le faire en présentant votre conception fonctionnelle et vos créations, il sera important de toujours **donner des arguments pour légitimer vos choix**.

Si vous optez pour une méthode spécifique, c'est que vous considérez qu'elle **permettra de sécuriser le déroulement** du projet et d'**assurer une production finale optimale**. **Expliquez-le**, même sommairement dans le cahier des charges.

Exemple

Pour **justifier la méthode proposée**, vous pourriez ajouter dans votre cahier des charges **quelques mots** qui en **justifient la pertinence**. Par exemple :

« *Le **périmètre projet** est **bien déterminé** et nous devons porter une **vigilance particulière** sur le **respect des délais**. La méthode proposée nous permet de **sécuriser les livraisons intermédiaires** en nous appuyant sur les **validations des décideurs**.*

*Les **phases de conception et de création** s'appuient sur des **tests utilisateurs** qui **renforceront l'efficacité** de la réalisation.*

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

*La **phase de développements** intègre **plusieurs livraisons intermédiaires** permettant des **ajustements marginaux** et d'**alléger la charge de recette** en fin de projet.* »

En **présentant votre méthode**, vous avez **défini un cadre général** pour votre projet.

B. Présenter l'équipe

Le cadre identifié, il sera temps de **présenter l'équipe mobilisée** dans le cahier des charges. **La présentation des acteurs** aura toute son importance car elle **répond à des questions fondamentales** :

- Les **compétences nécessaires** pour mener à bien le projet sont-elles **bien identifiées** ?
- Le **nombre de ressources** est-il **suffisant pour sécuriser** le déroulement du projet ?
- Les **relations entre les membres** de l'équipe permettront-elles de **fluidifier la production** ?
- Les **responsabilités** et la **hiérarchie** sont-elles suffisamment **claires** pour **assurer un fonctionnement** efficace ?
- Des **profils compétents** pour **rendre compte** des grandes spécificités du projet sont-ils **identifiés** ?
- Qui seront les **points de contact** pour le commanditaire ?

La présentation de l'équipe est donc **essentielle** dans votre cahier des charges fonctionnel.

Remarque

En tant que pilote du projet, vous n'aurez **pas toujours la possibilité de choisir les personnes** mobilisées sur un projet. En revanche, il est de **votre responsabilité de constituer une équipe efficace** et **précisant les rôles et fonctions** attendus pour vous assurer de la réussite du projet.

Vous pourriez par exemple expliquer dans votre présentation d'équipe que **la contribution d'un expert accessibilité est indispensable** pour assurer le succès du projet, et **le présenter dans votre organigramme** d'équipe.

Vous ne pourrez peut-être pas décider si cette fonction sera, dans les faits, assurée par Sabrina ou Malik. Leur **charge** sur d'autres projets qui se déroulent en même temps **devra être prise en compte** pour faire ce choix, et le moment venu, c'est **leur disponibilité** qui tranchera. Mais **vous aurez envisagé la fonction** lors de la constitution de l'équipe, permettant ainsi d'en préciser la volumétrie.

Une **présentation d'équipe qui répond à l'ensemble de ces questions** sera **très rassurante** pour le commanditaire. Elle permettra de **démontrer** que l'équipe mobilisée est **bien dimensionnée** pour **répondre aux spécificités** du projet et à ses enjeux.

Pour l'équipe elle-même, c'est un **document structurant**. Lorsque vous participez à un projet, vous aimez bien **savoir avec qui vous allez interagir**. Ce sera la même chose pour **toutes les personnes impliquées** dans votre projet. Cette présentation aidera également chaque acteur à **trouver sa place** et **visualiser son périmètre de responsabilité** dans le cadre du projet.

Cela est d'autant plus important qu'un **fonctionnement par projets** implique **la constitution d'une équipe différente** pour chaque projet. **L'organisation structurelle** de l'entreprise **ne se reflètera pas** dans une équipe projet par définition **temporaire**, qui vise à **réunir des compétences spécifiques et complémentaires** pour **répondre aux particularités** d'un projet unique.


Lorsque **vous avez défini la portée** de votre projet, vous en avez **identifié les principaux chantiers** (un site web, de la production de contenu vidéo, une application mobile et une campagne e-marketing par exemple). Chacun de ces chantiers va impliquer des savoir-faire adaptés. La présentation de votre équipe devra l'incarner.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

En **interne**, comme à l'**externe**, il est donc **capital de présenter l'équipe mobilisée**. Et c'est donc tout naturellement que **vous l'intégrerez à votre cahier des charges**.

Exemple

Dans votre cahier des charges pour la société *Trot'Bidulle*, vous pouvez **représenter votre équipe** projet au travers d'un **organigramme**. Cette représentation permet de **percevoir rapidement la volumétrie de l'équipe** et de **bien comprendre les interactions** entre chacun des membres impliqués.

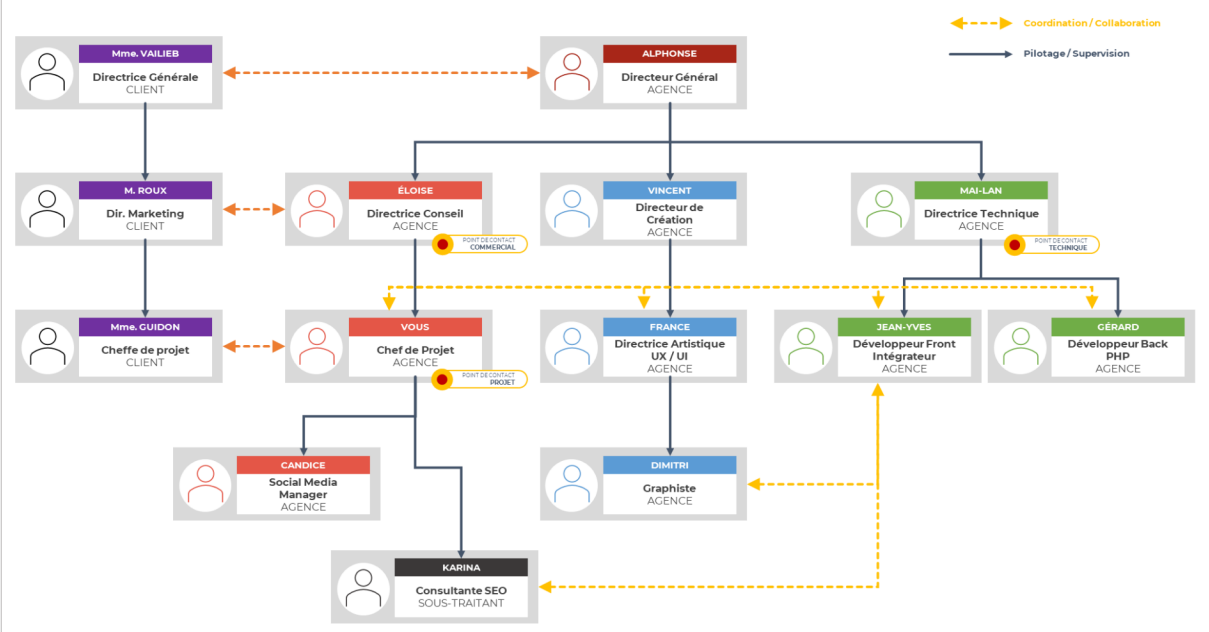

Dans cet exemple on peut voir que par **un simple schéma**, on **répond à toutes les questions** :

Les **compétences nécessaires** sont adressées au travers des **différents métiers** représentés ; c'est pour cela qu'il est important de les préciser. Ils permettent de **couvrir les attentes** en termes **d'expertise**.

Le **nombre de ressources** apparaît clairement. On peut ainsi **s'assurer** que **la force de travail suffisante** est bien mobilisée.

L'équipe est organisée pour **collaborer efficacement**. Les **flux d'interactions principaux** sont matérialisés. On voit que le chef de projet aura de **multiples interactions** avec les **ressources productives**. De même, la **consultante SEO interagira directement** avec l'intégrateur et le graphiste.

La **hiérarchie est claire**, permettant d'identifier un **processus d'escalade** en cas de difficulté. Par ailleurs **des interlocuteurs sont positionnés à chaque niveau de l'organisation commanditaire**.

Les **points de contact** sont **clairement identifiés** : le **chef de projet** est évidemment le **référent quotidien**, la **directrice conseil** répondra à toutes les questions d'ordre **commercial**, et la **directrice technique** pourra répondre à toutes les questions sur les **aspects technologiques** de la solution.

C'est une **représentation efficace** qui ne laisse **pas d'ambiguïté** sur l'organisation d'équipe.

Rappelez-vous qu'avant de présenter l'équipe, vous avez indiqué **quelle méthode projet** vous allez employer. Il y a **un lien fort entre la méthode et l'équipe**. D'ailleurs, la méthode influence **toute l'organisation** de votre projet. Une méthode peut **préciser des rôles bien identifiés** qui auront un **rôle spécifique** à jouer dans le projet.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple

Dans **une organisation en Scrum**, par exemple, **le chef de projet n'existe pas**. Ce rôle de chef d'orchestre n'est pas prévu. Ses fonctions traditionnelles sont **distribuées sur l'ensemble de l'équipe**.

Si vous appliquez **une méthode basée sur Scrum**, alors vous devrez trouver un **Product Owner**, chargé de définir le produit et de s'assurer qu'il répond bien aux usages, une **équipe de développement multidisciplinaire et autoorganisée**, et un **Scrum master**, garant de l'organisation quotidienne et de la valeur générée par l'équipe.

Ces rôles **n'apparaissent pas dans une organisation en cascade**.

La méthode influencera la construction de votre équipe. Veillez à **rester cohérent** dans votre cahier des charges.

Exercice : Quiz

Question 1

« Il n'existe que **deux méthodes** pour mener un projet : la méthode en **cascade** et la méthode **agile**. » Vrai ou faux ? (Une seule réponse juste)

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 2

Pour **quelles raisons** devriez-vous **présenter la méthode** projet employée dans votre cahier des charges ? (Plusieurs réponses possibles)

- ☐ Présenter les relations hiérarchiques et de collaboration entre les acteurs impliqués dans le projet.
- ☐ La méthode projet utilisée peut être spécifique à votre organisation, les acteurs ne sont pas censés la connaître intuitivement.
- ☐ Permettre à chaque acteur impliqué dans le projet de connaître les grandes lignes des processus mis en place.
- ☐ Donner de la visibilité à votre commanditaire sur votre organisation projet.

Question 3

« *Si vous choisissez **une méthode projet déjà existante** et bien définie, vous n'aurez pas besoin de justifier ce choix dans votre cahier des charges.* » **Que pensez-vous de cette affirmation ?** (Une seule réponse juste)

- ○ C'est vrai. Si une méthode existe et qu'elle a été formalisée, vous pourrez tout-à-fait l'utiliser sans vous justifier : elle a déjà fait ses preuves.
- ○ C'est vrai. Les méthodes largement utilisées sont déjà connues de tous et tous les acteurs du projet comprendront pourquoi on l'utilise dans le contexte du projet.
- ○ C'est faux. Il sera toujours important de justifier la méthode employée dans le cahier des charges, même rapidement.

Question 4

Quelles sont les **informations que vous partagez** lorsque vous présentez un **organigramme d'équipe** dans votre cahier des charges ? (Plusieurs réponses possibles)

- ☐ Les compétences mobilisées pour le projet.
- ☐ Le volume de ressources impliquées dans le projet.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- ☐ Les relations hiérarchiques entre les membres de l'équipe.
- ☐ Les collaborations privilégiées entre plusieurs acteurs.
- ☐ L'ensemble des ressources disponibles dans votre organisation.

Question 5

« **L'organigramme** d'équipe présenté dans le cahier des charges devra nécessairement refléter la **méthode** présentée. » **Vrai ou faux** ? : (Une seule réponse juste)

- ○ Vrai
- ○ Faux

II. Prévoir le fonctionnement en cours de projet

La **méthode** et l'**équipe** vont poser un **cadre général pour l'organisation** de votre projet. Dans votre cahier des charges fonctionnel, vous devrez aussi présenter la **gouvernance** envisagée et **partager des informations plus précises** pour **mieux expliquer le fonctionnement** attendu en cours de projet.

Vous pourrez détailler **les outils mis à la disposition de l'équipe** ou proposés pour **faciliter les échanges** entre le commanditaire et l'équipe de réalisation.

Présenter vos **outils de suivi** et vos **indicateurs clés** contribuent également à **la transparence de votre organisation projet**. La présentation de votre **analyse des risques** permettra, elle, de **rassurer** équipe et commanditaire sur **de potentielles dérives déjà identifiées**.

A. Définir la gouvernance

Dans votre projet, **la gouvernance** consiste essentiellement à préciser **comment l'information devra circuler**, au travers de **quelles instances**, qui seront les **profils décisionnaires** concernés et comment on **prendra des décisions** tout au long du projet. Elle vous permet de préciser le **cadre organisationnel** au sein duquel le projet va se dérouler. Elle sera incarnée par plusieurs types de **réunions** ou de **comités**.

Définir la gouvernance, c'est **mettre l'équipe en mouvement**, lui donner **une structure** pour l'aider à **échanger les informations** clés en cours de projet. Elle facilitera les **communications descendantes**, permettant de **transmettre les instructions** et de **préciser les attendus**. Elle organisera aussi les **communications ascendantes**, c'est-à-dire le ***reporting***, permettant de **partager l'état du projet** avec les décisionnaires qui pourront alors **faire les éventuels arbitrages** de façon éclairée.

Dans une **organisation traditionnelle en cascade**, on construit généralement la gouvernance au travers de **trois niveaux** du plus **opérationnel** au plus **stratégique**. Votre cahier des charges fonctionnel devra **la traduire de façon claire et limpide**.

1. Le niveau opérationnel : au quotidien, pouvoir suivre la production

Cette strate de gouvernance doit détailler **comment vous envisagez le déroulement quotidien** du projet. Il s'agit avant tout de **préciser les modalités d'échanges** et les **formalismes** attendus. On peut par exemple indiquer que **les communications entre le commanditaire et l'équipe** de réalisation se feront par **courriel** ou par **téléphone**. Il n'est **pas nécessaire d'organiser des réunions coûteuses** à ce niveau.

En revanche, si la méthode employée prévoit des **réunions quotidiennes** pour les **ressources internes** impliquées dans la réalisation, alors **elles doivent être précisées ici**. On indiquera également les **modalités de communication interne**, les **outils** mis à la disposition de l'équipe ou encore les **supports de suivi** de projet.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple

Dans votre cahier des charges pour *Trot'Bidulle*, vous pourriez **représenter votre gouvernance** pour le **niveau opérationnel** de cette façon :

SUIVI DE PRODUCTION		Niveau OPÉRATIONNEL
Modalités d'échanges : **Visioconférence, téléphone, emails**	*Participants concernés :* • **Mme. GUIDON, cheffe de projet MOA** • **M. IX, chef de projet MOE** • **L'ensemble des ressources productives, selon la phase projet**	*Outils* • **Journal de bord projet** • **E-mails** • **Planning détaillé** • **Modèles de briefs** • **Stand-up meetings**
Modalités : • **Échanges informels** • **Briefs formalisés** • **Mails de livraison**		
Fréquence : **Quotidienne, au fil de l'eau**		

2. Le niveau de la coordination : faciliter la conduite de projet

À ce **niveau intermédiaire de gouvernance**, on veillera à **sécuriser l'avancement** du projet, en **vérifiant les réalisations effectuées** et la **trajectoire** vers l'objectif de réalisation. Cette instance prendra souvent la forme d'une **réunion hebdomadaire**.

L'avancement du projet pourra être suivi au travers d'un document de type ***worklist*** qui regroupera **les différents chantiers en cours**. L'état de chacun de ces chantiers, partagé avec le commanditaire, contribuera à **l'informer sur le déroulement du projet**. Ce sera également l'occasion de pouvoir faire des **arbitrages non stratégiques**, comme **l'affectation de ressources complémentaires** ou la **dépriorisation** de certains travaux. C'est pour cela qu'au-delà du **chef de projet**, des **managers** doivent être présents afin d'entériner ces éventuelles décisions qui affecterons, à la marge, les **objectifs CQD** (coût, qualité ou délais) du projet. Ces **réunions régulières** ne sont **pas nécessairement longues**, surtout lorsque tout se passe bien, mais elles sont utiles pour **assurer un bon suivi**.

Exemple

Dans votre cahier des charges pour *Trot'Bidulle*, vous pourriez **représenter votre gouvernance** pour le **niveau de coordination** de cette façon :

CONDUITE DE PROJET		Niveau COORDINATION
Modalités d'échanges : **Réunion, visioconférence, téléphone**	*Participants concernés :* • **M. ROUX, Dir. Marketing MOA** • **Mme. GUIDON, cheffe de projet MOA** • **Éloïse, directrice conseil** • **M. IX, chef de projet MOE** • **Les responsables de pôle, si nécessaire** • **Les ressources productives, si nécessaire**	*Outils* • **Worklist** • **Planning détaillé** • **Jira**
Modalités : • **Sur site client ou dans les locaux du prestataire** • **Présence des managers ou délégation de pouvoir** • **Mise à jour de la worklist projet**		
Fréquence : **Hebdomadaire, chaque jeudi après-midi**		

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

On détaille généralement ce niveau de gouvernance pour **des projets qui nécessitent un suivi sur le long terme**. En effet, si votre projet se déroule sur deux mois, il ne sera peut-être pas nécessaire d'envisager ce point hebdomadaire. Mais soyons clair : **tout dépendra de votre projet et de son contexte**.

3. Le niveau stratégique : arbitrer et prendre des décisions


Ce niveau de gouvernance est **capital** car c'est celui qui **mobilise les décisionnaires**. Ils n'auront généralement **pas le temps d'intervenir directement aux niveaux plus opérationnels**. En revanche, il est indispensable de leur donner une **visibilité régulière** sur le déroulement du projet et l'occasion d'exercer leur **pouvoir de décision**.

Ce sera notamment le rôle du **comité de pilotage**, qui permettra de faire un **point formel** sur **l'avancement** du projet, de **présenter les réalisations finalisées** et de **faire les arbitrages** nécessaires en cours de projet. Cette instance rassemble les **décisionnaires** du projet, habilités à prendre des **décisions stratégiques** pouvant en modifier les contours **pendant la durée** du projet.

Le comité de pilotage est par exemple légitime pour **augmenter ou réduire la portée du projet**, décider de l'octroi de **budget complémentaire**, modifier les **contraintes de délais**, etc.

Exemple

Dans votre cahier des charges pour *Trot'Bidulle*, vous pourriez **représenter votre gouvernance** pour le **niveau stratégique** de cette façon :

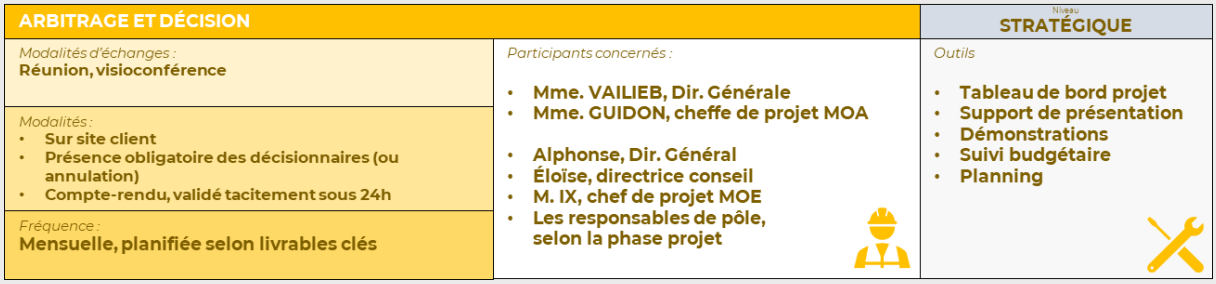

Cette structuration est **classique pour une gouvernance de projet digital**. Ne la considérez **pas comme une règle immuable** : vous devrez **adapter votre gouvernance** à votre propre **projet** et à votre propre **contexte professionnel**.

Vous pourrez par exemple adapter la **fréquence** des **comités de pilotage** à la **complexité** de votre projet. Si c'est un projet simple prévu sur trois mois, un **point intermédiaire** avec les décideurs et **une réunion de livraison finale** pourront être suffisants.

L'important sera de vous assurer que vous avez bien structuré **les modes de circulation de l'information** et organisé **la prise de décision**. L'objectif, c'est d'**éviter les embûches et les cafouillages** en cours de projet.

B. Présenter les outils pour fonctionner

Votre **gouvernance** a défini les **règles de circulation de l'information** et un **cadre** facilitant la **prise de décision**. Des **outils spécifiques** pourront également être **présentés dans le cahier des charges** pour **la compléter**.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

1. Des outils pour faciliter le travail de l'équipe

Les briefs

Les briefs, ce sont **les modalités** selon lesquelles vous allez **transmettre les instructions et les informations essentielles** aux **ressources productives**. Il sera **impératif** qu'ils soient **structurés** et **formalisés**. Un brief doit être **rédigé**, ce n'est **pas un simple échange oral** même s'il est toujours profitable de **le présenter en face-à-face**. Vous pourrez ainsi :

- **Structurer** la demande ,
- Faciliter la **compréhension des attendus**,
- Communiquer **un document** auquel la ressource pourra **se référer en cours de réalisation**,
- **Simplifier la réception** des travaux en ayant **un socle** pour **vérifier facilement la conformité** avec la demande.

Pour **simplifier** les choses, vous aurez pu mettre en place dans votre structure un **modèle de brief**.

Fondamental

Votre cahier des charges indiquera à minima que **ce modèle sera utilisé** et, par exemple, **où le trouver** sur le réseau interne de l'entreprise.

La transmission des réalisations

Au cours du projet, les **ressources productives** (créatifs, développeurs, consultants, etc.) **vont livrer régulièrement** le **résultat** de leurs efforts. Votre cahier des charges pourra **préciser ces modalités** de **remise des travaux**. Ils pourront par exemple être **déposés à un endroit spécifique** de l'environnement de développement, sur votre réseau ou jointes à un courriel dédié.

Ici encore, vous pourriez mettre à la disposition de l'équipe **un modèle de message de livraison** pour leur simplifier la tâche. Vous pourrez également préciser la **nomenclature** à utiliser.

Exemple

Voici par exemple ce que pourrait comporter votre cahier des charges :

Modalités de remise des réalisations (interne)

*Durant les **phases de conception et de création**, l'ensemble des documents produits sera **déposé sur le réseau**, dans le répertoire adapté du dossier projet.*

- *Éléments de **conception** : //AGENCE/PROJETS/TrotBidulle/02-Conception/*
- *Éléments de **création** : //AGENCE/PROJETS/TrotBidulle/03-Creation/*

*Les **noms de fichiers** respecteront la **nomenclature** suivante :*

*« **TB-NomDeLaRealisation-Version-AAMMJJ** »*

***Pour les développements**, les éléments produits seront **commités** et **mis à disposition** sur l'environnement de **préproduction**. La documentation sera mise à jour si nécessaire.*

***Chaque remise de réalisation** est **associée à un mail de livraison** dont le modèle est disponible ici :*

//AGENCE/PROJETS/Process/Livraison/ModeleMailLivraison.docx

Dans cet exemple le terme « *commités* » vient de l'anglais « *commit* » et désigne le fait de **publier un code** dans **l'environnement de gestion de versions** utilisé par les développeurs, comme Git[1] par exemple.

[1] https://git-scm.com/

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Le suivi d'activité

Pour **faciliter le déroulement du projet**, des **outils de suivi** peuvent être définis. Ils permettront de **visualiser facilement l'avancement** des différentes **tâches** et plus généralement du projet. Le premier d'entre eux sera votre **planning**. Vous pourrez aussi avoir recours à des outils **plus complets ou plus spécifiques** comme un **Trello**[1] par exemple, qui vous donneront une **visibilité à un niveau beaucoup plus fin**.

Les **outils collaboratifs** seront particulièrement appréciables ici.

Dans le cadre d'un **projet interne**, vous pourriez indiquer également dans votre cahier des charges **l'outil de suivi des temps passés (*timesheets*)** qui devra être utilisé, et même rappeler que le temps consacré par chaque ressource au projet **devra être entré quotidiennement dans l'outil**. C'est souvent un vœu pieux, mais il aura sa place dans le cahier des charges puisque vous détaillez **comment** vous envisager de **suivre l'activité de l'équipe**.

2. Des outils pour simplifier la relation avec le commanditaire

Votre **fonctionnement interne**, qui **découle de la méthode** employée, est un **éclairage intéressant** dans votre cahier des charges. Notamment parce qu'il permet de **transmettre des informations rassurantes**. Mais vous devrez aussi **convenir des modalités d'échanges avec le commanditaire**.

Définir les processus d'échanges

Ces **modalités d'échanges** feront écho aux interactions **définies dans votre gouvernance**. Vous pourriez indiquer ici que **toute demande devra être formalisée par un courriel**. Vous détaillerez les **procédures à suivre** pour des **demandes complémentaires** ou **pendant les phases de recette**. Les modalités de **retours** sur des éléments livrés ainsi que les **process de validation** pourront également être détaillés.

Quelle qu'en soit la forme, précisez dans votre cahier des charges **comment vous envisagez les interactions formelles** avec votre commanditaire.

Exemple

Voici par exemple ce que pourrait comporter votre cahier des charges :

Retours et validations

*Tout **livrable nécessitant une validation** client sera **remis par courriel** adressé au chef de projet MOA.*

*Le **temps prévu** pour transmettre les **retours éventuels** est **indiqué au planning** annexé à ce cahier des charges. Tout **retour** à traiter doit être **formalisé par écrit**.*

*Pour les **livrables de conception et de création graphique**, les retours éventuels seront indiqués par des **instructions épinglées** directement sur les livrables, via la plateforme **Adobe Creative Cloud**.*

*Les **validations de livrables clés** seront transmises **par courriel.***

*La **validation des livrables finaux** sera formalisée par la signature d'un **procès-verbal de recette** autorisant la mise en production.*

Formalisme de la recette et demandes complémentaires

*La **phase de recette** sera pilotée **via la plateforme Jira**.*

***Chaque anomalie** constatée fera l'objet d'un **ticket unique** (une anomalie = un ticket).*

*La plateforme autorise l'ensemble de l'équipe projet à **visualiser la progression du traitement de chaque ticket** d'anomalie de sa création à sa résolution.*

***L'espace « Évolutions »** est également disponible dans **Jira**.*

*Il permet de déposer toute **demande d'évolution de périmètre** par l'intermédiaire de **tickets dédiés**.*

*Chaque demande sera **évaluée et chiffrée**, puis **soumise à la validation** du commanditaire.*

[1] https://trello.com/fr

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

*Une **évolution validée** sera **intégrée au périmètre projet**, les documents de **spécifications** seront **mis à jour**.*

Vous pourriez également décider de mettre en place un environnement **Microsoft Teams** ou un espace **Slack** par exemple pour **faciliter les échanges**. Vos choix importent peu pour le cahier des charges, mais **il faudra les préciser.**

Assurer la visibilité sur l'avancement

Tout comme vous allez déployer des outils pour suivre la progression des tâches affectées à l'équipe, vous pourriez **instaurer des outils utiles au commanditaire** pour **prendre connaissance de l'avancement global** du projet.

Vous pourriez par exemple indiquer que **le suivi de projet** sera incarné par une « ***worklist*** ». Il s'agit d'un **simple fichier**, généralement construit sous **Excel**, qui présente des **informations clés** sur **chaque chantier** du projet, comme le **statut** actuel, les **prochaines étapes**, les **éléments attendus**, les **prochaines échéances**, etc.

Ce document est souvent un **outil utile** pour **structurer les réunions hebdomadaires** et préserver la **vue d'ensemble** du projet. Vous pourrez **lui associer une colonne « *actions* »** pour **préciser les tâches** à accomplir d'une semaine sur l'autre et **suivre leur bonne réalisation**.

Proposer un espace de stockage

Beaucoup d'équipes projet **définissent un espace de stockage spécifique** pour **l'ensemble des documents** qui seront produits. C'est un **très bon réflexe** car vous disposerez ainsi d'un **environnement unique et partagé**, auquel **toute l'équipe**, le **commanditaire** et éventuellement **certaines parties prenantes** auront accès.

Il sera alors **beaucoup plus facile de retrouver la version à jour** de votre **cahier des charges**, des **spécifications** fonctionnelles et techniques, de la **charte graphique** ou des **comptes-rendus** de réunion par exemple.

L'espace de stockage servant de **référence à l'ensemble de la documentation projet** sera également **partagé dans le cahier des charges**.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple

Les exemples précédents ont été **rédigés** dans un **souci de clarté**. Mais vous pourriez très bien **privilégier une représentation plus synthétique** pour votre cahier des charges. Voici comment vous auriez pu intégrer ces informations :

Outils et processus internes	
Brief	- **Briefs ressources rédigés** et présentés et face-à-face - Formalisation des briefs sur **modèle défini** disponible dans *//AGENCE/PROJETS/Process/Livraison/ModeleBrief.docx*
Livraisons	- Livraisons déposées **dans le dossier projet** : Éléments de conception : *//AGENCE/PROJETS/TrotBidulle/02-Conception/* Éléments de création : *//AGENCE/PROJETS/TrotBidulle/03-Creation/* - **Nomenclature** : *TB-NomDeLaRealisation-Version-AAMMJJ.ext* - **Développements techniques** : commit (***Git***) + mise en préprod - Livraisons associées à un **mail sur modèle défini** disponible dans *//AGENCE/PROJETS/Process/Livraison/ModeleMailLivraison.docx*
Suivi de projet	- **Planning**, mis à jour - ***Trello***, pour **l'affectation** et le **suivi** des tâches - Remplissage des **feuilles de temps** quotidien
Outils et processus relation commanditaire – équipe de production	
Retours et validations	- Livraisons **par courriel** - **Retours** par courriel dans les limites des délais du **planning** - Retours sur les **éléments créatifs** via ***Creative Cloud*** - Signature du **procès-verbal de recette** requis pour **mise en production**
Recette	- **Espace dédié** sur la plateforme ***Jira*** - **1 anomalie = 1 ticket** - Information sur le *traitement de l'anomalie* via le **statut** dans *Jira*
Demandes complémentaires	- **Espace dédié** sur la plateforme ***Jira*** - **1 ticket** par demande d'évolution - Chaque demande sera **étudiée** et donnera lieu à un **chiffrage** - La **validation de l'estimation** ajoute la demande au **périmètre projet**
Suivi d'avancement	- **Worklist**, support des réunions hebdomadaires - Définition d'**actions par chantier**, avec **suivi hebdomadaire**
Archivage	- **Archivage** des documents projet sur ***Google Drive*** dédié

De **nombreuses plateformes de gestion de projet** sont disponibles sur le marché et permettent de couvrir **une grande partie de ces besoins** de façon **unifiée** et **centralisée**. Généralement proposées en mode Cloud, elles ne nécessitent qu'une création de compte pour être opérationnelles. On peut citer notamment **Monday**[1], **Asana**[2] ou **Nutcache**[3] que vous pourrez explorer.

Si vous les utilisez, **vous l'indiquerez alors dans votre cahier des charges** et vous penserez à en préciser les **grandes caractéristiques d'usages** dans le cadre de votre projet.

C. Veiller au suivi des risques

Dans **les étapes préalables de votre projet**, vous avez peut-être conduit une **analyse des risques**. Vous aurez alors envisagé un certain nombre de **difficultés potentielles** et **mis en place des parades** qui, une fois appliquées, auront contribué à **façonner votre projet**. Cette analyse vous a amené à établir un **plan de prévention des risques**.

Ce document n'est **jamais figé** et sera nécessairement amené à **évoluer en cours de projet**. Des **risques nouveaux** peuvent apparaître à n'importe quel moment, alors que d'autres, identifiés en début de projet, **disparaîtront** tout simplement.

Votre **plan de prévention** vous aura toutefois permis de préciser **les risques à suivre en cours de projet**. En indiquant les **actions de prévention** que vous avez imaginé, qu'elles soient appliquées ou non, et les **actions éventuelles en réparation**, vous avez déjà conçu un outil qui devrait **faciliter le déroulement du projet**.

[1] https://monday.com/lang/fr/
[2] https://asana.com/fr
[3] https://www.nutcache.com/

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Vous aurez **tout intérêt à le présenter** dans votre cahier des charges. **L'identification des risques majeurs** et le partage du **plan de prévention**, constituent une **somme d'informations utiles à l'ensemble de l'équipe projet**.

Exercice : Quiz

Question 1

Parmi les propositions suivantes, indiquez celle qui pourrait le mieux définir ce qu'est la gouvernance dans un projet : (Une seule réponse juste)

- ○ La liste des réunions régulières planifiée pendant tout le déroulement du projet.
- ○ Un cadre organisationnel précisant comment circule l'information, au travers de quelles instances et de comment sont prises les décisions.

Question 2

Pour un projet **traditionnel**, par exemple dans une organisation en cascade, une **gouvernance** se décline souvent en **trois niveaux**. Lesquels ? (Plusieurs réponses possibles)

- ☐ Opérationnel : pour piloter le projet au quotidien.
- ☐ Reporting : pour assurer le transfert d'information.
- ☐ Coordination : pour faire des points réguliers sur l'avancement.
- ☐ Stratégique : pour valider, arbitrer et prendre des décisions.
- ☐ Organisationnel : pour répartir les tâches entre les ressources.
- ☐ Politique : pour stimuler les contradictions afin de prendre les meilleures décisions.

Question 3

Dans votre **gouvernance**, vous pourrez décrire les **comités** qui seront formés et les **réunions** régulières qui seront organisées pour assurer un bon suivi du projet. Comment appelle-t-on le comité **composé de décisionnaires** capables de **prendre des décisions stratégiques** en cours de projet ? (Une seule réponse juste)

- ○ Comité de suivi
- ○ Comité de surveillance
- ○ Comité de pilotage
- ○ Comité de direction

Question 4

Votre cahier des charges pourra préciser les **modalités de transmission des demandes** aux ressources. Vous trouverez ci-dessous plusieurs propositions décrivant pourquoi il est important de **rédiger des briefs** pour transmettre des instructions aux équipes de production. Identifiez celles qui sont fausses. (Plusieurs réponses possibles)

- ☐ Un brief rédigé permet de mieux structurer la demande.
- ☐ Un brief rédigé permet aux ressources de se référer rapidement aux attendus en cours de réalisation.
- ☐ Un brief rédigé constitue un socle qui facilite la vérification de la conformité des travaux.
- ☐ Un brief rédigé permet de réduire les charges de réalisation des tâches.
- ☐ Un brief rédigé remplace la présentation des attendus en face-à-face.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 5

Parmi les propositions suivantes, indiquez les **outils et consignes** que vous pourriez présenter dans votre cahier des charges : (Plusieurs réponses possibles)

- ☐ Un lien vers une trame de brief structurée.
- ☐ Un modèle de message de livraison.
- ☐ Des outils de suivi de l'activité comme Trello.
- ☐ Des outils de ticketing comme Jira.
- ☐ Des outils collaboratifs comme Slack.
- ☐ Des espaces de stockages pour les documents projet.

III. Essentiel

Fondamental

Dans le cahier des charges fonctionnel, il est important **d'expliquer comment vous envisager de réaliser** ce que vous avez par ailleurs décrit. Vous commencerez par **donner un cadre général** en présentant la **méthode** utilisée.

Si vous rédigez un cahier des charges, **vous vous placez très certainement dans une approche traditionnelle descendante**, dans laquelle vous allez **présenter une description détaillée** de la solution attendue et **préciser votre organisation pour en assurer la production**. Mais vous pourriez tout aussi bien mettre en œuvre **une approche dite agile**, qui imposera **un fonctionnement plus itératif et incrémental**. Les méthodes disponibles sont **très nombreuses**, et il est probable que votre structure **ait développé sa propre méthode** qu'il sera alors **indispensable d'expliquer** dans le cahier des charges.

Présenter la méthode c'est **définir les grandes étapes du projet, identifier les événements** importants ou récurrents, **préciser les livrables et les processus**. Une **représentation schématique** sera **tout-à-fait adaptée** pour votre cahier des charges. Mais quelle que soit votre méthode, il sera important de la **justifier** en quelques lignes.

L'équipe est **au cœur** de votre organisation. Vous pourrez la présenter par l'intermédiaire d'un **organigramme** qui permettra de **comprendre d'un seul coup d'œil** sa **composition**, les **expertises** mobilisées, les **relations** entre les acteurs et leurs **liens de subordination**, les **points de contact** importants pour assurer un **déroulement projet fluide et efficace**.

Ces bases posées, vous pourrez **détailler la gouvernance** de votre projet, c'est-à-dire le dispositif que vous mettez en place pour **faciliter les échanges d'information** et les **prises de décision**. Elle se traduira concrètement par **des rendez-vous réguliers et des réunions formelles** dont vous expliciterez les **caractéristiques** et les **finalités**.

Pour **aider l'ensemble des acteurs** à **travailler efficacement** dans ce cadre imposé, vous pourrez lister dans votre cahier des charges **l'ensemble des outils** mis à la disposition de l'équipe et du commanditaire. Qu'il s'agisse d'outils existants ou développés sur mesure, leur **présentation synthétique** permettra à chacun de **percevoir très concrètement l'organisation mise en place** pour mener votre projet à bien.

IV. Auto-évaluation

Exercice : Quiz

Question 1

Qu'est-ce qu'une méthode ? (Une seule réponse juste)

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- ○ Une philosophie à intégrer pour aborder l'organisation d'un projet.
- ○ Un ensemble d'événements formalisés et d'outils prêts à utiliser pour définir vos propres processus.
- ○ Un ensemble de processus bien définis guidant l'activité jusqu'au résultat du projet.

Question 2

À **quel niveau de gouvernance** indiqueriez-vous que les briefs communiqués aux ressources mobilisées dans le cadre du projet devront être **formalisés** par écrit ? (Une seule réponse juste)

- ○ Opérationnel
- ○ Coordination
- ○ Stratégique
- ○ Autre

Question 3

Parmi tous les outils présentés dans ce cours que vous pourriez intégrer à votre cahier des charges, nous avons évoqué le plan de prévention. Que permet cet outil tout aussi utile au chef de projet qu'à l'équipe de réalisation ? (Une seule réponse juste)

- ○ Assurer la qualité des réalisations
- ○ Suivre l'activité du projet en temps réel
- ○ Définir les processus d'échange avec le commanditaire
- ○ Suivre les risques en cours de projet

Question 4

À quoi sert une **gouvernance** dans un projet ? (Plusieurs réponses possibles)

- ☐ Donner un cadre pour faciliter la circulation des informations clés.
- ☐ Structurer la communication ascendante (reporting) pour permettre d'éventuels arbitrages.
- ☐ Définir les étapes clés (ou phases) du déroulement du projet.
- ☐ Organiser la communication descendante pour transmettre les attendus.

Question 5

Quels éléments pourriez-vous intégrer dans votre cahier des charges pour présenter la méthode projet que vous allez employer ? : (Plusieurs réponse possibles)

- ☐ Les grandes phases prévues pour le projet
- ☐ Les dates de livraison des principaux livrables
- ☐ Les livrables associés à chaque étape de production
- ☐ Les événements récurrents
- ☐ Les charges estimées pour chaque grande phase du projet
- ☐ Les processus principaux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice

Présenter la méthode employée dans votre cahier des charges, c'est indiquer le but de chacune des grandes phases de votre projet, les événements prévus et les processus de réalisation.

Nous vous présentons ci-dessous quelques éléments d'une méthode basée en grande partie sur le modèle en cascade. Associez les objectifs, événements et livrables aux bonnes phases du projet.

Livrable : charte graphique

Événement : ateliers de conception

Livrable : fichiers PSD

Objectif : mobiliser l'équipe

Objectif : appréhender le contexte projet

Livrable : développements itératifs

Événement : atelier d'immersion

Événement : réunion de lancement

Livrable : wireframes

Objectif : réaliser le produit

Objectif : produire les éléments créatifs

Événement : ateliers de création

Événement : mise en production

Objectif : imaginer les workflows

Objectif : définir les parcours

Objectif : réaliser les interfaces

Objectif : fournir un produit terminé

Événement : daily meetings

Livrable : personas

Livrable : livraisons intermédiaires

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Initialisation	Conception	Création	Développements	Livraison

Exercice

En gestion de projet, on rencontre deux approches très différentes qui vont se décliner en de nombreuses méthodes : les approches descendantes et ascendantes.

Associez les caractéristiques présentées ci-dessous à la bonne approche projet.

Permet d'avoir un résultat rapidement qui sera complété et amélioré en cours de projet.

Décrit en détails la réalisation avant de commencer la production.

Regroupe les méthodes projet traditionnelles.

Facilite la prise en compte des évolutions du contexte et des besoins.

Décrit avec précision le besoin avant d'envisager la solution.

Fais références aux méthodes dites « *agiles* ».

Rend difficile les modifications de périmètre en cours de projet.

Sécurise les estimations.

Les estimations en début de projet sont difficiles à réaliser.

Propose un fonctionnement itératif et incrémental.

Facilite la réception du produit issu du projet car il sera plus facile d'en évaluer la conformité avec les attendus.

Approche descendante	Approche ascendante

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 8 Solution n°1

Question 1

« Il n'existe que **deux méthodes** pour mener un projet : la méthode en **cascade** et la méthode **agile**. » Vrai ou faux ? (Une seule réponse juste)

- ○ Vrai
- ◉ Faux

C'est faux : il existe un grand nombre de méthodes de gestion de projet, c'est pour cela qu'il sera important de décrire et présenter la méthode employée dans votre cahier des charges. Certaines seront formalisées et partagées par plusieurs entreprises, d'autres seront spécifiques à une organisation donnée. Par ailleurs, l'agilité n'est pas une méthode : c'est une philosophie, un état d'esprit spécifique pour appréhender le pilotage d'un projet.

Question 2

Pour **quelles raisons** devriez-vous **présenter la méthode** projet employée dans votre cahier des charges ? (Plusieurs réponses possibles)

- ☐ Présenter les relations hiérarchiques et de collaboration entre les acteurs impliqués dans le projet.
- ☑ La méthode projet utilisée peut être spécifique à votre organisation, les acteurs ne sont pas censés la connaître intuitivement.
- ☑ Permettre à chaque acteur impliqué dans le projet de connaître les grandes lignes des processus mis en place.
- ☑ Donner de la visibilité à votre commanditaire sur votre organisation projet.

Dans votre cahier des charges, il sera important de présenter la méthode employée, notamment parce qu'elle peut varier d'une organisation à une autre, et parfois même d'un projet à un autre. Tous les acteurs du projet doivent donc être « *au clair* » avec cette méthode. Elle leur permettra d'en comprendre l'approche et les grandes lignes des processus mis en place. Par ailleurs, elle aidera votre commanditaire à comprendre comment vous allez organiser le déroulement du projet. Les relations entre les acteurs impliqués dans le projet seront-elles présentées au travers de l'organigramme d'équipe. Une méthode peut impliquer la participation de certains rôles spécifique, comme celui de Scrum master avec une méthode basée sur Scrum. Mais dans la présentation de votre méthode projet, vous ne décrirez pas les relations particulières entre tous les acteurs mobilisés sur votre projet.

Question 3

« *Si vous choisissez **une méthode projet déjà existante** et bien définie, vous n'aurez pas besoin de justifier ce choix dans votre cahier des charges.* » **Que pensez-vous de cette affirmation ?** (Une seule réponse juste)

- ○ C'est vrai. Si une méthode existe et qu'elle a été formalisée, vous pourrez tout-à-fait l'utiliser sans vous justifier : elle a déjà fait ses preuves.
- ○ C'est vrai. Les méthodes largement utilisées sont déjà connues de tous et tous les acteurs du projet comprendront pourquoi on l'utilise dans le contexte du projet.
- ◉ C'est faux. Il sera toujours important de justifier la méthode employée dans le cahier des charges, même rapidement.

Lors de la rédaction du cahier des charges, vous aurez toujours à l'esprit de favoriser l'adhésion de l'ensemble de l'équipe aux éléments que vous présentez. La justification de vos choix comme de la méthode proposée seront donc essentiels. Ce n'est pas parce qu'une méthode est largement utilisée qu'elle est connue de tous et ce n'est pas non-plus une raison qui justifie son utilisation. En quelques mots, vous devrez mettre en évidence les bénéfices de la méthode employée dans le cadre spécifique de votre projet.

Question 4

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Quelles sont les **informations que vous partagez** lorsque vous présentez un **organigramme d'équipe** dans votre cahier des charges ? (Plusieurs réponses possibles)

- [x] Les compétences mobilisées pour le projet.
- [x] Le volume de ressources impliquées dans le projet.
- [x] Les relations hiérarchiques entre les membres de l'équipe.
- [x] Les collaborations privilégiées entre plusieurs acteurs.
- [ ] L'ensemble des ressources disponibles dans votre organisation.

L'organigramme est un outil simple mais qui vous aide à présenter un grand nombre d'informations. En un seul schéma, vous pouvez partager quelles seront les compétences mobilisées pour le projet et le volume des ressources impliquées. Ce sont deux informations sont extrêmement rassurantes pour le commanditaire du projet. L'organigramme vous permet également de préciser les modes de collaboration et les relations hiérarchiques, ce qui éclaire le fonctionnement prévu en cours de projet. Attention toutefois : il ne présentera que les ressources impliquées dans le projet concerné. Il sera inutile de présenter toutes les ressources disponibles dans votre organisation.

Question 5

« **L'organigramme** d'équipe présenté dans le cahier des charges devra nécessairement refléter la **méthode** présentée. » **Vrai ou faux** ? : (Une seule réponse juste)

- (•) Vrai
- ( ) Faux

C'est vrai ! La méthode projet que vous aurez décrite va souvent impliquer des rôles spécifiques que votre organigramme d'équipe devra refléter, puisqu'elle définit toute l'organisation de votre projet. Attention à bien préserver cette cohérence lors de la rédaction de votre cahier des charges : vous serez peu crédible si vous présentez une méthode agile parfois plus « vendeuse » dans certains contextes avant de présenter une équipe typique d'une organisation en cascade...

Exercice p. 16 Solution n°2

Question 1

Parmi les propositions suivantes, indiquez celle qui pourrait le mieux définir ce qu'est la gouvernance dans un projet : (Une seule réponse juste)

- ( ) La liste des réunions régulières planifiée pendant tout le déroulement du projet.
- (•) Un cadre organisationnel précisant comment circule l'information, au travers de quelles instances et de comment sont prises les décisions.

Dans votre cahier des charges, définir la gouvernance c'est préciser comment l'information devra circuler, au travers de quelles instances, qui seront les profils décisionnaires concernés et comment on prendra des décisions tout au long du projet. Elle vous permet de préciser le cadre organisationnel au sein duquel le projet va se dérouler. Elle sera incarnée par plusieurs types de réunions ou de comités. Une liste de réunions ne sera pas suffisante pour définir une gouvernance, pas plus qu'une répartition des responsabilités selon les acteurs impliqués.

Question 2

Pour un projet **traditionnel**, par exemple dans une organisation en cascade, une **gouvernance** se décline souvent en **trois niveaux**. Lesquels ? (Plusieurs réponses possibles)

- [x] Opérationnel : pour piloter le projet au quotidien.
- [ ] Reporting : pour assurer le transfert d'information.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- [x] Coordination : pour faire des points réguliers sur l'avancement.
- [x] Stratégique : pour valider, arbitrer et prendre des décisions.
- [ ] Organisationnel : pour répartir les tâches entre les ressources.
- [ ] Politique : pour stimuler les contradictions afin de prendre les meilleures décisions.

Dans une organisation traditionnelle, une gouvernance s'organise souvent au travers de trois niveaux : l'opérationnel pour assurer le quotidien du projet, la coordination permettant de faire des points réguliers et de suivre l'avancement du projet et enfin un niveau stratégique pour faire les arbitrages et prendre des décisions clés, souvent incarné par les comités de pilotage. Organisant la communication, la gouvernance permet le reporting et la transmission d'informations descendantes à tous ces niveaux. Le niveau opérationnel ne se limite pas à la répartition des tâches entre les ressources mobilisées. Quant à la politique... C'est hors de propos dans notre contexte.

Question 3

Dans votre **gouvernance**, vous pourrez décrire les **comités** qui seront formés et les **réunions** régulières qui seront organisées pour assurer un bon suivi du projet. Comment appelle-t-on le comité **composé de décisionnaires** capables de **prendre des décisions stratégiques** en cours de projet ? (Une seule réponse juste)

- ○ Comité de suivi
- ○ Comité de surveillance
- ◉ Comité de pilotage
- ○ Comité de direction

Les décisionnaires n'auront généralement pas le temps de suivre le projet au quotidien. Ils formeront donc un comité spécifique chargé d'examiner l'avancement du projet à intervalles réguliers et de prendre des décisions stratégiques en cours de projet, comme par exemple modifier les délais ou les coûts du projet. On appelle cette instance un « *comité de pilotage* » ; il incarne souvent le niveau stratégique de la gouvernance.

Question 4

Votre cahier des charges pourra préciser les **modalités de transmission des demandes** aux ressources. Vous trouverez ci-dessous plusieurs propositions décrivant pourquoi il est important de **rédiger des briefs** pour transmettre des instructions aux équipes de production. Identifiez celles qui sont fausses. (Plusieurs réponses possibles)

- [ ] Un brief rédigé permet de mieux structurer la demande.
- [ ] Un brief rédigé permet aux ressources de se référer rapidement aux attendus en cours de réalisation.
- [ ] Un brief rédigé constitue un socle qui facilite la vérification de la conformité des travaux.
- [x] Un brief rédigé permet de réduire les charges de réalisation des tâches.
- [x] Un brief rédigé remplace la présentation des attendus en face-à-face.

Votre cahier des charges pourra intégrer la référence à un modèle de brief. Un brief rédigé vous aidera à structurer la demande, permettra aux ressources de se référer à cette demande en cours de réalisation, en toute autonomie. Il constitue par ailleurs un socle utile à la vérification des travaux lors des livraisons. Pour toutes ces raisons, rédiger un brief est utile. Mais rédiger un brief ne vous dispensera pas de venir le présenter de visu à vos ressources : le face à face est toujours précieux, particulièrement pour détecter des imprécisions toujours possibles. Enfin, le brief n'influence pas la tâche à réaliser : il peut permettre de bien clarifier la demande, mais il n'a pas le pouvoir d'accélérer les temps de réalisation...

Question 5

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Parmi les propositions suivantes, indiquez les **outils et consignes** que vous pourriez présenter dans votre cahier des charges : (Plusieurs réponses possibles)

- [x] Un lien vers une trame de brief structurée.
- [x] Un modèle de message de livraison.
- [x] Des outils de suivi de l'activité comme Trello.
- [x] Des outils de ticketing comme Jira.
- [x] Des outils collaboratifs comme Slack.
- [x] Des espaces de stockages pour les documents projet.

Toutes ces propositions sont exactes (et ne sont pas exhaustives !). Votre cahier des charges présentera tous les outils mis à la disposition de l'équipe pour faciliter le déroulement du projet. Ils incarneront les supports concrets du fonctionnement envisagé en cours de projet.

Exercice p. 17 Solution n°3

Question 1

Qu'est-ce qu'une méthode ? (Une seule réponse juste)

- ○ Une philosophie à intégrer pour aborder l'organisation d'un projet.
- ○ Un ensemble d'événements formalisés et d'outils prêts à utiliser pour définir vos propres processus.
- ◉ Un ensemble de processus bien définis guidant l'activité jusqu'au résultat du projet.

Une méthode est un ensemble de processus bien définis qui guidera l'ensemble de votre activité depuis le début du projet jusqu'à sa livraison. Lorsqu'on évoque une manière d'appréhender le projet, une philosophie, on fait référence à un système d'idées qui pose les fondements d'une approche projet : l'agilité par exemple. Des événements et outils utilisables pour formaliser votre propre méthode s'appelle un cadre de travail (ou framework). Ce sera le cas de Scrum par exemple.

Question 2

À **quel niveau de gouvernance** indiqueriez-vous que les briefs communiqués aux ressources mobilisées dans le cadre du projet devront être **formalisés** par écrit ? (Une seule réponse juste)

- ◉ Opérationnel
- ○ Coordination
- ○ Stratégique
- ○ Autre

En cours de projet, les ressources recevront de nombreux briefs qui détailleront ce qui est attendu d'elles. Ce serait effectivement une excellente idée de préciser que ces briefs devront être formalisés et rédigés : cela sera utile pour vérifier la conformité des travaux réalisés et ce sera également un support précieux auquel les ressources pourront se référer pendant l'exécution de leurs tâches. Cette précision aura sa place dans la description du niveau opérationnel de la gouvernance.

Question 3

Parmi tous les outils présentés dans ce cours que vous pourriez intégrer à votre cahier des charges, nous avons évoqué le plan de prévention. Que permet cet outil tout aussi utile au chef de projet qu'à l'équipe de réalisation ? (Une seule réponse juste)

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- ○ Assurer la qualité des réalisations
- ○ Suivre l'activité du projet en temps réel
- ○ Définir les processus d'échange avec le commanditaire
- ◉ Suivre les risques en cours de projet

Le plan de prévention est le livrable qui conclura votre analyse des risques. Il indique les risques à suivre en cours de projet et propose à la fois des actions de prévention et des actions en réparation, à déployer si les risques se transforment en problèmes avérés. Selon la nature de votre projet et le niveau de risque associé, il pourra être très utile d'intégrer ce plan de prévention à votre cahier des charges.

Question 4

À quoi sert une **gouvernance** dans un projet ? (Plusieurs réponses possibles)

- ☑ Donner un cadre pour faciliter la circulation des informations clés.
- ☑ Structurer la communication ascendante (reporting) pour permettre d'éventuels arbitrages.
- ☐ Définir les étapes clés (ou phases) du déroulement du projet.
- ☑ Organiser la communication descendante pour transmettre les attendus.

La gouvernance fixe le cadre organisationnel dans lequel le projet va se dérouler. En cela, elle facilitera la circulation de l'information en cours de projet. Au travers de réunions planifiées et de comités spécifiques, elle structurera la communication ascendante et descendante. C'est en revanche la méthode projet qui imposera les grandes étapes du projet ; la gouvernance ne donne pas d'indication sur le séquençage du projet.

Question 5

Quels éléments pourriez-vous intégrer dans votre cahier des charges pour présenter la méthode projet que vous allez employer ? : (Plusieurs réponse possibles)

- ☑ Les grandes phases prévues pour le projet
- ☐ Les dates de livraison des principaux livrables
- ☑ Les livrables associés à chaque étape de production
- ☑ Les événements récurrents
- ☐ Les charges estimées pour chaque grande phase du projet
- ☑ Les processus principaux

Dans votre cahier des charges, vous pourrez présenter votre méthode projet en détaillant les grandes phases de votre projet, les livrables associés à chacune de ces étapes, les événements réguliers qui viendront rythmer le projet et les processus principaux permettant d'assurer un bon fonctionnement de votre projet. En revanche, les dates spécifiques de livraisons des livrables clés seront, elles, présentées au travers de votre planning. Les charges seront révélées par le budget que vous pourrez présenter à la fin de votre cahier des charges.

Exercice p. 19 Solution n°4


Présenter la méthode employée dans votre cahier des charges, c'est indiquer le but de chacune des grandes phases de votre projet, les événements prévus et les processus de réalisation.

Nous vous présentons ci-dessous quelques éléments d'une méthode basée en grande partie sur le modèle en cascade. Associez les objectifs, événements et livrables aux bonnes phases du projet.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Initialisation	Conception	Création	Développements	Livraison
Objectif : appréhender le contexte projet	Objectif : définir les parcours	Objectif : réaliser les interfaces	Objectif : réaliser le produit	Objectif : fournir un produit terminé
Objectif : mobiliser l'équipe	Objectif : imaginer les workflows	Objectif : produire les éléments créatifs	Événement : daily meetings	Événement : mise en production
Événement : réunion de lancement	Événement : ateliers de conception	Événement : ateliers de création	Livrable : développements itératifs	
Événement : atelier d'immersion	Livrable : personas	Livrable : fichiers PSD	Livrable : livraisons intermédiaires	
	Livrable : wireframes	Livrable : charte graphique		

Cette méthode en 5 phases s'inspire largement de celle présentée dans ce cours. Chaque grande étape du projet conduit à la production de livrables permettant, après validation, d'aborder la phase suivante.

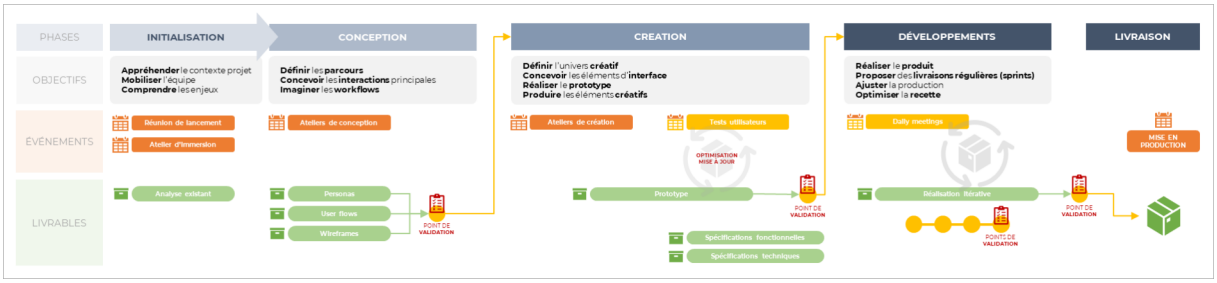

Exercice p. 20 Solution n°5

En gestion de projet, on rencontre deux approches très différentes qui vont se décliner en de nombreuses méthodes : les approches descendantes et ascendantes.

Associez les caractéristiques présentées ci-dessous à la bonne approche projet.

Approche descendante
Regroupe les méthodes projet traditionnelles.
Décrit en détails la réalisation avant de commencer la production.
Sécurise les estimations.
Facilite la réception du produit issu du projet car il sera plus facile d'en évaluer la conformité avec les attendus.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Rend difficile les modifications de périmètre en cours de projet.	**Approche ascendante** Fais références aux méthodes dites « *agiles* ». Décrit avec précision le besoin avant d'envisager la solution. Permet d'avoir un résultat rapidement qui sera complété et amélioré en cours de projet. Propose un fonctionnement itératif et incrémental. Facilite la prise en compte des évolutions du contexte et des besoins. Les estimations en début de projet sont difficiles à réaliser.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite
