Pratiquer Kanban avec ses équipes

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Introduction 3

II. Visualisation du workflow 3

III. Limiter le work in progress 4

IV. Gestion active des éléments de travail en cours 4

V. Mettre en place une boucle de rétroaction du workflow 4

VI. Mélanger Kanban et Scrum, est-ce possible ? 5

VII. Auto-évaluation 5

Solutions des exercices 6

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Introduction

Introduction aux pratiques Kanban

La méthode Kanban suit un ensemble de principes et de pratiques visant à gérer et améliorer le workflow. Il s'agit d'une méthode évolutive qui favorise les améliorations progressives des processus d'une organisation. En plus des 4 principes essentiels, Kanban comporte 4 grandes pratiques, développées au fil du temps.

Mais avant de mettre des pratiques en place, il faut déterminer la définition du workflow pour l'équipe Scrum. Cette définition est unique à chaque équipe parce qu'elle dépend de ses besoins et de son contexte de travail. Rappelons que la définition du workflow vaut pour l'équipe Scrum autant que pour les développeurs, et qu'elle s'étend au-delà des limites du Sprint.


II. Visualisation du workflow

Qu'est-ce que la visualisation du workflow ?

Lorsqu'un tableau Kanban est utilisé au cours d'un projet, l'un de ses grands avantages est qu'il permet d'illustrer de manière visuelle et intuitive le déroulement des tâches selon la definition of done de l'équipe. Si nous ne visualisons pas le travail en cours, nous ne serons pas en mesure de voir les files d'attente ou les points d'amélioration du système.

Ainsi, s'il y a des étapes excessivement surchargées, des goulots d'étranglement ou d'autres obstacles facilement repérables, l'équipe doit se réunir pour déterminer les moyens de réaliser les tâches les plus importantes de la meilleure façon possible. À mesure que les équipes approfondissent leur compréhension de Kanban, elles incorporent davantage de moyens de contrôle visuel.

Le tableau Kanban :

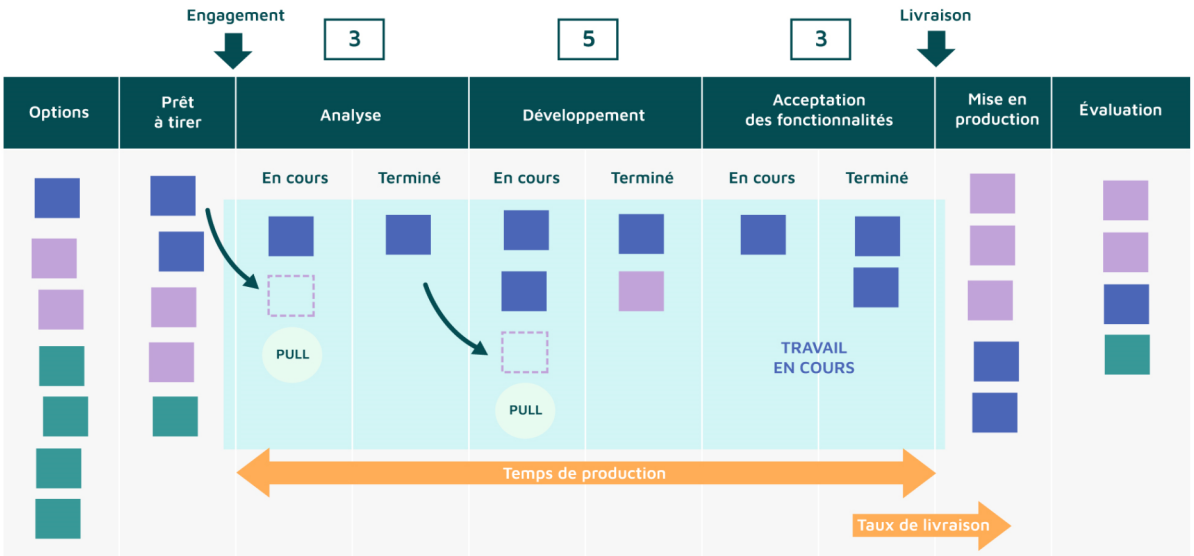

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

III. Limiter le work in progress

Qu'est-ce que limiter le WIP ?

En déterminant un seuil pour le WIP (work in progress), l'équipe définit la quantité optimale de travail qu'elle peut accomplir avec qualité et dans le respect des spécifications souhaitées, et ce, toujours selon leur definition of done. De cette façon, on évite la création de goulots d'étranglement ou l'accomplissement de tâches en dehors des normes requises.

La mise en œuvre et le respect des limites du WIP impliquent le changement d'un système « *poussé* » (ou push) en un système « *tiré* » (ou pull), dans lequel les nouvelles tâches ne sont pas commencées tant que le travail en cours n'est pas terminé. Cela garantit de ne plus avoir de travail partiellement achevé, et donc d'éviter d'allonger le délai de mise sur le marché tout en permettant à l'organisation de répondre aux circonstances changeantes.

Observer, limiter puis optimiser la quantité work in progress est essentiel pour le succès de Kanban, puisqu'il se traduit par un meilleur délai de livraison des services, une meilleure qualité et un taux de livraison plus élevé. Cette observation laisse place également à une amélioration de l'équipe en matière d'autogestion, de concentration, d'engagement et de collaboration.

IV. Gestion active des éléments de travail en cours

Comment gère-t-on les éléments de travail en cours ?

Le Workflow dans un système Kanban doit maximiser l'ajout de valeur, minimiser les délais de mise sur le marché et être aussi prévisible que possible. Par conséquent, un contrôle empirique est nécessaire par la transparence, l'inspection et l'adaptation.

Les goulots d'étranglement (ou bottlenecks) et les blocages sont particulièrement importants et doivent être correctement gérés afin d'améliorer la prévisibilité et les performances du système.

En Kanban, le travail doit être acheminé aussi rapidement que possible au client, avec la meilleure qualité possible. L'équipe Scrum doit toujours surveiller les goulots d'étranglement, les blocages et les dépendances, et veiller à ce qu'il y ait de nombreux contrôles visuels qui nous avertissent lorsque quelque chose ne va pas.

Afin de prédire et garder le contrôle du flux, l'équipe Scrum peut utiliser le « *Niveau de service attendu* » (ou le service level expectation - SLE). Ce concept permet d'estimer le temps nécessaire à un élément de travail pour parcourir l'entièreté du Workflow. Le SLE est un forecast, ce qui signifie qu'il se base sur l'historique du temps de cycle de l'équipe Scrum. Il se peut donc que, sans historique, il soit difficile de prédire le SLE, mais avec le temps, celui-ci devrait devenir de plus en plus précis et réaliste. Un exemple de SLE : « *75 % des éléments de travail devraient être terminés en 8 jours ou moins.* »

On peut définir une période donnée 0 dans laquelle on va commencer les mesures de cette métrique, afin de définir le rythme de l'équipe.

Cette mesure pourra permettre au product owner de prévoir les différentes livraisons de son produit et de communiquer ces informations.

Attention toutefois : gérer les tâches au fil de l'eau comme l'entend Kanban ne signifie pas ne rien prédire, ni communiquer et livrer de façon aléatoire.

V. Mettre en place une boucle de rétroaction du workflow

Comment mettre en place la rétroaction du workflow ?

La boucle de rétroaction est un aspect important du fonctionnement du Kanban. Les réunions de rétrospective sont un excellent exemple de boucle de rétroaction. Il faut s'assurer qu'elles ont lieu régulièrement afin de ne pas rester trop longtemps sans retour d'informations ou de feed-back du client. Ce processus aidera non seulement à optimiser le système Kanban, mais aussi la qualité du produit ainsi que la valeur.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

La boucle de rétroaction du workflow devrait se concentrer sur la visualisation du workflow : est-il en bon état ? Correspond-il au besoin du client et au besoin de l'équipe ? Est-il assez clair et transparent aux yeux de l'équipe ?

La rétroaction concerne aussi la façon de travailler au sein de l'équipe Scrum : est-ce que la limite de WIP et des SLE est satisfaisante et respectée ?

VI. Mélanger Kanban et Scrum, est-ce possible ?

Kanban et Scrum, un bon cocktail ?

Il est possible d'emprunter certaines pratiques de Kanban tout en restant en Scrum.

Mettre en place une règle de gestion du flux pour éviter un goulot d'étranglement peut être une bonne pratique à mettre en place en Scrum. Cela permet d'éviter que toutes les tâches du Sprint soient attaquées mais pas terminées.

En Scrum, l'équipe livre généralement en fin de Sprint mais il est possible de livrer avant. Intégrer cette pratique de Kanban peut-être utile : dès qu'une fonctionnalité est terminée, l'équipe peut la livrer même si le sprint n'est pas terminé.

VII. Auto-évaluation

Exercice : Quiz

Question 1

Lors du daily Scrum, une équipe doit modifier sa limite de WIP si un élément urgent non planifié entre dans un Sprint et que l'équipe a atteint la limite maximale de WIP.

- O Vrai
- O Faux

Question 2

Qui est responsable du Kanban board dans le sprint backlog ?

- O Le product owner
- O Les développeurs
- O Le scrum master
- O L'équipe Scrum

Question 3

Lequel des énoncés suivants décrit le mieux les attentes en matière de niveau de service (SLE) ?

- O Il s'agit d'une prévision du temps nécessaire à la réalisation d'un élément de travail
- O Un engagement sur la durée de traitement d'un élément de travail
- O Il s'agit d'un engagement sur la qualité du service

Question 4

Dans le cadre de Scrum avec Kanban, le Scrum master définit les limites du WIP.

- O Vrai
- O Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 5 Solution n°1

Question 1

Lors du daily Scrum, une équipe doit modifier sa limite de WIP si un élément urgent non planifié entre dans un Sprint et que l'équipe a atteint la limite maximale de WIP.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Kanban étant un flux tiré, les éléments urgents ne peuvent pas être « *poussés* » à l'équipe sans qu'elle-même soit prête à commencer le travail sur l'élément urgent en question.

Question 2

Qui est responsable du Kanban board dans le sprint backlog ?

- ○ Le product owner
- ◉ Les développeurs
- ○ Le scrum master
- ○ L'équipe Scrum

Le sprint backlog étant un plan par et pour les développeurs, ces derniers gèrent également la visualisation du flux de travail au sein du sprint.

Question 3

Lequel des énoncés suivants décrit le mieux les attentes en matière de niveau de service (SLE) ?

- ◉ Il s'agit d'une prévision du temps nécessaire à la réalisation d'un élément de travail
- ○ Un engagement sur la durée de traitement d'un élément de travail
- ○ Il s'agit d'un engagement sur la qualité du service

Le Niveau de service attendu (ou le service level expectation) est un concept qui permet d'estimer le temps nécessaire à un élément de travail pour parcourir l'entièreté du workflow.

Question 4

Dans le cadre de Scrum avec Kanban, le Scrum master définit les limites du WIP.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Dans ce cadre, c'est l'équipe Scrum qui détermine la limite du WIP, et non le Scrum master.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite
