Application - Planning de Gantt

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Énoncé 3

II. Conseils 3

III. Corrigé 4

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Énoncé

Méthode

Ouvrez un outil de planification Gantt : Microsoft Project, Gantter, Ganttproject.biz, ou autre !

La sauce tomate de Mama Russo

- D'après **la Mama Russo**, le choix des pots de verre devrait prendre **3 jours** et pourra débuter aussitôt que le feu vert est donné pour ce projet.
- Le feu vert est donné par le **Padre**.
- L'imprimeur **Giovanni** a été contacté et s'engage à fournir les étiquettes des pots **6 jours** après le dépôt des maquettes à l'imprimerie. Il fournira aussi les cartons d'emballage individuels, **10 jours** après le dépôt des maquettes.
- Le dépôt des maquettes aura lieu le **29 novembre 2021** par la **Mama Russo**.
- L'opération d'étiquetage des pots de verre s'effectuera en **4 jours** par **Luigi**, le fils de la Mama Russo.
- L'approvisionnement des matières premières (tomates, oignons) demande **8 jours** à **Tomato corp**. Mais la livraison ne peut s'effectuer qu'une fois le petit atelier de fabrication prêt.
- L'approvisionnement des pots de verre par la société **Glass** devrait s'effectuer dans les 9 jours suivants le choix des pots par **la Mama Russo.**
- Le réaménagement du petit atelier consiste en :
    - Une réorganisation de l'aire de stockage des pots de verre, le mobilier industriel nécessaire pouvant être livré et monté en **6 jours** par la société **Ikeo**.
    - Une amélioration de la sécurité de l'atelier, qui n'interfère pas avec la réorganisation de l'aire de stockage ; ces travaux industriels demanderaient **12 jours**, également par la société **Ikeo**.
- La préparation de la sauce dure **1 jour** et est faite par **la Mama Russo.**
- Le remplissage des pots (préalablement étiquetés obligatoirement) par **Luigi** est une opération qui demande **3 jours** de travail, et la mise des pots en cartons individuels par Luigi demande **4 jours** de travail.
- Quand tout est terminé, **le Padre** envoie les sauces aux clients !
- La date du feu vert est : le **26 novembre 2021.**

Réalisez le diagramme de Gantt de ce projet !

II. Conseils


Gantter : trucs et astuces

Rappel **Comment insérer des jours fériés ?**

Calendrier → double click sur « *Standard* » → choisir le jour à mettre en férié → dans « *Temps de Travail* », cliquez sur « *Effacer* » → enregistrer.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

III. Corrigé

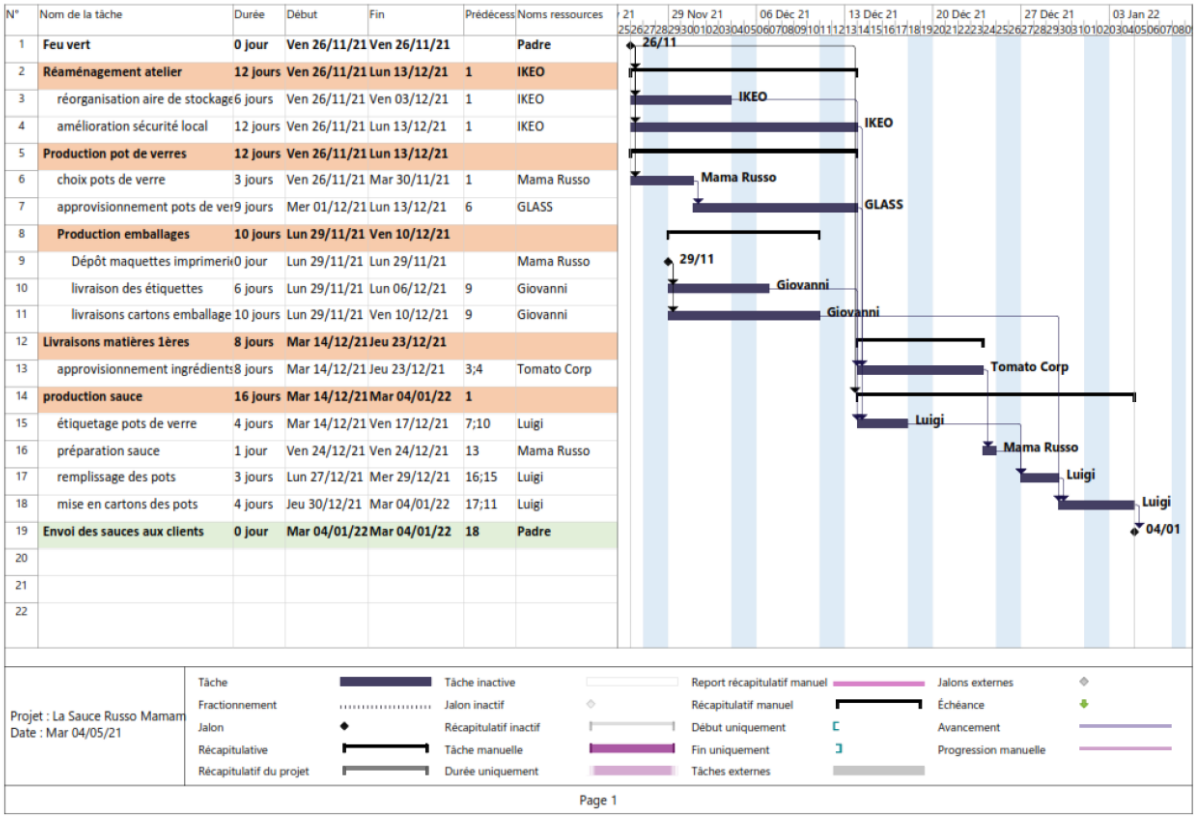

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécess	Noms ressources
1	**Feu vert**	**0 jour**	**Ven 26/11/21**	**Ven 26/11/21**		**Padre**
2	**Réaménagement atelier**	**12 jours**	**Ven 26/11/21**	**Lun 13/12/21**	**1**	**IKEO**
3	réorganisation aire de stockage	6 jours	Ven 26/11/21	Ven 03/12/21	1	IKEO
4	amélioration sécurité local	12 jours	Ven 26/11/21	Lun 13/12/21	1	IKEO
5	**Production pot de verres**	**12 jours**	**Ven 26/11/21**	**Lun 13/12/21**		
6	choix pots de verre	3 jours	Ven 26/11/21	Mar 30/11/21	1	Mama Russo
7	approvisionnement pots de ver	9 jours	Mer 01/12/21	Lun 13/12/21	6	GLASS
8	**Production emballages**	**10 jours**	**Lun 29/11/21**	**Ven 10/12/21**		
9	Dépôt maquettes imprimeri	0 jour	Lun 29/11/21	Lun 29/11/21		Mama Russo
10	livraison des étiquettes	6 jours	Lun 29/11/21	Lun 06/12/21	9	Giovanni
11	livraisons cartons emballage	10 jours	Lun 29/11/21	Ven 10/12/21	9	Giovanni
12	**Livraisons matières 1ères**	**8 jours**	**Mar 14/12/21**	**Jeu 23/12/21**		
13	approvisionnement ingrédients	8 jours	Mar 14/12/21	Jeu 23/12/21	3;4	Tomato Corp
14	**production sauce**	**16 jours**	**Mar 14/12/21**	**Mar 04/01/22**	**1**	
15	étiquetage pots de verre	4 jours	Mar 14/12/21	Ven 17/12/21	7;10	Luigi
16	préparation sauce	1 jour	Ven 24/12/21	Ven 24/12/21	13	Mama Russo
17	remplissage des pots	3 jours	Lun 27/12/21	Mer 29/12/21	16;15	Luigi
18	mise en cartons des pots	4 jours	Jeu 30/12/21	Mar 04/01/22	17;11	Luigi
19	**Envoi des sauces aux clients**	**0 jour**	**Mar 04/01/22**	**Mar 04/01/22**	**18**	**Padre**
20						
21						
22						

Step 1 : on liste les tâches lues dans l'énoncé et on les met dans un ordre logique.

Step 2 : on ajoute les durées connues dans l'énoncé.

Step 3 : on ajoute les 3 jalons évoqués dans l'énoncé avec une durée de 0 jour ! Pour rappel, un jalon est un marqueur temporel d'une durée de 0 jour qui mentionne un instant clé du projet.

Step 4 : on ajoute les ressources mentionnées dans l'énoncé.

Step 5 : étape la plus difficile : insérer les prédécesseurs en suivant l'énoncé et un ordre un peu logique ! Pour rappel, un prédécesseur est la tâche qui vient AVANT la tâche en cours et qui doit être terminée pour que la tâche démarre.

Attention

Faites attention :

- Aux doubles prédécesseurs,
- Aux tâches parallélisées ayant le même prédécesseur,
- Aux tâches forcées sans prédécesseur.

Step 6 : insérer les 2 dates données dans l'énoncé... Les autres dates apparaissent automatiquement !

Step 6 bis : vérifier les jours fériés

Step 7 : ajouter des sur-dossiers pour organiser mon planning et ranger mes tâches.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite
